



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu –
RJ Cep: 28.695-000

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À Prefeitura Municipal de Bom Jardim

A empresa RB Nunes Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 34.939.102/0001-99, vêm por meio do seu representante legal, o SR. Ronilson Benedito Nunes, portador do RG 12803712-4 IFP/RJ solicitar a 2ª medição da obra cujo o objeto é REFORMA BANHEIRO, ELETRICA PARQUE, SEDE GUARDA, PORTICO E PINTURA GRADES Conforme contrato Nº 063/2023, Tomada de preços 008/2023.

Período: 02/09/2023 à 30/09/2023

Ronilson Benedito Nunes

RG: 12803712-4

Diretor Executivo

34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
NÚMERO 6469
ENT 10 DE 10 23
92



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

DATA 04/09/2023

Contrato: 063/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Luiz Otavio Mota Ferreira eng. civil

Antonio martins pedreiro

Uelington martins N. servente

silva silva martins pedreiro

Jouber Wanderson ramos P. servente

Wallace bispo da cruz servente

Lucas da cruz pereira servente

João Luiz Alves fontes pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J. servente

Jorge Antonio da Silva V. pedreiro

luiz felipe perez dos s. servente

leandro eletricista

continuação pintura das grades

compactação do solo para receber concreto

inicio da lavenaria na parte inferior do predio da guarda

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TO

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluida na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass: ____/____/____

Ass: ____/____/____



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

05/09/2023

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

luiz otavio mota ferreira encarregado

Antonio martins pedreiro

Uelington martins N. servente

ivani silva martins pedreiro

Jouber Wanderson ramos P. servente

Wallace bispo da cruz servente

Lucas da cruz pereira servente

João Luiz Alves fontes pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J. servente

Jorge Antonio da Silva V. pedreiro

luiz felipe perez dos s. servente

leandro campos nunes eletricista

amarração de ferragem na estrutura da sede da guarda

continuação de alvenaria

distribuição de conduites na parte superior da sede da guarda

concretagem na estrutura inferior sede da guarda

continuação pintura

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

concretagem na estrutura inferior sede da guarda

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

1 etapa concluída na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

____/____/____



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

06/09/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

Nome	Função
------	--------

Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil
---------------------------	------------

Antonio martins	pedreiro
-----------------	----------

Uelington martins N.	servente
----------------------	----------

Ilvani silva martins	pedreiro
----------------------	----------

Jouber Wanderson ramos P.	servente
---------------------------	----------

Wallace bispo da cruz	servente
-----------------------	----------

Lucas da cruz pereira	servente
-----------------------	----------

João Luiz Alves fontes	pedreiro
------------------------	----------

Paulo Victor Geraldo de J.	servente
----------------------------	----------

Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro
---------------------------	----------

Luiz felipe perez dos s.	servente
--------------------------	----------

leandro	eletricista
---------	-------------

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

SERVIÇOS INICIADOS:

montagem da estrutura da rampa e escada da sede da guarda

continuação da alvenaria na sede da guarda

inicio do chapisco nas paredes prontas

inicio do reboco nas paredes protas

inicio da instalação elétrica no piso superio da sede da guarda

montagem de estrutura para instalação de caixas dagua

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

nenhuma etapa concluida na presente data

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

termino da alvenaria e colocação de contraverga terminados

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

Ass:

DATA

___/___/___

CONTRATADA

Ass:

DATA

___/___/___



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 07/09/2023
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	continuação de pintur grade
Antonio martins	pedreiro	continuação do reboco na sede da guarda
Uelington martins N.	servente	continuação do chapisco
lvani silva martins	pedreiro	
Jouber Wanderson ramos P.	servente	
Wallace bispo da cruz	servente	
Lucas da cruz pereira	servente	SERVIÇOS CONCLUIDOS:
João Luiz Alves fontes	pedreiro	termino do chapiso
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro	
Luiz felipe perez dos s.	servente	
	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
1 etapa concluida		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA ____/____/____	Ass: DATA ____/____/____



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 08/08/2023
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	continuação da pintura nas grades
Antonio martins	pedreiro	reboco na sede da guarda , no pavimento terreo
Uelington martins N.	servente	inicio dal alvenaria na parte inferior predio da guarda
lanoel vitor pires de souza	pedreiro	
Jouber Wanderson ramos P.	servente	
Wallace bispo da cruz	servente	
Lucas da cruz pereira	servente	SERVIÇOS CONCLUIDOS:
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro	
Luiz felipe perez dos s.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
nenhuma etapa iniciada na presente data foi concluida		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA DATA
Ass:	___/___/___	Ass: ___/___/___



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

DATA

11/09/2023

Contrato: 063/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Luiz Otavio Mota Ferreira eng. civil

Antonio martins pedreiro

Uelington martins N. servente

silva... silva martins pedreiro

Jouber Wanderson ramos P. servente

Wallace bispo da cruz servente

Lucas da cruz pereira servente

João Luiz Alves fontes pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J. servente

Jorge Antonio da Silva V. pedreiro

luiz felipe perez dos s. servente

leandro eletricista

continuação pintura das grades

continuação reboco sede da guarda

continuação estrutura rampa e escada sede da guarda

início de manutenção na grade da parte de baixo do parque

início de aplicação de massa acrílica na sede da guarda

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TO:

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluída na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

12/09/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

continuação pintura nas grades

luiz otavio mota ferreira encarregado

Antonio martins pedreiro

inicio chapisco , piso inferior na sede da guarda

Helington martins N. servente

distribuição de conduites na parte superior da sede da guarda

Silvani silva martins pedreiro

Jouber Wanderson ramos P. servente

Wallace bispo da cruz servente

Lucas da cruz pereira servente

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

João Luiz Alves fontes pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J. servente

Jorge Antonio da Silva V. pedreiro

luiz felipe perez dos s. servente

leandro campos nunes eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluída na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

____/____/____



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

13/09/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Luiz Otavio Mota Ferreira eng. Civil

Antonio martins pedreiro

Helington martins N. servente

Alvani silva martins pedreiro

Jouber Wanderson ramos P. servente

Wallace bispo da cruz servente

Lucas da cruz pereira servente

João Luiz Alves fontes pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J. servente

Jorge Antonio da Silva V. pedreiro

Luiz felipe perez dos s. servente

leandro eletricista

continuação de pintura nas grades do parque

continuação de chapisco nas paredes prontas

inicio do reboco nas paredes protas

continuação da instalação elétrica no piso superior da sede da guarda

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

termino do chapisco

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCCORRÊNCIAS DIÁRIAS

1 etapa concluida na presente data

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

termino da alvenaria e colocação de contraverga terminados

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 14/09/2023
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	continuação de pintura na grade
Antonio martins	pedreiro	inicio do reboco na parte inferio sede da guarda
Helington martins N.	servente	amarração de ferragens na rampa
Julvani silva martins	pedreiro	montagem de laje de sustentação das caixas d'agua
Jouber Wanderson ramos P.	servente	
Wallace bispo da cruz	servente	
Lucas da cruz pereira	servente	SERVIÇOS CONCLUIDOS:
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro	
Luiz felipe perez dos s.	servente	
	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
Ocorrências Diárias		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
nenhuma etapa concluida na presente data		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA DATA
Ass:	___/___/___	Ass: ___/___/___



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

15/09/2023

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

Nome	Função
------	--------

Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil
---------------------------	------------

Antonio martins	pedreiro
-----------------	----------

Helington martins N.	servente
----------------------	----------

Manoel vitor pires de souza	pedreiro
-----------------------------	----------

Jouber Wanderson ramos P.	servente
---------------------------	----------

Wallace bispo da cruz	servente
-----------------------	----------

Lucas da cruz pereira	servente
-----------------------	----------

João Luiz Alves fontes	pedreiro
------------------------	----------

Paulo Victor Geraldo de J.	servente
----------------------------	----------

Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro
---------------------------	----------

Luiz felipe perez dos s.	servente
--------------------------	----------

leandro campos nunes	eletricista
----------------------	-------------

SERVIÇOS INICIADOS:

continuação da pintura nas grades

reboco na sede da guarda , no pavimento terreo

concretagem da rampa e escada na sede da guarda

concretagem de laje de sustentação das caixas d'agua sede da guarda

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

concretagem da rampa e escada na sede da guarda

concretagem de laje de sustentação das caixas d'agua sede da guarda

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

2 etapas iniciadas na presente data foi concluida

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

__/__/__

CONTRATADA

DATA

Ass:

__/__/__



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

DATA 18/09/2023

Contrato: 063/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. civil	continuação pintura das grades
Antonio martins	pedreiro	inicio das instalações idrossanitarias do pavimento superior
Uelington martins N.	servente	inicio de ascentamento de caixonetes na sede da guarda
silva. Silva martins	pedreiro	continuação de matutenção na grade da parte de baixo do parque
Jouber Wanderson ramos P.	servente	inicio deescavação de sapatas para postes
Wallace bispo da cruz	servente	
Lucas da cruz pereira	servente	SERVIÇOS CONCLUIDOS:
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro	
luiz felipe perez dos s.	servente	
leandro	eletricista	

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOT.		

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluida na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

19/09/2023

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

Nome	Função
luiz otavio mota ferreira	encarregado

SERVIÇOS INICIADOS:

continuação pintura nas grades

Antonio martins	pedreiro
-----------------	----------

continuação das instalações idrossanitárias do pavimento superior

delington martins N.	servente
----------------------	----------

continuação de assentamento de caixonetes na sede da guarda

silvani silva martins	pedreiro
-----------------------	----------

continuação de manutenção na grade da parte de baixo do parque

Jouber Wanderson ramos P.	servente
---------------------------	----------

continuação de escavação de sapatas para postes

Wallace bispo da cruz	servente
-----------------------	----------

assentamento de caixas de passagem para elétrica do parque

Lucas da cruz pereira	servente
-----------------------	----------

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

João Luiz Alves fontes	pedreiro
------------------------	----------

Paulo Victor Geraldo de J.	servente
----------------------------	----------

Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro
---------------------------	----------

luiz felipe perez dos s.	servente
--------------------------	----------

leandro campos nunes	eletricista
----------------------	-------------

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

____/____/____



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

20/09/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Luiz Otavio Mota Ferreira eng. Civil

Antonio martins pedreiro

Elington martins N. servente

Silvani silva martins pedreiro

Jouber Wanderson ramos P. servente

Wallace bispo da cruz servente

Lucas da cruz pereira servente

João Luiz Alves fontes pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J. servente

Jorge Antonio da Silva V. pedreiro

Luiz felipe perez dos s. servente

leandro eletricista

continuação de pintura nas grades do parque

continuação das instalações idrossanitárias do pavimento superior

continuação de assentamento de caixonetes na sede da guarda

continuação de manutenção na grade da parte de baixo do parque

continuação de escavação de sapatas para postes

assentamento de caixas de passagem para elétrica do parque

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

termino de escavação de sapatas para postes

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

CORRÊNCIAS DIÁRIAS

1 etapa concluída na presente data

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

termino da alvenaria e colocação de contraverga terminados

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 21/09/2023
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	continuação de pintura na grade
Antonio martins	pedreiro	inicio de colocação de revestimento nos banheiros da sede da guarda
linton martins N.	servente	inicio de concretagem de sapatas para poste sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	inicio de colocação de janelas na sede da guarda
Jouber Wanderson ramos P.	servente	
Wallace bispo da cruz	servente	
Lucas da cruz pereira	servente	SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro	
Luiz felipe perez dos s.	servente	
	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
CORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
nenhuma etapa concluída na presente data		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA ____/____/____	Ass: DATA ____/____/____



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 22/09/2023
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	continuação da pintura nas grades
Antonio martins	pedreiro	continuação de revestimento na sede da guarda
linton martins N.	servente	continuação de concretagem de sapatas para poste sede da guarda
Manoel vitor pires de souza	pedreiro	continuação de colocação de janelas na sede da guarda
Joubert Wanderson ramos P.	servente	
Wallace bispo da cruz	servente	
Lucas da cruz pereira	servente	SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro	
Luiz felipe perez dos s.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
CORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
2 etapas iniciadas na presente data foi concluída		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA DATA
Ass:	___/___/___	Ass: ___/___/___



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA		25/09/2023	
Contrato: 063/2023		DECORRIDO		RESTANTE	
FISCAL:		TEMPO			
		(x) OPERAVEL		() NÃO OPERAVEL	
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:			
Nome	Função	continuação pintura das grades			
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. civil				
Antonio martins	pedreiro	inicio de reparo nas grades do inerior do parque			
Uelir on martins N.	servente	inicio de concretagem cabeça dos postes			
silvani silva martins	pedreiro	inicio de revestimento nos lavabos da sede da guarda			
Jouber Wanderson ramos P.	servente	continuação de escavação de valas para eletrica do parque			
Wallace bispo da cruz	servente				
Lucas da cruz pereira	servente	SERVIÇOS CONCLUIDOS:			
João Luiz Alves fontes	pedreiro				
Paulo Victor Geraldo de J.	servente				
Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro				
luiz felipe perez dos s.	servente				
leandro	eletricista				
PESSOAL DE OBRA INDIRETO					
TOTAL					
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS					
Nenhuma					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
nenhuma etapa concluida na presente data					
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA		CONTRATADA DATA	
Ass: _____		____/____/____		Ass: _____	



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

DATA

26/09/2023

Contrato: 063/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

continuação pintura nas grades

luiz otavio mota ferreira encarregado

Antonio martins pedreiro

continuação de reparos nos grades internas do parque

Williamington martins N. servente

continuação de concretagem cabeça dos postes

silvani silva martins pedreiro

continuação de escavação de valas para eletrica do parque

Jouber Wanderson ramos P. servente

Wallace bispo da cruz servente

Lucas da cruz pereira servente

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

João Luiz Alves fontes pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J. servente

Jorge Antonio da Silva V. pedreiro

luiz felipe perez dos s. servente

leandro campos nunes eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

CORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluida na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

____/____/____



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA

BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

27/09/2023

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

continuação de pintura nas grades do parque

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

inicio de reparo no portico de entrada do parque

lington martins N.

servente

silvani silva martins

pedreiro

continuação de manutenção na grade da parte de baixo do parque

Jouber Wanderson ramos P.

servente

continuação de concretagem de cabeça de poste

Wallace bispo da cruz

servente

continuação de colocação de caixa de passagem no parque

Lucas da cruz pereira

servente

João Luiz Alves fontes

pedreiro

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Paulo Victor Geraldo de J.

servente

colocação de caixa de passagem no parque

Jorge Antonio da Silva V.

pedreiro

Luiz felipe perez dos s.

servente

leandro

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

CORRÊNCIAS DIÁRIAS

1 etapa concluída na presente data

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

termino da alvenaria e colocação de contraverga terminados

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

___/___/___

CONTRATADA

DATA

Ass:

___/___/___



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

DATA 28/09/2023

Contrato: 063/2023

DECORRIDO RESTANTE
TEMPO
(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

FISCAL:

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Luiz Otavio Mota Ferreira eng. Civil

Antonio martins pedreiro

Williamington martins N. servente

silvani silva martins pedreiro

Jouber Wanderson ramos P. servente

Wallace bispo da cruz servente

Lucas da cruz pereira servente

João Luiz Alves fontes pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J. servente

Jorge Antonio da Silva V. pedreiro

Luiz felipe perez dos s. servente

eletricista

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

CORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluída na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 29/09/2023
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	continuação da pintura nas grades
Antonio martins	pedreiro	continuação de reparo na grade do parque
ington martins N.	servente	continuação de concretagem de cabeça de poste
Manoel vitor pires de souza	pedreiro	continuação de colocação de janelas na sede da guarda
Joubert Wanderson ramos P.	servente	início de pintura nas grades do interior do parque
Wallace bispo da cruz	servente	continuação de reparo no portico do parque
Lucas da cruz pereira	servente	SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
Jorge Antonio da Silva V.	pedreiro	
Luiz felipe perez dos s.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
CORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
nenhuma das etapas iniciadas na presente data foi concluída		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass: _____	DATA ____/____/____	Ass: _____
		DATA ____/____/____



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu –
RJ Cep: 28.695-000

Relatório Fotográfico

Contrato

063/2023

Local: Bom Jardim RJ

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Pintura de gradis de ferro (continuação)



Compactação de solo e concretagem



[Handwritten signature]

Início de alvenaria no primeiro pavimento do prédio da guarda



Distribuição de conduíte





Aplicação de reboco e chapisco



[Handwritten signature]

Preparação de parede para pintura

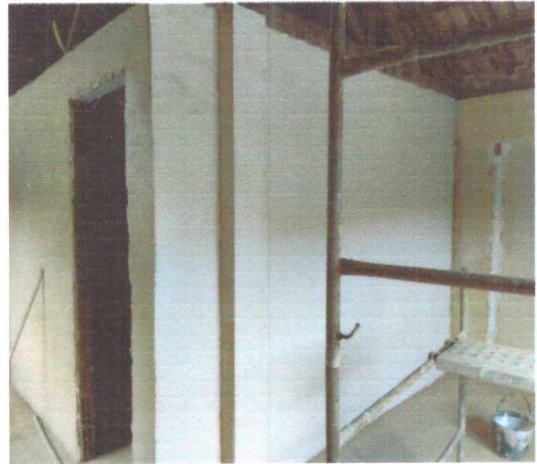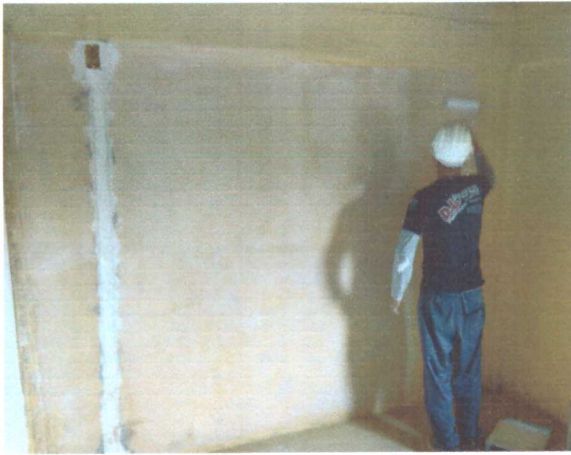

Montagem de estrutura para a caixa d'água




Início de manutenção da grades danificadas



[Handwritten signature]

Colocação de janelas

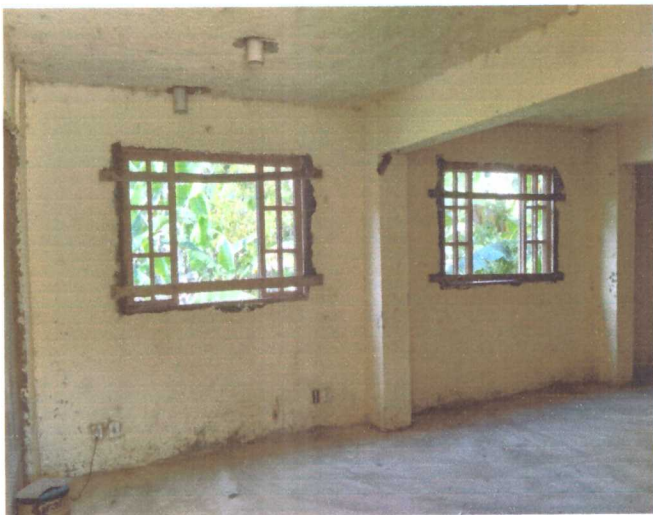


Construção de Rampa de acesso



[Handwritten signature]



Instalação Hidrosanitária

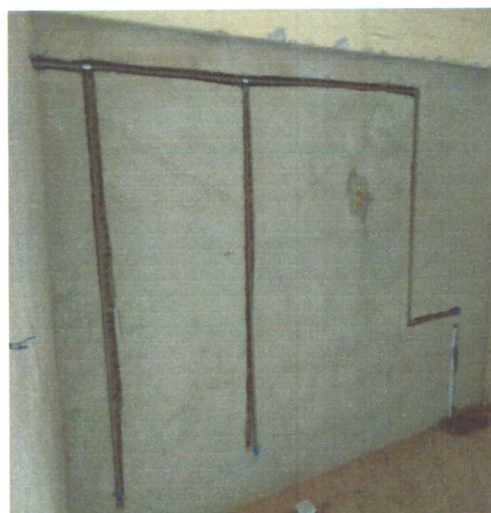

Instalação de aduelas



Cocação de conduíte e caixas de passagem no parque

VB




Colocação de revestimento no Banheiro



[Handwritten signature]

Concretagem de sapatas de postes

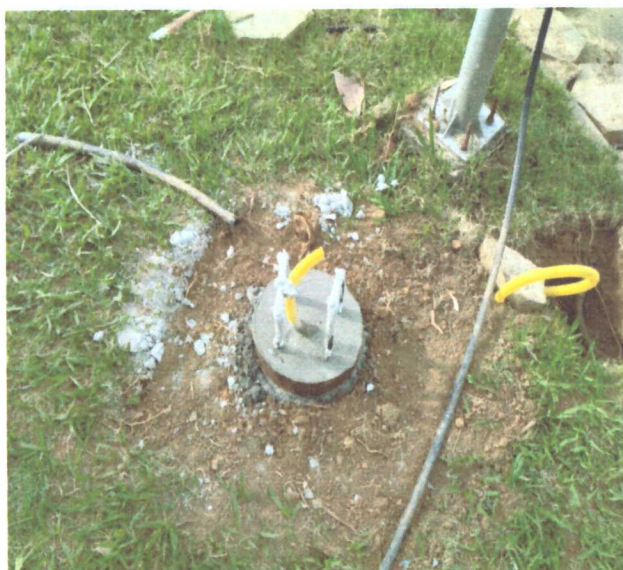

Aplicação de Zarcão e Pintura de grades no interior do parque



[Handwritten signature]

Reparo no pórtico



Renato Augusto de As

34.939.102/0001-99

RB GUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS

RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - PJ

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

2.2.7	14.007.0076-0	PORTÃO DE FERRO DE UVA OU DUAS FOLHAS, EM BARRAS VERTICAIS DE 2"x3/4", ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIORES E INFERIORES DO MESMO TIPO, CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE 0 GALVANIZADO Nº16, FURADA, CONFORME PROJETO Nº602/EMC EXCLUSIVO FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,72	R\$ 1.695,11	R\$ 9.696,03	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -	5,72	R\$ 9.696,03
2.2.8	14.007.0078-0	FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 585,83	R\$ 2.343,32	R\$ 0,00	4	R\$ 2.343,32	4	R\$ 2.343,32	0	R\$ -
2.2.9	14.007.0347-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTATANDO DE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, DE FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CILINDRICO, DE LATÃO, DE ACABAMENTO CROMADO, 3 DOBRADIÇAS 3/2x1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBJAS DE LATÃO	UN	6,00	R\$ 25,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	6	R\$ 150,00
2.2.10	14.007.0347-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTATANDO DE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, DE FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CILINDRICO, DE LATÃO, DE ACABAMENTO CROMADO, 3 DOBRADIÇAS 3/2x1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBJAS DE LATÃO	UN	34,00	R\$ 186,99	R\$ 6.425,66	R\$ 0,00	22	R\$ 4.157,78	22	R\$ 4.157,78	12	R\$ 2.267,88
2.2.11	14.007.0185-0	FERRAGENS Y PORTA (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/ BANDEIRA E 2 PAINES FIXO LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (CONJ. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUI O FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO), EXCLUSIVO MOLA HIDRÁULICA DE RESORVIORE ITEM 14.007.0190)	UN	2,00	R\$ 741,86	R\$ 1.483,72	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	2	R\$ 1.483,72
2.2.12	14.007.0190-0	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 205,92	R\$ 1.235,52	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	6	R\$ 1.235,52
2.2.13	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (CONJUNTO COMPLETO), CONSTATANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUI O FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO)	UN	12,00	R\$ 107,12	R\$ 1.285,44	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	12	R\$ 1.285,44
2.2.14	12.031.0001-0	PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA ANODINHA, COM 2CM DE ESPESURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISC. OU PAREDE EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	11,44	R\$ 347,10	R\$ 3.970,82	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	11,44	R\$ 3.970,82
TOTAL DO ITEM 2.2 - EXCLUÍDAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS							R\$ 4.480,33		R\$ 26.510,06		R\$ 16.899,33		R\$ 49.733,66
2.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS													
REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4"													
2.3.1	15.025.0011-0	TUBO PVC DO TIPO RUA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	UN	5,00	R\$ 38,69	R\$ 193,45	R\$ 77,38	2	R\$ 116,07	3	R\$ 116,07	5	R\$ 193,45
2.3.2	15.036.0037-0	TUBO DE PVC DO TIPO RUA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	244,00	R\$ 7,88	R\$ 1.922,72	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	244,00	R\$ 1.922,72
2.3.3	15.036.0050-0	TUBO DE PVC DO TIPO RUA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	220,00	R\$ 14,84	R\$ 3.264,80	R\$ 0,00	30	R\$ 445,20	30	R\$ 445,20	190,00	R\$ 1.319,60
2.3.4	15.036.0052-0	TUBO DE PVC DO TIPO RUA C/DIAM. DE 100MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	136,00	R\$ 22,39	R\$ 3.044,04	R\$ 0,00	30	R\$ 671,70	30	R\$ 671,70	96,00	R\$ 1.149,64
2.3.5	06.270.0101-0	TE PVC-PRA (NBR 10331), 100MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	UN	29,00	R\$ 19,00	R\$ 551,00	R\$ 0,00	5	R\$ 95,00	13	R\$ 247,00	16,00	R\$ 300,00
2.3.6	06.270.0030-0	TUBO PVC CLASSE 20 (EN 1055), PARA ADOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA FORNECIMENTO	M	294,00	R\$ 18,57	R\$ 5.459,58	R\$ 0,00	30	R\$ 557,10	30	R\$ 557,10	264,00	R\$ 4.902,48
2.3.7	06.270.0036-0	ADAPTAÇÃO PVC-PRA (NBR 10331), PR. X PRA COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA FORNECIMENTO	UN	26,00	R\$ 16,16	R\$ 420,16	R\$ 0,00	3	R\$ 48,48	3	R\$ 48,48	23,00	R\$ 371,68
2.3.8	06.270.0067-0	CURVA PVC-PRA (NBR 10331), DE 90°, PRA COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA FORNECIMENTO	UN	19,00	R\$ 28,08	R\$ 533,52	R\$ 0,00	8	R\$ 224,64	8	R\$ 224,64	11,00	R\$ 306,88
2.3.9	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 32MM, SOLUVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVO ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO	M	148,00	R\$ 12,06	R\$ 1.784,88	R\$ 0,00	30	R\$ 361,80	30	R\$ 361,80	118,00	R\$ 1.432,08
2.3.10	18.009.0078-0	TORNELARIA PARA LARIM, DE 3/4"x1/2"x1/2" APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO	UN	28,00	R\$ 16,97	R\$ 475,16	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	28,00	R\$ 475,16
2.3.11	18.027.0089-0	LUMINÁRIA FECHADA, ILUMINAÇÃO DE RUAS, CILINDRADA A VAPOR DE MERCÚRIO E REATOR DE PARTIDA RÁPIDA	UN	69,00	R\$ 278,85	R\$ 19.143,65	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	69,00	R\$ 19.143,65
2.3.12	21.031.0015-0	DELETORE LUMINOSO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO FAL-0FF, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 100V E 300V, POTÊNCIA DE 400W, 1000W OU 1800W, CORRENTE MÁXIMA DA CARGA 10A, CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL, ESTABILIZADO AO UV PINOS EM LATÃO ESTANHADO, DEVENDO ATENDER A ESPECIFICAÇÃO EN-60598-2 E ANSI C136,10 E NBR 5126,10 QUE COUBER FORNECIMENTO	UN	30,00	R\$ 17,28	R\$ 518,40	R\$ 0,00						
2.3.13	15.036.0062-0	ELETROTUBO PVC RÍGIDO C/DIAM. DE 1", EXCL. CONEXÕES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	961,38	R\$ 7,61	R\$ 7.314,80	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	961,38	R\$ 7.314,80
2.3.14	15.036.0065-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 1,5MM2, 450 / 750V	M	1200,00	R\$ 2,58	R\$ 3.096,00	R\$ 0,00	300	R\$ 774,00	300	R\$ 774,00	900,00	R\$ 2.322,00
2.3.15	15.036.0090-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 4MM2, 450 / 750V	M	800,00	R\$ 3,58	R\$ 2.864,00	R\$ 0,00	200	R\$ 716,00	200	R\$ 716,00	600,00	R\$ 2.148,00
2.3.16	15.031.0035-0	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W / 750V	UN	79,00	R\$ 16,19	R\$ 1.279,61	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	79,00	R\$ 1.279,61
2.3.17	15.015.0150-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETROTUBO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 180CM DE FIO 2,5MM2, CANALOS E TOMADA DE EMBUTIR. 2P+1, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFATADA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	67,00	R\$ 241,52	R\$ 16.181,84	R\$ 0,00	33	R\$ 7.970,16	33	R\$ 7.970,16	34,00	R\$ 11.168,88
2.3.18	15.036.0143-0	ELETROTUBO EM PVC FLEXÍVEL, COM ALVARELA, DIÂMETRO DE 32MM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	705,00	R\$ 3,43	R\$ 2.418,15	R\$ 0,00	125	R\$ 428,75	125	R\$ 428,75	580,00	R\$ 1.889,40
2.3.19	18.027.0190-0	PROTEÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, PINTOS OU FACHADOS EM ALUMÍNIO REPUÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO (DIÂMETRO: 300MM), PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W, EXCLUSIVE LAMPADA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00	R\$ 240,90	R\$ 6.022,50	R\$ 0,00						
2.3.20	15.009.0025-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIADAÇÃO EM ELETROTUBO, NA BITOLA DE 2,5MM2, 600V/1000V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1739,00	R\$ 2,88	R\$ 5.008,32	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25,00	R\$ 6.322,50
2.3.21	15.009.0210-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIADAÇÃO EM ELETROTUBO, NA BITOLA DE 4MM2, 600V/1000V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1141,38	R\$ 3,88	R\$ 4.428,55	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	125,00	R\$ 5.308,32
2.3.22	15.009.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIADAÇÃO EM ELETROTUBO, NA BITOLA DE 6MM2, 600V/1000V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	2082,76	R\$ 5,04	R\$ 10.497,11	R\$ 0,00	100	R\$ 504,00	100	R\$ 504,00	1882,76	R\$ 4.428,55
2.3.23	15.011.0016-0	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRÃO ENEL, MEDIÇÃO DIRETA, REDE ÁREA, ZARVA E BRIVA, TRIFÁSICA, INCL. CAIXA POLICARBONATO P/INSCRIÇÃO E CAIXA POLIMÉRICA P/DISJUNTOR POLIFÁSICO (100A) INTERNA	UN	2,00	R\$ 394,76	R\$ 789,52	R\$ 0,00						

2.3.24	21.013.0010-0	CHUMBADORES DE AÇO, PARA FIXAÇÃO DE POSTE RETO OU CURVO, DE AÇO, DE 7,00 MT 9,00MT, COM FLANGE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	19,00	R\$ 980,00	R\$ 16.720,00		R\$ 0,00		19	R\$ 16.720,00		R\$ 0,00	19	R\$ 16.720,00	0,00	R\$ 0,00			
2.3.25	21.011.0080-0	FUNDAÇÃO PARA POSTE RETO, DE AÇO, DE 7,00 A 9,00MT, EM TERRENO DE AREIA, ARGILA OU PICARÁ, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTEÇÃO	UN	10,00	R\$ 708,50	R\$ 7.085,50		R\$ 0,00		10	R\$ 7.085,50		R\$ 0,00	10	R\$ 7.085,50	0,00	R\$ 0,00			
2.3.26	21.011.0085-0	FUNDAÇÃO PARA POSTE RETO, DE AÇO, DE 10,00 A 15,00MT, EM TERRENO DE AREIA, ARGILA OU PICARÁ, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTEÇÃO	UN	9,00	R\$ 1.388,46	R\$ 14.296,14		R\$ 0,00		9	R\$ 14.296,14		R\$ 0,00	9	R\$ 14.296,14	0,00	R\$ 0,00			
2.3.27	21.001.0085-0	POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO OU ESCALONADO, ALTURA DE 7,00MT, SEM SAPATA, FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 1.597,00	R\$ 15.970,00		R\$ 0,00		10	R\$ 15.970,00		R\$ 0,00	10	R\$ 15.970,00	0,00	R\$ 0,00			
2.3.28	21.003.0065-0	POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO OU ESCALONADO, ALTURA DE 15,00MT, COM SAPATA, FORNECIMENTO	UN	9,00	R\$ 11.060,30	R\$ 99.812,70		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0,00	R\$ 99.812,70			
2.3.29	18.380.0040-0	BRACA PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 254MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE, PROTEÇÃO HORIZONTAL 100MM, PROJEÇÃO VERTICAL 30MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	48,00	R\$ 1.165,05	R\$ 5.570,40		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	48,00	R\$ 5.570,40			
2.3.30	15.007.0405-0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 81,00	R\$ 364,00		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4,00	R\$ 364,00			
2.3.31	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A/250V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$ 23,88	R\$ 135,28		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6,00	R\$ 135,28			
2.3.32	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A/3KA, MODELO DIN TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	14,00	R\$ 9,40	R\$ 131,60		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	14,00	R\$ 131,60			
2.3.33	15.007.0576-0	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A/3KA, MODELO DIN TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 36,18	R\$ 104,52		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4,00	R\$ 104,52			
2.3.34	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A/250V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 94,45	R\$ 188,90		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2,00	R\$ 188,90			
2.3.35	23.015.0107-0	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 3 VAGAS DE ELÉTRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 20,00MT DE HO 2,5MM/2 CANVAS, CONEÇÕES LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.I., INCLUSIVE ABERTURA E FIC	UN	18,00	R\$ 386,55	R\$ 6.957,90	3	R\$ 0,00		3	R\$ 1.139,65		R\$ 0,00	3	R\$ 1.139,65	18,00	R\$ 5.788,25			
2.3.36	25.015.0260-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VAGAS DE ELÉTRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 18,00MT DE HO 2,5MM/2 CANVAS, CONEÇÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2MT, 10A, COM PLACA FORNECIMENTO INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE PASSO	UN	60,00	R\$ 190,12	R\$ 11.407,20		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	60,00	R\$ 11.407,20			
2.3.37	15.015.0261-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, APARENTE EQUIVALENTE A 2 VAGAS DE ELÉTRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 13,00MT DE HO 2,5MM/2 CANVAS, CONEÇÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2MT, 10A, COM PLACA FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 168,71	R\$ 1.687,10		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	10,00	R\$ 1.687,10			
2.3.38	18.002.0065-0	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPADA, COMPLETO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 1305x683x310MM, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LUBAÇÃO, RABINHO EM PVC E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 244,33	R\$ 4.153,61	6	R\$ 1.465,98		6	R\$ 0,00		R\$ 0,00	6	R\$ 1.465,98	17,00	R\$ 2.687,63			
2.3.39	18.006.0009-0	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO MÉDIO LIVO, COM LADRAO E MÍDIA EM TORNO DE 535x430MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 209,18	R\$ 3.556,06	6	R\$ 1.356,08		6	R\$ 0,00		R\$ 0,00	6	R\$ 1.356,08	17,00	R\$ 2.200,98			
2.3.40	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1190 DE 1/2" 7/8CM, APROXIMADAMENTE METAL, CROMADO, FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 34,01	R\$ 408,17	6	R\$ 344,05		6	R\$ 0,00		R\$ 0,00	6	R\$ 344,05	17,00	R\$ 344,11			
2.3.41	18.013.0117-0	SIFÃO 1680, DE 1,1/2" X 1,1/2", EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 61,90	R\$ 1.069,30	6	R\$ 377,40		6	R\$ 0,00		R\$ 0,00	6	R\$ 377,40	17,00	R\$ 591,90			
2.3.42	18.015.0116-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1,1/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, AISE-304LUA, 18,0 MEDINDO 60X60CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	26,00	R\$ 218,73	R\$ 5.686,98		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	26,00	R\$ 5.686,98			
2.3.43	15.020.0200-0	LAMPADA LED, BULBO, 460/DI, 12W, 100/240 BASE E-27, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	113,00	R\$ 7,00	R\$ 791,00		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	113,00	R\$ 791,00			
2.3.44	18.020.0200-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	113,00	R\$ 3,90	R\$ 440,70		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	113,00	R\$ 440,70			
2.3.45	15.004.0068-0	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE ELAVTORIO DE UMA TORNEIRA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) COMPREENDENDO 3,00MT DE TUBO DE PVC DE 25MM, 1,00MT DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABISCHOS E CONEÇÕES	UN	17,00	R\$ 144,18	R\$ 2.451,06	6	R\$ 885,08		6	R\$ 0,00		R\$ 0,00	6	R\$ 885,08	17,00	R\$ 1.385,98			
2.3.46	15.004.0109-0	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO VASO SANITÁRIO INDIVIDUAL, COM CAIXA ACOPADA EXCLUSIVE ESTEJE PAVIMENTO ELEVADO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM, 1,00MT DE TUBO DE PVC 40MM, RABISCHOS E CONEÇÕES, LUBAÇÃO DE ESGOTOS COM 3,00MT DE TUBO DE PVC 100MM, 1,00MT DE TUBO DE PVC 40MM, RABISCHOS E CONEÇÕES	UN	17,00	R\$ 250,00	R\$ 4.250,00	6	R\$ 1.500,00		6	R\$ 0,00		R\$ 0,00	6	R\$ 1.500,00	17,00	R\$ 1.385,98			
2.3.47	15.007.0209-0	HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE DE 5/8" (16MM), COM 3,00MT DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$ 96,60	R\$ 391,60		R\$ 0,00		6	R\$ 0,00		R\$ 0,00	6	R\$ 1.500,00	11,00	R\$ 2.750,00			
2.3.48	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO PARA PARA-RAIO, COM 20CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 17,32	R\$ 173,20		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6,00	R\$ 331,60			
2.3.49	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO/CAPTOR, 1,10MT EM LATAO MACIO 3/16" (MODM), FIXAÇÃO COM ROSCA, MECÂNICA E ABRAÇADEIRA, INCLUSIVE CAPTOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 29,91	R\$ 59,82		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	10,00	R\$ 173,20			
2.3.50	18.005.0028-0	"TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 365x83CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 216,16	R\$ 654,48		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2,00	R\$ 59,82			
2.3.51	18.005.0040-0	SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	R\$ 28,85	R\$ 346,20		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	3,00	R\$ 554,48			
2.3.52	18.005.0050-0	PARALELA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	R\$ 19,00	R\$ 228,00		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	12,00	R\$ 346,20			
2.3.53	15.001.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO AMARELHO E BRACO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS (CHUVEIRO ELÉTRICO, EM METAL CROMADO, DE 110/220V, FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 24,30	R\$ 145,80		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	12,00	R\$ 228,00			
2.3.54	18.007.0043-0	CHUVEIRO ELÉTRICO, EM METAL CROMADO, DE 110/220V, FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 146,85	R\$ 881,10		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6,00	R\$ 145,80			
TOTAL DO ITEM 2.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS												R\$ 333.207,08		R\$ 5.896,98		R\$ 68.744,19		R\$ 74.581,17		R\$ 238.625,91
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				

2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.1	14.002.0105-0	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 X 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"x3/4" CHUMBADOS NO CONCRETO ,CORRIMÃO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"x1/2" E 2"x3/8",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1,14"x3/8" SOLDADAS NOS MONTANTES, UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMÃO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	16,75	R\$ 688,62	R\$ 11.701,89	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
2.4.2	14.002.0133-0	GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1,1/2"x3/8" A CADA 1,00M, QUATRO BARRAS HORIZONTAIS DE 2"x3/8" CHUMBADAS NOVAS SENDO DUAS DAS EXTREMEIDADES E DUAS DIVIDINDO A GRADE 3 PARTES IGUAIS,COM MONTANTES DE 1,1/2"x1,1/2" A CADA 2,00M CHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA DA GRADE.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	18,00	R\$ 688,36	R\$ 11.490,48	R\$ 0,00	18	R\$ 0,00		R\$ 11.490,48		R\$ 0,00
2.4.3	05.001.0023-0	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	12,40	R\$ 85,94	R\$ 817,66	12,4		R\$ 817,66	12,4	R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.4.4	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	15,00	R\$ 17,90	R\$ 268,50	5		R\$ 89,50	5	R\$ 179,00	10	R\$ 179,00
2.4.5	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UN	35,00	R\$ 5,70	R\$ 199,50	8		R\$ 45,60	8	R\$ 0,00	8	R\$ 153,90
2.4.6	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	8,00	R\$ 19,90	R\$ 159,20	8		R\$ 159,20	8	R\$ 0,00	8	R\$ 0,00
2.4.7	05.055.0010-0	LEITRA DE AÇO INOX Nº22,COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	40,00	R\$ 70,90	R\$ 2.836,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
R\$ 1.111,96													
3.5 - PAVIMENTAÇÃO													
2.5.3	11.001.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSÃO DE 10MPa, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BATONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,16	R\$ 382,56	R\$ 1.208,89	0		R\$ 0,00	3,16	R\$ 1.208,89	3,16	R\$ 1.208,89
TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAÇÃO													
R\$ 1.208,89													
3.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS													
2.6.1	11.013.0130-0	CONCRETO ARMADO FCM-20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA ADENSADO E COLOCADO 12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	1,50	R\$ 1.688,22	R\$ 2.532,33		1,5	R\$ 0,00		R\$ 2.532,33	1,5	R\$ 2.532,33
2.6.2	12.007.0020-0	PARDE DE BLOCOS VAZADOS(COBGOLO)DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 9,6KG,39,59X77CM,ASSENTES COM EM 10,006,0010	M2	38,15	R\$ 117,59	R\$ 4.486,06			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
2.6.3	12.001.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(20M)	M2	325,31	R\$ 68,00	R\$ 22.121,08	122,02		R\$ 8.297,36	187,29	R\$ 12.785,72	309,31	R\$ 11.093,08
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS													
R\$ 8.297,36													
3.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS													
2.7.1	13.001.0015-0	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3	M2	1208,43	R\$ 90,10	R\$ 36.373,74	296,8		R\$ 8.759,08	690,50	R\$ 20.784,05	901,30	R\$ 29.597,13
2.7.2	13.030.0282-0	REVISTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 11,60X11,60X0,90CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3, JUNTAS RECENTES DE 1CM DE LARGURA	M2	954,55	R\$ 104,74	R\$ 97.135,57	160		R\$ 16.474,00	112,00	R\$ 11.790,88	2.12,00	R\$ 22.204,88
2.7.3	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60 X 90CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TITANTES DE AFARME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	158,69	R\$ 40,95	R\$ 6.373,05		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.7.4	13.330.0075-0	REVISTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, 45X45CM, SUJEITO A TRAFÉGO INTENSO, RESISTÊNCIA A ABRASÃO PELO 1/4", ASSENTES EM SUPERFÍCIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:3,3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	31,00	R\$ 28,20	R\$ 874,20	31		R\$ 874,20	0	R\$ 0,00	31,00	R\$ 874,20
2.7.5	13.345.0095-0	PETORIL EM GRANTO CINZA CORUMBÁ, ESPESURA DE 2CM, LARGURA DE 20CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	27,95	R\$ 81,54	R\$ 2.279,04			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.7.6	13.365.0170-0	SOLEIRA EM GRANTO CINZA CORUMBÁ, 2CM DE ESPESURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFÍCIE EM OSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	22,75	R\$ 45,15	R\$ 1.027,16		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.7.7	13.380.0011-0	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO ALIESTIC, COM 4CM DE ESPESURA, MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4,8I CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESURA, FEITA COM GRANULHA Nº1 PRETA E CIMENTO, SUPERFÍCIE ESTUCADA APÓS A FUNDAÇÃO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE LIXTA	M2	259,36	R\$ 60,43	R\$ 15.673,12		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 15.673,12
2.7.8	13.030.0015-0	PODAPÉ EM GRANTO CINZA CORUMBÁ, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRAÇO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	227,59	R\$ 47,46	R\$ 10.801,42		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.801,42
2.7.9	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60 X 90CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TITANTES DE AFARME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	44,19	R\$ 40,95	R\$ 1.809,58		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.809,58
2.7.10	14.005.0040-0	DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, FORMADO POR PEÇAS DE 2X10CM, COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRA SERRADA 7,5X10,7X3 (3X3) E ESTRUTURA EM TOLAS DE MADEIRA COM 25CM DE DIAMETRO TRATADO A ALTURA UTIL, MEDIA DE 1,50M ENTERRAÇO 1,00M DE	M2	3,77	R\$ 1.702,44	R\$ 6.418,20		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 6.418,20
2.7.11	13.301.0125-1	CONTRA-PISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, NA ESPESURA DE 3CM	M2	23,00	R\$ 25,95	R\$ 596,85	23		R\$ 596,85	0	R\$ 0,00	23	R\$ 596,85
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES,													
R\$ 20.699,13													
3.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES													
2.8.1	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUNHEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	129,73	R\$ 50,47	R\$ 6.547,47		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
2.8.2	16.001.0020-0	FIXAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTACAS) COM AFARME DE COBRE Nº18, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	518,95	R\$ 15,05	R\$ 7.810,20		0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES													
R\$ 66.148,80													

2.8.5	16.002.0015-0	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCÊSAS, COLONIAS, ROMANA OU PORTUGUESA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	30,00	R\$ 21,20	R\$ 636,00		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00	30,00	R\$ 636,00
2.8.4	16.013.0001-0	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FRANCÊSAS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	546,95	R\$ 42,36	R\$ 23.253,52		R\$ 0,00		0	R\$ 0,00	546,95	R\$ 23.253,52
2.8 - PINTURAS				TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E									
2.8.1	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	1590,95	R\$ 13,90	R\$ 22.114,21	200	R\$ 2.780,00	872,00	R\$ 12.120,80	1072,00	R\$ 14.900,80	R\$ 7.213,41
2.8.2	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIUMIDO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SEDECO, ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRIL	M2	2921,37	R\$ 28,50	R\$ 83.259,05	0	R\$ 0,00	500	R\$ 14.250,00	500,00	R\$ 14.250,00	R\$ 69.009,05
2.8.3	17.017.0161-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	528,78	R\$ 9,35	R\$ 4.944,09		R\$ 0,00	0		0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.944,09
2.8.4	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRÊS DEMÃOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO	M2	45,40	R\$ 13,09	R\$ 594,29		R\$ 0,00	0		0,00	0	R\$ 594,29
				TOTAL DO ITEM 2.8 - PINTURAS		R\$ 110.911,63		R\$ 2.780,00		R\$ 16.370,80		R\$ 29.150,80	R\$ 81.760,83
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL		R\$ 925,39							
				TOTAL		R\$ 111.837,02	TOTAL	R\$ 67.863,37		R\$ 185.739,72			
				B.D.I.		23,54%	TOTAL COM BDI	R\$ 83.838,41	R\$ 229.462,85				R\$ 537.598,73
