



À
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

At.: Sr. Jonas Edinaldo da Silva.
Secretário de Educação

Ref.: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat – Bom Jardim – RJ, localidade Ponte do Berçot-1º Distrito


Tomada de Preços nº003/2022
Contrato nº 100/2022
Processo Administrativo nº 5935/2021

Prezado Senhor,

A empresa **Conservit Construção e Conservação Eireli**, com endereço à Avenida Vicente Joi, s/nº, Volta da Ferradura, Macuco - RJ, CNPJ nº 09.594.456/0001-00, vem solicitar à 2ª medição, dos serviços executados no período de 10/12/2022 a 28/02/2023, referente ao contrato supracitado, de "Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat – Bom Jardim – RJ, localidade Ponte do Berçot - 1º Distrito".

Macuco-RJ, 20/03/2023

Atenciosamente,



09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI

Avenida Vicente Joi, s/n

Volta da Ferradura - MACUCO - RJ

CEP 28.545-000

Conservit Construção e Conservação Eireli

Ademir Joi

CPF: 381.017.857-87

Obra: Reforma Escola Joana Calanhada- Bom Jardim/RJ
Prazo: 90 dias

PLANILHA ORÇAMENTARIA



09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI
Avenida Vicente Jói, s/n
Volta da Ferradura - MACUCO - RJ
CEP 28.545-000

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CONSERVIT		ITEMS RERTRATIFICADOS		2ª MEDIÇÃO		A REALIZAR				
					R\$ C/ DESCONTO	TOTAL	Quant.	R\$	TOTAL	Quant.	R\$	%	Quant.	R\$	%
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1- CANTIEIRO DE OBRAS															
1.1.1	01.050.0049-0	Projeto executivo de instalação de incêndio e SPDA para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	M2	192,23	5,74	1.103,40	192,23	5,74	1.103,40	192,23	1.103,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	01.050.0113-0	Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	M2	192,23	11,48	2.206,80	Pago na 1ª Medição: 09/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.3	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2,25	388,74	874,67	Pago na 1ª Medição: 09/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 1.1- CANTIEIRO DE OBRAS					4.184,87				1.103,40						
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					4.184,87										
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL															
2.1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
2.1.1	03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALACAIA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA ARGILA OU PICARRA) ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	1,00	44,41	55,51	1,00	44,41	55,51	1,00	55,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTIEIRO DE SERVICO	M3	2,13	66,91	142,52	3,93	66,91	262,96	3,93	262,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					198,03				318,47						
2.2 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS															
2.2.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO FCK-30MPA,INCLUNDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)DENSADO E COLOCADO 12,00M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	3,65	2.160,86	7.887,14	3,65	2.160,86	7.887,14	3,65	7.887,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.2	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SABIRO NO TRACO 1:8 EM PAREDES DE UMA VEZ(0 20M	M2	44,94	74,12	3.330,95	44,94	74,12	3.330,95	44,94	3.330,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.2 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					11.218,09				11.218,09						
2.3 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS															
2.3.1	13.001.0015-0	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3	M2	89,88	23,46	2.108,58	89,88	23,46	2.343,18	89,88	2.343,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.2	13.030.0290-0	Revestimento de paredes com cerâmica, com medidas em torno de (32x57)cm, assente conforme item 13.025.0016	M2	44,94	86,04	3.866,64	44,94	86,04	3.866,64	44,94	3.866,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.3	05.001.0095-0	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	192,23	9,14	1.756,98	Pago na 1ª Medição: 09/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.4	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESURAIGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR	M2	192,23	53,04	10.195,88	192,23	53,04	10.195,88	192,23	10.195,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Obra: Reforma Escola Joana Calanheira- Bom Jardim/RJ
Prazo: 90 dias

PLANILHA ORÇAMENTARIA



09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI

Avenida Vicente Jol, s/n
Volta da Ferradura - MACUCO - RJ
CEP 28.545-000

PLANILHA DE RERRATIFICAÇÃO

ITEM	CODIGO ENOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CONSERVIT		ITENS RERRATIFICADOS		2º MEDIÇÃO					
					R\$ C/ DESCONTO	TOTAL	Quant.	R\$	TOTAL	Quant.	R\$	%	Quant.	R\$
TOTAL DO ITEM 2.3 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS														
2.3.5	13.301.0125-1	CONTRAPISO BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 NA ESPESURA DE 3CM	M2	16,10	25,46	409,91	16,10	25,46	409,91	16,10	409,91	100,00%	0,00	0,00%
2.3.6	13.330.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTEDESPA-PANTE, 40X40CM, SUEITO A TRAFEGO INTENSO RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	16,10	59,75	961,98	3,60	59,75	215,10	3,60	215,10	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS														
2.4.1	15.015.0020-0	INSTALCAO DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" 12.00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	249,17	3.737,55	15,00	249,17	3.737,55	15,00	3.737,55	100,00%	0,00	0,00%
2.4.2	15.015.0280-0	INSTALCAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS EMBUTIDO NA ALVENARIA EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2" 27.00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+1, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	17,00	260,97	4.436,49	17,00	260,97	4.436,49	17,00	4.436,49	100,00%	0,00	0,00%
2.4.3	15.018.0120-0	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 27x4" INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS FORNECIMENTO E COLOCAAO	UN	20,00	5,80	116,00	20,00	5,80	116,00	20,00	116,00	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS														
8.290,04														
8.290,04														
8.290,04														
8.290,04														
2.5.1	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA COM TRES DEMASOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	33,60	12,84	431,42	33,60	12,84	431,42	33,60	431,42	100,00%	0,00	0,00%
2.5.2	14.002.0105-0	Basculante de ferro de 0,50 x 0,30m em cantoneira de 3/4" x 1/8" com uma fâscula em cantoneira de 5/8" x 1/8" , com alavanca de comando com punho cromado. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	405,28	810,56	1,00	405,28	405,28	1,00	405,28	100,00%	0,00	0,00%
2.5.3	13.365.0170-0	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUIMBA, 2CM DE ESPESURA COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2,2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	3,20	47,40	151,68	3,20	47,40	151,68	3,20	151,68	100,00%	0,00	0,00%
2.5.3.A	13.365.0155-0	Painel em granito cinza corumbá, 3cm de espessura, largura de 28cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no treço 1:3,3 e rejuntamento com cimento branco	M		119,24		12,50	119,24	1.490,50	12,50	1.490,50	100,00%	0,00	0,00%
2.5.3.B	13.025.0061-0	ASSENTAMENTO DE PETITOL, DE MARMORE, GRANITO OU AFINS, EXCLUSIVE ESTES, DE 20 A 30CM DE LARGURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.346.0015	M		44,72		12,50	44,72	559,00	12,50	559,00	100,00%	0,00	0,00%
2.5.4	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA DE 1 FOLHA DE ABRIR DE ENTRADA DE SERVIÇO CONSTANDO DE FORNEC, SICOLOCAÇÃO DE -FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR DE LATÃO DE ACABAMENTO CROMADO- 3 DOBRADICAS 3Y/2 1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLOS DE LATÃO	UN	10,00	169,35	1.693,50	10,00	169,35	1.693,50	10,00	1.693,50	100,00%	0,00	0,00%
2.5.5	14.006.0037-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA DE 80X210CM, COM MARCO DE 73,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	625,48	6.254,80	10,00	625,48	6.254,80	10,00	6.254,80	100,00%	0,00	0,00%


Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A6928-7

Obrat: Reforma Escola Joana Catanheda- Bom Jardim/RJ
Prazo: 90 dias

PLANILHA ORÇAMENTARIA



PLANILHA DE RERRATIFICAÇÃO



09.594.45610001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI

Avenida Vicente Jol, s/n

Volta da Ferradura - MACUCO - RJ

CEP 28.545-000

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CONSERVIT		ITENS RERRATIFICADOS		2ª MEDIÇÃO				08/03/2023			
					R\$ C/	TOTAL	SERVIÇOS		REALIZADO		A REALIZAR					
					DESCONTO		Quant.	R\$	TOTAL	Quant.	R\$	%	Quant.	R\$	%	
2.5.6	14.006.0286-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM, TIPO VVP (VENEZIANA VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	1.136,04	3.408,12	0,00	1.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.5.6 A	14.004.0721-0	Vidro temperado de 6mm de espessura para janelas,Fornecimento e Colocação.	M²		361,11		14,40	361,11	5.199,98	14,40	5.199,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.5.7	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS EM"U" EM TUBO DE 1 1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304 LIGA 18,8 MEDINDO 60X60CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	208,44	1.250,64	6,00	208,44	1.250,64	6,00	1.250,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.5.8	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO,BACTERICIDA, PARAAMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES EM DUAS DEMOIS SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMOIS DE MASSA ACRIL	M2	606,60	30,13	18.276,86	606,60	30,13	18.276,86	606,60	18.276,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL DO ITEM 2.5- PINTURAS/PORTAS/JANELAS						32.277,58			35.713,67		35.713,67					
2.6 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANTARIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS																
2.6.1	18.002.0090-0	Vaso sanitário de louça branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO	UN	2,00	410,14	820,28	2,00	410,14	820,28	2,00	820,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.6.2	15.004.0105-0	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e válvula de descarga (exclusive estas) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões.	UN	2,00	291,4	582,80	2,00	291,40	582,80	2,00	582,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.6.3	15.004.0063-0	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm e conexões.	UN	2,00	146,22	292,44	2,00	146,22	292,44	2,00	292,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.6.4	05.001.0044-0	REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESA9, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	192,23	10,59	2.035,72	Pago na 1ª Medição: 09/12/2022			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.6.5	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEIRA E TERÇAS DE 3X4 1/2" CABROS DE 3X1 1/2", RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA SEM TESSOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	210,23	100,16	21.056,64	Pago na 1ª Medição: 09/12/2022			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.6.6	16.002.0005-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA EXCLUSIVE CUMEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	210,23	67,60	14.211,55	Pago na 1ª Medição: 09/12/2022			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.6.7	16.002.0015-0	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESA9, COLONIAS ROMANAOU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	26,30	21,55	566,77	Pago na 1ª Medição: 09/12/2022			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.6.8	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 127X9CM APROXIMADAMENTE METAL CROMADO FORNECIMENTO	UN	2,00	26,96	53,92	2,00	26,96	53,92	2,00	53,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.6.9	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPensa PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X53,9)CM INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOMMENTO CROMADO, RABOCHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PARPEDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO FORNECIMENTO	UN	2,00	728,32	1.456,64	2,00	728,32	1.456,64	2,00	1.456,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Obr: Reforma Escola Joana Catanheda- Bom Jardim/RJ
Prazo: 90 dias

PLANILHA ORÇAMENTARIA



PLANILHA DE RERATIFICAÇÃO

09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI
Avenida Vicente Jol, s/n
Volta da Ferradura - MACUCO - RJ
CEP 28.545-000

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CONSERVIT		ITENS RERATIFICADOS		2º MEDIÇÃO		08/03/2023		
					R\$ C/	TOTAL	SERVIÇOS	Quant.	R\$	Quant.	R\$	%	
2.6.10	09.015.0324-0	ESCORREGA DE 510ANOS C/AL TUBA DE 1,57M MADEIRA/PAPELADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO/EXT E INTERNAMENTE/DE 3/4" E 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8" COM PINTURA DE BASE GALVITE E	UN	1,00	3.143,20	3.143,20	1,00	3.143,20	1,00	3.143,20	100,00%	0,00	0,00%
2.6.11	09.015.0314-0	BALANÇO DE 510ANOS COMPOST C/2 CADEIRAS PRESAS EMCORENTES GALV.FIXAD. PMEIO DE BRACAD C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.EXT E INTERNAMENTE/IDE 2 1/2" ESP PAREDE 1/8" SUSPENSAS EM	UN	1,00	2.704,43	2.704,43	1,00	2.704,43	1,00	2.704,43	100,00%	0,00	0,00%
2.6.12	09.015.0330-0	GANGORRA DE 510ANOS C/2 PRANCHAS MADEIRA APARELHADA. ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO/EXT E INTERNAMENTE/ DE 2" E 2 1/2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8" COM PINTURA DE BASE	UN	1,00	2.105,41	2.105,41	1,00	2.105,41	1,00	2.105,41	100,00%	0,00	0,00%
2.6.12 A	09.005.0029-0	CAPINA DE CONSERVACA/1 VEZ POR ANO,EM TERRENO DE VEGETACAOPOUCO DENSIA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS (ROCADEIRA MANUAL)	M²	4,03			200,00	806,00	200,00	806,00	100,00%	0,00	0,00%
2.6.13	15.020.0155-0	LAMPADA LED BULBO A60DY 8W, 100/240V, BASE E-27/FORNECIMENTO E COLOCAAO	UN	50,00	8,28	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.6.14	18.280.0065-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE FORNECIMENTO E COLOCAAO	UN	50,00	3,44	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.6.15	15.007.0501-0	Quadro de distribuão de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 12 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAAO	UNID.	1,00	177,28	177,28	1,00	177,28	1,00	177,28	100,00%	0,00	0,00%
2.6.16	21.030.0100-0	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 40A, FORNECIMENTO	UNID.	1,00	44,60	44,60	1,00	44,60	1,00	44,60	100,00%	0,00	0,00%
2.6.17	15.007.0572-0	Disjuntor termomagnético, unipolar, de 40A x 250V, FORNECIMENTO e COLOCAAO	UNID.	1,00	15,03	15,03	1,00	15,03	1,00	15,03	100,00%	0,00	0,00%
2.6.18	15.007.0570-0	Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10A x 250V, FORNECIMENTO e COLOCAAO	UNID.	1,00	12,38	12,38	1,00	12,38	1,00	12,38	100,00%	0,00	0,00%
2.6.19	15.007.0570-0	Disjuntor termomagnético, unipolar, de 20A x 250V, FORNECIMENTO e COLOCAAO	UNID.	2,00	12,38	24,76	2,00	24,76	2,00	24,76	100,00%	0,00	0,00%
2.6.20	15.007.0570-0	Disjuntor termomagnético, unipolar, de 25A x 250V, FORNECIMENTO e COLOCAAO	UNID.	2,00	12,38	24,76	2,00	24,76	2,00	24,76	100,00%	0,00	0,00%
2.6.21	15.007.0000-0	Dispositivo proteão de auto-DPS-175V 68kVA, classe I Va e 1,2kV	PC	1,00	239,90	239,90	1,00	239,90	1,00	239,90	100,00%	0,00	0,00%
2.6.22	15.009.0125-0	Cabo sólido de cobre eletrolítico nu, lâmpara mole, classe 2, seção circular de 16mm², FORNECIMENTO e COLOCAAO	m	3,00	7,85	23,58	3,00	23,58	3,00	23,58	100,00%	0,00	0,00%
2.6.23	15.007.0208-0	Haste para aterramento, de cobre de 5/8" (16mm), com 3,00m de comprimento, FORNECIMENTO e COLOCAAO	PC	1,00	84,90	84,90	1,00	84,90	1,00	84,90	100,00%	0,00	0,00%
2.6.24	21.028.0150-0	Grampo de aterramento	PC	1,00	56,69	56,69	1,00	56,69	1,00	56,69	100,00%	0,00	0,00%
2.6.25	18.027.0000-0	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, lâmpada LED de 2 x 18W, FORNECIMENTO e COLOCAAO	PC	24,00	39,90	967,60	24,00	967,60	24,00	967,60	100,00%	0,00	0,00%
2.6.26	18.027.0000-0	Lâmpada LED tubular, de 18W, FORNECIMENTO e COLOCAAO	PC	48,00	24,90	1.195,20	48,00	1.195,20	48,00	1.195,20	100,00%	0,00	0,00%
2.6.27	18.027.0000-0	Plafonier em PVC branco de sobrepor	PC	21,00	5,90	123,90	21,00	123,90	21,00	123,90	100,00%	0,00	0,00%
2.6.29	15.020.0150-0	Lâmpada LED, bulbo, 15W, 100/240V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAAO	PC	20,00	9,94	198,80	20,00	198,80	20,00	198,80	100,00%	0,00	0,00%
2.6.30	15.015.0070-0	Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 50,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenari	UNID.	6,00	688,14	4.128,84	6,00	4.128,84	6,00	4.128,84	100,00%	0,00	0,00%
2.6.31	15.015.0250-0	Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	UNID.	22,00	323,42	7.115,24	22,00	7.115,24	22,00	7.115,24	100,00%	0,00	0,00%
2.6.32	15.008.0080-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 1,5mm², 450/750V, FORNECIMENTO e COLOCAAO	M	200,00	2,72	544,00	200,00	544,00	200,00	544,00	100,00%	0,00	0,00%

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Obra: Reforma Escola Joana Catanheda- Bom Jardim/RJ
Prazo: 90 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PLANILHA DE RERRATIFICAÇÃO

07
Q

09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI

Volta da Ferradura - MACUCO - RJ

CEP 28.545-000

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	CONSERVIT		ITENS RERATIFICADOS		2ª MEDIÇÃO 08/03/2023						
					R\$ C/ DESCONTO	TOTAL	SERVİÇOS	REALIZADO			A REALIZAR				
							Quant.	R\$ Unitario	TOTAL	Quant.	R\$	%	Quant.	R\$	%
2.6.33	15.008.0085-0	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	3,74			500,00	3,74	1.870,00	500,00	1.870,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.34	15.008.0090-0	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	5,27			400,00	5,27	2.108,00	400,00	2.108,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.35	15.019.0056-0	Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de sobrepôr, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UNID.	8,99			22,00	8,99	197,78	22,00	197,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.36	15.019.0020-0	Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UNID.	8,36			11,00	8,36	91,96	11,00	91,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.37	15.019.0025-0	Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforoscentes e placa, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UNID.	13,56			1,00	13,56	13,56	1,00	13,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.37	14.004.0010-0	Vidro plano transparente comum, com 3mm de espessura, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M²	83,73			1,50	83,73	140,60	1,50	140,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.6 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						49.615,79									
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL						120.899,49									
					B.D.I	125.084,36	Total pago na 1ª medição	42.709,13	105.028,87		105.028,87			0,00	
					TOTAL GERAL:	25.929,99	B.D.I	20,73%	21.772,49		21.772,49			0,00	
						151.014,35	A RECEBER		126.801,36		126.801,36			0,00	

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

CAU A9928-7



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

	DIAS DE OBRA: 48	FOLHA: 49
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM
DIA DA SEMANA Sábado, 10/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	NUBLADO CHUVOSO

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 49	FOLHA: 50
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Domingo, 11/12/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.				
		DIAS DE OBRA: 50		FOLHA: 51
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM
		TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 12/12/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO X
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		CHUVOSO X

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Raspagem da pintura antiga.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
	DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA: 51	FOLHA: 52
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 13/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	NUBLADO X
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	CHUVOSO X

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Raspagem da pintura antiga.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

 CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.	
DIAS DE OBRA: 52	FOLHA: 53
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 14/12/2022	TEMPO: BOM INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023
	NUBLADO X CHUVOSO X



MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Raspagem da pintura antiga.

2- Limpeza da obra.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 53		FOLHA: 54	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM	
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 15/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	NUBLADO CHUVOSO X	



MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Raspagem da pintura antiga.

2- Envernizamento do madeiramento do telhado.


Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
	OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.	
	DIAS DE OBRA: 54	FOLHA: 55
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 16/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	



MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Raspagem da pintura antiga.

2- Envernizamento do madeiramento do telhado.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 55		FOLHA: 56	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO	
DIA DA SEMANA Sábado, 17/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

25
1
RUBRICA

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
		DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 56	FOLHA: 57
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Domingo, 18/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


1- Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 57	FOLHA: 58
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 19/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

- 1- Raspagem da parede.
- 2- Arancamento de portas.
- 3- Início da construção do banheiro para portadores de deficiência.
- 4- Cavar chão para descobrir a rede de esgoto.

Obs.: Visita da Gestora da Escola : Roberta G Bastos.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

	DIAS DE OBRA: 58	FOLHA: 59
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 20/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Raspagem da parede.

2- Arancamento de portas e janelas.

3- Construção do banheiro para portadores de deficiência.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



 CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.	
DIAS DE OBRA: 59	FOLHA: 60
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 21/12/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X
INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

- 1- Raspagem da parede.
- 2- Arancamento de portas e janelas.
- 3- Construção do banheiro para portadores de deficiência.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 60 **FOLHA:** 61

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM

DIA DA SEMANA

Quinta-Feira, 22/12/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

X

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

1- Raspagem da parede.

2- Construção do banheiro para portadores de deficiência.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 61		FOLHA: 62	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO	
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 23/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

- 1- Raspagem da parede.
- 2- Construção do banheiro para portadores de deficiência.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7



 CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.	
DIAS DE OBRA: 62	FOLHA: 63
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022
DIA DA SEMANA Sábado, 24/12/2022	TEMPO: BOM INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023
	NUBLADO CHUVOSO

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 62	FOLHA: 63
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Domingo, 25/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não houve serviço.

DIA DE NATAL

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 63	FOLHA: 64
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM NUBLADO X CHUVOSO
	DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 26/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Instalação da caixa d'água de plástico e retirada da caixa de amianto.

2- Fechamento do vão entre o telhado e alvenaria para não entrar pássaros.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 64	FOLHA: 65
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 27/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não houve serviço, motivo: chuva.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 65		FOLHA: 66	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 28/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não houve serviço, motivo: chuva.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 66		FOLHA: 67	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X	
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 29/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não houve serviço, motivo: chuva.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
CSRN - Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 67	FOLHA: 68
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO X
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 30/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não houve serviço, motivo: chuva.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 68	FOLHA: 69
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sábado, 31/12/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não houve serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 69	FOLHA: 70
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA Domingo, 01/01/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:
 NÃO HOUE SERVIÇO.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 70

FOLHA: 71

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira, 02/01/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Execução da elétrica.

2- Pintura interna.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU 49928-7





CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.

DIAS DE OBRA: 72

FOLHA: 73

CONTRATO

n.º: 100/2022

INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022

TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Quarta-Feira, 04/01/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Execução da elétrica.

2- Pintura interna e externa.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto

CAU A9928-7

Fiscal da Obra



	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
	OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.	
	DIAS DE OBRA: 87	FOLHA: 88
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 19/01/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

- 1- Pintura das portas.
- 2- Execução do forro de PVC.
- 3- Arremate do vão de janelas 1,50 x 1,20

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 88	FOLHA: 89
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 20/01/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

- 1- Pintura das portas.
- 2- Execução do forro de PVC.
- 3- Arremate do vão de janelas 1,50 x 1,20

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7

Fiscal da Obra

48
2

		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 89	FOLHA: 90
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		
DIA DA SEMANA Sábado, 21/01/2023			

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra

	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
	DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA: 90	FOLHA: 91
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA Domingo, 22/01/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 91	FOLHA: 92
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 23/01/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

- 1- Pintura das portas.
- 2- Execução do forro de PVC.
- 3- Arremate do vão de janelas 1,50 x 1,20

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 92	FOLHA: 93
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 24/01/2023			

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

- 1- Pintura das portas.
- 2- Execução do forro de PVC.
- 3- Arremate do vão de janelas 1,50 x 1,20

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 93	FOLHA: 94
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 25/01/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Limpeza do pátio.

2- Execução do forro de PVC.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 96	FOLHA: 97
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		
DIA DA SEMANA Sábado, 28/01/2023			

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
CSRA: Prefeitura da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 97	FOLHA: 98
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA Domingo, 29/01/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
 Arquiteto
 CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
		DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 98	FOLHA: 99
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 30/01/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Execução do forro de PVC.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 99	FOLHA: 100
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 31/01/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	3
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Execução do forro de PVC.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



	CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
	OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.	
	DIAS DE OBRA: 100	FOLHA: 101
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 01/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


1- Execução do forro de PVC.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
		DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 101	FOLHA: 102
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 02/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

- 1- Execução do forro de PVC.
- 2- Revisão da elétrica e instalações das luminárias.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 102		FOLHA: 103	
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 03/02/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	
		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Execução do forro de PVC.


2- Revisão da elétrica e instalações das luminárias.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 103		FOLHA: 104	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sábado, 04/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
		DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 104	FOLHA: 105
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA Domingo, 05/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU 49928-7



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 105	FOLHA: 106
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 06/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Revisão da hidráulica.


2- Revisão da elétrica e instalações das luminárias.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 106	FOLHA: 107
CONTRATO n.º: 100/2022		INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 07/02/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022	
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Revisão da hidráulica.

2- Revisão da elétrica e instalações das luminárias.

Anotação do Fiscal da Obra:

 Conservit	Fiscal da Obra
Elton Freitas Vieira Arquiteto CAU A9928-7	



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 107	FOLHA: 108
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 08/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


- 1- Revisão da hidráulica.
- 2- Revisão da elétrica e instalações das luminárias.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 108	FOLHA: 109
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 09/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


1- Revisão da hidráulica, instalação de torneiras.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU 49928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 109	FOLHA: 110
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 10/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Instalação do parquinho.

Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit
Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 110	FOLHA: 111
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sábado, 11/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
		da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.	
		DIAS DE OBRA: 111	FOLHA: 112
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	DIA DA SEMANA Domingo, 12/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra

LO
L

		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 112		FOLHA: 113	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 13/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Instalação do parquinho.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



 CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.	
DIAS DE OBRA:	113
FOLHA:	114
CONTRATO	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022
n.º: 100/2022	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022
DIA DA SEMANA	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022
Terça-Feira, 14/02/2023	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023
TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Instalação do parquinho.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 114	FOLHA: 115
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 15/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Revisão geral.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA			
 da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA:		115	FOLHA: 116
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 16/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Revisão geral.

Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA	
		da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.	
		DIAS DE OBRA: 116	FOLHA: 117
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 17/02/2023			

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA			
 da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA:		117	FOLHA: 118
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO:	29/09/2022	TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO:	29/12/2022	
DIA DA SEMANA Sábado, 18/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	24/10/2022	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



 CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 118	FOLHA: 119
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Domingo, 19/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA			
 da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 119		FOLHA: 120	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 20/02/2023			

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


Não Houve Serviço. CARNAVAL

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA			
 da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 120		FOLHA: 121	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 21/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


Não Houve Serviço. CARNAVAL

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA			
 da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 121		FOLHA: 122	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022 TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	DIA DA SEMANA Quarta-Feira, 22/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:


Não Houve Serviço. QUARTA-FEIRA DE CINZA.

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.			
DIÁRIO DE OBRA			
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
		DIAS DE OBRA: 122	FOLHA: 123
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Quinta-Feira, 23/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Instalação das janelas blindex.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra

81
L

CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.			
DIÁRIO DE OBRA			
da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 123		FOLHA: 124	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sexta-Feira, 24/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
Servente	2
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Instalação das janelas blindex.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI. DIÁRIO DE OBRA			
 da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.			
DIAS DE OBRA: 124		FOLHA: 125	
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Sábado, 25/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA:	125	FOLHA: 126
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Domingo, 26/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		



DIÁRIO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	
Encarregado	
Pedreiro	
Servente	
Motorista	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.


Serviços realizados:

Não Houve Serviço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
		DIÁRIO DE OBRA	
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA:	126	FOLHA: 127
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Segunda-Feira, 27/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		

CONSERVIT DIÁRIO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	
Pedreiro	1
servente	2
Motorista	


EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

1- Instalação das janelas blindex (final).

Anotação do Fiscal da Obra:

 Conservit Elton Freitas Vieira Arquiteto CAU A9928-7	Fiscal da Obra
---	-----------------------



		CONSERVIT Construção e Conservsação EIRELI.	
		DIÁRIO DE OBRA	
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim/RJ.		
	DIAS DE OBRA:	127	FOLHA: 128
CONTRATO n.º: 100/2022	INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2022		TEMPO: BOM X
	TÉRMINO DO CONTRATO: 29/12/2022		
DIA DA SEMANA Terça-Feira, 28/02/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 24/10/2022		NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 24/01/2023		



Cantagalo, 08 de março de 2023.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário de Obras, confeccionado em meio digital, impresso em 2 vias, que teve a finalidade de registrar todo o desenvolvimento da obra de "**Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat - Bom Jardim / RJ - localidade: Ponte Berçot, 1º Distrito de Bom Jardim - RJ**".

conforme Contrato n.º 100/2022 , Tomada de preço n.º 003/2022;

entre a Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ e a Conservit Construção e Conservação EIRELI.

prazo: 93 dias

24/10/2022 a 24/01/2023

Constou nos registros o efetivo da obra, quantidade de equipamento, serviços realizados e qualquer fato que se fizer necessário para descrição dos eventos ocorridos durante a execução dos serviços.

Conservit Construção e Conservação EIRELI

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ.
Fiscal da Obra - carimbo e matrícula



87
e

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO


OBRA: Reforma da Escola Municipalizada Joana Catanheda Monnerat.

Endereço: Ponte Berçat, 1º Distrito, Bom Jardim-RJ.

Contrato n.º 100/2022 Tomada de preço: 003/2022

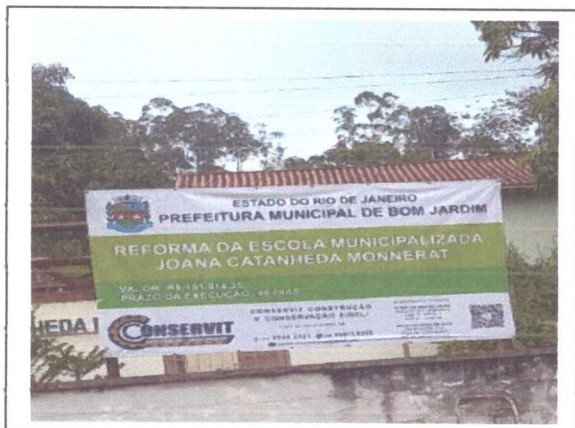

PLACA DE OBRA

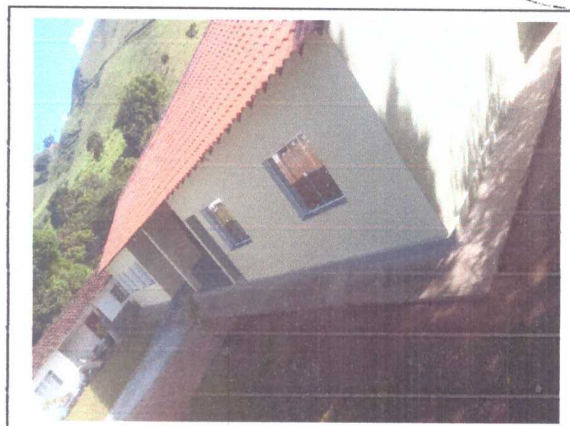


TEHADO, PINTURA e JANELA BLINDEX




BANHEIRO P/ PORTADORES DEF.



PINTURA, TELHADO e PARQUINHO

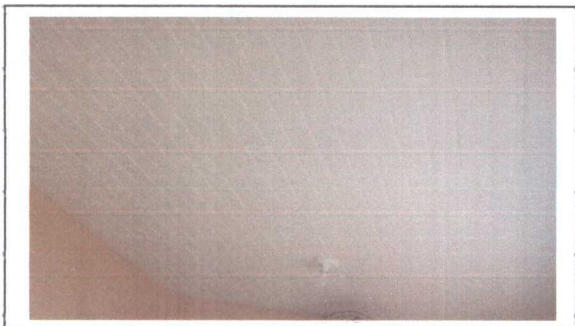

FORRO PVC



FORRO PVC e PINTURA INTERNA

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU 49928-7



REFORMA DA COZINHA



FORRO PVC, PINTURA SALA e PORTA



INSTALAÇÃO PARQUINHO



RAMPA DE ACESSIBILIDADE e PNTURA CALÇADA

Elton Freitas Vieira
Arquiteto
CAU A9928-7
