




CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTAL –
FAZENDA FORTALEZA – BOM JARDIM- RJ, LOCALIDADE RURAL
DENOMINADA PINDUCA – 4º DISTRITO DE BOM JARDIM

MEDIÇÃO 03

Período: 01/04/23 a 30/06/23

PLANILHA DE MEDIÇÃO	CND FGTS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	GFIP/SEFIP
DIÁRIO DE OBRAS	GUIA E COMPROVANTE INSS
CND TRIBUTOS FEDERAIS E INSS	GUIA E COMPROVANTE FGTS
CND ESTADUAL	CONTRACHEQUES
CND DIVIDA ATIVA	DECLARAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO
CND MUNICIPAL	NOTA FISCAL (AGUARDANDO)
CND TRABALHISTA	





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ

ETAPA Nº: 3,00

MEDIÇÃO Nº: 3ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/04/2023 a 30/06/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR	
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO FINANCEIRO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - CANTIEIRO DE OBRAS												
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES												
1.1.1	01.050.0049-0	ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	349,50	5,45	1.904,77	0,00	0,00	349,50	1.904,77	0,00	0,00
1.1.2	01.050.0113-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELETTRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	349,50	10,94	3.823,53	0,00	0,00	349,50	3.823,53	0,00	0,00
1.1.3	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	366,82	366,82	0,00	0,00	1,00	366,82	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						6.095,12		R\$ 0,00		R\$ 6.095,12		R\$ 0,00

2.0 - CONSTRUÇÃO DE MURO, REFORMA DA ÁREA EXTERNA E COZINHA

2.1 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO	M3	2,50	41,07	102,67	0,00	0,00	2,50	102,67	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.0 - MOVIMENTO DE TERRA						102,67		R\$ 0,00		R\$ 102,67		R\$ 0,00

2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIAS

2.2.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO	M3	3,47	2.027,03	7.033,79	0,00	0,00	3,47	7.033,79	0,00	0,00
2.2.2	05.001.0023-0	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TÍTULOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTIEIRO DE SERVIÇO	M3	0,60	61,88	37,13	0,00	0,00	0,60	37,13	0,00	0,00

Servio Oliveira
Engenheiro da Silva
CREA-RJ 2020102946
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102946



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ

ETAPA Nº: 3.00

MEDIÇÃO Nº: 3ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/04/2023 a 30/06/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR	
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO FINANCEIRO
2.2.3	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8 EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M) DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	30,00	68,50	2.055,00	0,00	0,00	30,00	2.055,00	0,00	0,00
2.2.4	12.009.0006-0	PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA, NO TRACO 1:3:5	M2	5,40	429,66	2.320,16	0,00	0,00	5,40	2.320,16	0,00	0,00
2.2.5	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESURA DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA	M2	98,00	41,02	4.019,96	0,00	0,00	98,00	4.019,96	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIA						R\$ 15.466,04		R\$ 0,00		R\$ 15.466,04		R\$ 0,00
2.3 - CHAPISCO/EMBOÇO												
2.3.1	13.001.0015-0	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,50CM, 1,50CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	467,50	21,93	10.252,27	116,87	2.562,97	467,50	10.252,27	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.3 - CHAPISCO						R\$ 10.252,27		R\$ 2.562,97		R\$ 10.252,27		R\$ 0,00
2.4 - DIVERSOS												
2.4.1	14.002.0087-0	PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1 1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,00	830,77	6.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6.646,16

Stefanie Oliveira da Silva
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020102645



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ETAPA Nº:		MEDIÇÃO Nº:		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR						
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO					
2.4.2	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20MM) E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	150,00	50,24	7.536,00	150,00	7.536,00	0,00	0,00							
2.4.3	14.006.0030-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALZARES DE 6X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	635,49	3.177,45	0,00	0,00	2,00	1.270,98	3,00	1.906,47					
2.4.4	15.004.0063-0	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXÕES	UN	5,00	139,21	696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	696,05					
2.4.5	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,FERRAGENS EM METAL CROMADO,SIFAO 1680 DE 1"X1 1/4" TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BRANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600,RABICHO EM PVC,FORNECIMENTO	UN	5,00	158,76	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	793,80					

Sandro Oliveira da Silva
Sandro Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2667102945





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ												
					ETAPA Nº:	MEDIÇÃO Nº:	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023					
					3,00	3ª						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR	
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO FINANCEIRO
2.4.6	18.002.0070-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO, COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM, COM SAIDA DE 1/2" BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	3,00	302,71	908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	908,13
2.4.7	14.006.0290-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM, EM 2 FOLHAS, PARA VIDRO, COM BANDEIRA EM CANGILHO DE VIDRO EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.572,91	3.145,82	2,00	3.145,82	2,00	3.145,82	0,00	0,00
2.4.8	14.006.0305-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI BASCULANTE DE 100X140X3CM, COM 3 FOLHAS EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	891,45	1.782,90	2,00	1.782,90	2,00	1.782,90	0,00	0,00
2.4.9	14.007.0039-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, PIVOTANTE, DE 1 FOLHA, EXTERNA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS) DE: -FECHADURA COM TRINCO ROLETE EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -PUXADOR VERTICAL EM ACO INOX, -DOBRADICA PIVOTANTE (PIVO INFERIOR E SUPERIOR) EM ACO INOX	UN	5,00	219,27	1.096,35	5,00	1.096,35	5,00	1.096,35	0,00	0,00
2.4.10	14.007.0140-0	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, DE ABRIR, DE 2 FOLHAS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC., DE: 1 CREMONA, C/VARA DE LATAO, 1,50M, ACABAMENTO CROMADO, 2 CARRANÇAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA, 6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 2,1/2"x3", COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	2,00	94,57	189,14	2,00	189,14	2,00	189,14	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CREA-RJ 2020102946



INDICE EMOP - NOVEMBRE/2021

ETAPA Nº:	MEDIDAÇÃO Nº:
00	01

REALIZADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
2.4.11	14.007.0135-0	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA BASCULANTE CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO DE 2 PARES DE GONZOS DE SOREPOR DELATAO, TIPO MACHO-FEMEA, 1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHODE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR	UN	2,00	29,13	58,26	2,00	58,26	0,00	0,00		
2.4.12	13.030.0255-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS CORES ECONOMICAS (BRANCO, CINZA, BEGE, AZUL, VERDE, MARROM E PRETO), COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO	M2	147,60	80,60	11.896,56	147,60	11.896,56	147,60	11.896,56	0,00	0,00
2.4.13	13.330.0050-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESURA, DESTINADA A CARGA PESADA COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. V ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSO COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	174,00	63,43	11.036,82	174,00	11.036,82	174,00	11.036,82	0,00	0,00
2.4.14	15.003.0510-0	CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO, TIPO PENDENTE, DN 15MM (1/2"), TEMPERATURA 68°C (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	24,69	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	49,38

Eugenio

0384-9055/97/0003-0000\$05.00/0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSERVIT
conservação e conservação

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA
FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM
JARDIM - RJ

ETAPA Nº: 3,00
MEDIÇÃO Nº: 3ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/04/2023 a 30/06/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR	
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO
												FINANCEIRO
2.4.15	15.003.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO/EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO BRACO, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	19,62	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	39,24
2.4.16	08.020.0008-0	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre cimento de pó de pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação	M2	126,00	64,35	8.108,10	126,00	8.108,10	126,00	8.108,10	0,00	0,00
2.4.17	16.011.0005-0	Cobertura em chapas de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, inclusive madeiramento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M2	6,00	367,52	2.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.205,12
2.4.18	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA SEM BRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERIORS E EXTERIORS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAS SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	672,84	28,27	19.021,19	168,21	4.755,30	672,84	19.021,19	0,00	0,00
2.4.19	17.018.0110-0	Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	M2	197,50	11,97	2.364,08	98,75	1.182,04	197,50	2.364,08	0,00	0,00
2.4.20	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE DE 5/8"(16MM) COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	56,69	226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	226,76

Serviço de Engenharia Civil
Eng. Roberto Silva
CREA: 002.010299/RS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ETAPA Nº: 3,00		MEDIÇÃO Nº: 3ª		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR						
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO					
2.4.21	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO PARA PARA-RAIO COM 20CM DE COMPRIMENTO.COM ISOLADOR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	15.00	17.07	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	256.05					
2.4.22	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO 3/8"x600MM.FIXAÇÃO COM ROSCA MECANICA E ABRACADERA INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00					
2.4.23	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES.DE EMBUTIR.COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA. TRIFASICO PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1.00	373.04	373.04	1.00	373.04	1.00	373.04	0.00	0.00					
2.4.24	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5.00	8.87	44.35	5.00	44.35	5.00	44.35	0.00	0.00					
2.4.25	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4.00	27.82	111.28	4.00	111.28	4.00	111.28	0.00	0.00					
2.4.26	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO COMPREENDENDO.PREPARO.CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	300.00	4.78	1.434.00	300.00	1.434.00	300.00	1.434.00	0.00	0.00					
2.4.27	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO COMPREENDENDO.PREPARO.CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200.00	6.98	1.396.00	200.00	1.396.00	200.00	1.396.00	0.00	0.00					



SELYO OLIVEIRA DE SILVA
Engenheiro Civil
CRM- RJ 202.302845



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ

INDICE EMOP - NOVEMBRE/2021

FORIALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ													ETAPA Nº: 3,00		MEDICÇÃO Nº: 3ª		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR									
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	ACUMULADO	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO	FINANCEIRO							
2.4.28	15 015 0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS CONEXÕES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	10,00	236,65	2.366,50	10,00	2.366,50	10,00	2.366,50	0,00	0,00								
2.4.29	15 015 0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A, PADRAO BRASILEIRO COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	229,88	3.448,20	15,00	3.448,20	15,00	3.448,20	0,00	0,00								
2.4.30	15 029 0011-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	37,39	149,56	4,00	149,56	4,00	149,56	0,00	0,00								
2.4.31	15 029 0012-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTO DE COLOCACAO	UN	4,00	55,40	221,60	4,00	221,60	4,00	221,60	0,00	0,00								
2.4.32	15 029 0101-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	70,85	141,70	2,00	141,70	2,00	141,70	0,00	0,00								
2.4.33	15 036 0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E EASSENTAMENTO	M	72,00	7,90	568,80	72,00	568,80	72,00	568,80	0,00	0,00								
2.4.34	15 036 0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E EASSENTAMENTO	M	48,00	12,76	612,48	48,00	612,48	48,00	612,48	0,00	0,00								

ESTADO DO RIO DE JANEIRO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM											
											
GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021											
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº:	MEDIÇÃO Nº:	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/04/2023 a 30/06/2023		
					UNIT.	TOTAL					
										QUANT.	NO PERÍODO
2.4.35	15.036.0039-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM.SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	60,00	17,46	1.047,60	60,00	1.047,60	0,00	0,00	
2.4.36	15.036.0052-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM.SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECINTOE ASSENTAMENTO	M	24,00	24,67	592,08	24,00	592,08	0,00	0,00	
2.4.37	15.036.0053-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM.SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECINTOE ASSENTAMENTO	M	18,00	50,48	908,64	18,00	908,64	0,00	0,00	
TOTAL DO ITEM 2.4 - DIVERSOS						94.724,19		R\$ 64.203,12	R\$ 80.922,03	R\$ 13.802,16	
Sub - Total						126.640,29		66.766,09	112.838,13	13.802,16	
B.D.I - 20,73%						26.252,53		13.840,61	23.391,34	2.861,19	
Total do Orçamento						152.892,82		R\$ 80.606,70	R\$ 136.229,47	R\$ 16.663,35	


 Silvio Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 202.12045




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO - 01/07/2023

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal

Endereço: Fazenda Fortaleza – Bom Jardim – RJ, localidade rural denominada Pinduca – 4º Distrito de Bom Jardim


Contrato n.º 129/2022 Processo n.º 3139/2021



RECUPERAÇÃO EMBOÇO



EMBOÇO DO MURO

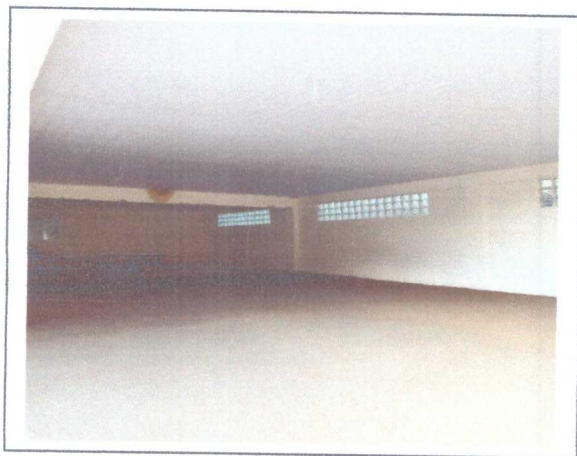

FORRO DE PVC



FORRO DE PVC



REVESTIMENTO CERAMICO



REVESTIMENTO CERAMICO



ASSENTAMENTO DE PISO




ASSENTAMENTO DE PISO




ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO




ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO

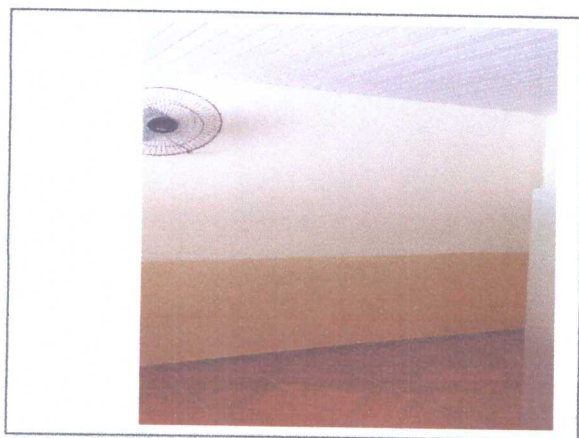

PINTURA DAS SALAS

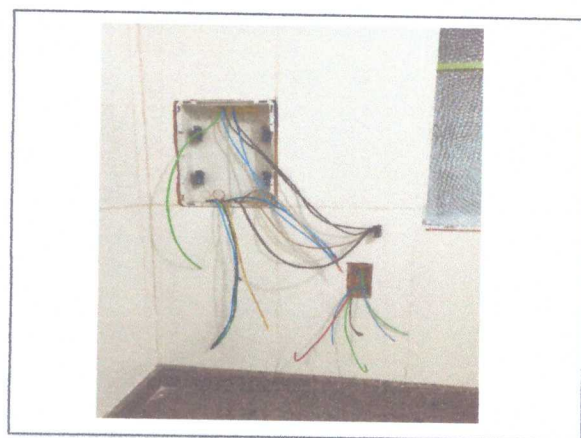

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

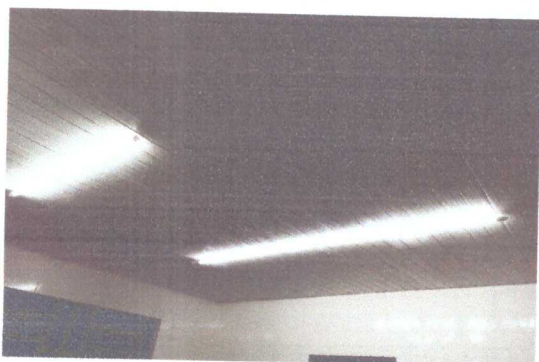


INSTALAÇÃO PONTOS DE LUZ



INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA



INSTALAÇÃO DE REDE AGUA FRIA E ESGOTO

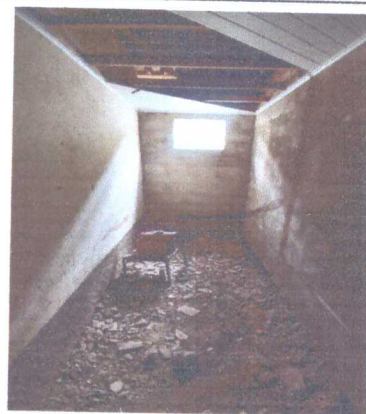

INSTALAÇÃO DE REDE AGUA FRIA E ESGOTO

Sévio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Sévio



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 12 **FOLHA:** 13

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 03/04/2023 A

Sexta-Feira

07/04/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EXECUÇÃO DE EMBOÇO

PREPARO E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO

PREPARO DAS PAREDES E PINTURA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 13 **FOLHA:** 14

CONTRATO

n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 10/04/2023

A

Sexta-Feira

14/04/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EXECUÇÃO DE EMBOÇO

PREPARO E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO

PREPARO DAS PAREDES E PINTURA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 14 **FOLHA:** 15

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 17/04/2023 A Sexta-Feira 21/04/2023
NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EXECUÇÃO DE EMBOÇO

PREPARO E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO

PREPARO DAS PAREDES E PINTURA

INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E AGUA FRIA BANHEIROS

Anotação do Fiscal da Obra:

Sérvio

Conservit

Fiscal da Obra

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102846



		CONSERVIT Construção e Conservação Ltda	
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ localidade rural denominada Pinuca - 4º Distrito de Bom Jardim		
		DIAS DE OBRA:	15
		FOLHA:	16
CONTRATO n.º: 129/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023	
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023	
		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira 24/04/2023 A		Sexta-Feira 28/04/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EXECUÇÃO DE EMBOÇO

PREPARO E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO

PREPARO DAS PAREDES E PINTURA

INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E AGUA FRIA BANHEIROS


Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



		CONSERVIT Construção e Conservação Ltda	
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
DIAS DE OBRA:		16	FOLHA: 17
CONTRATO n.º: 129/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023	
DIA DA SEMANA		TEMPO:	
Segunda-Feira 01/05/2023 A		BOM X	
		NUBLADO	
		CHUVOSO	
		Sexta-Feira 05/05/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2
OBS: 01/05 FERIADO	

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

SERVIÇOS DE ELETRICA, EMBUTIR FIAÇÃO NOS CONDUITES
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO
INSTALAÇÃO REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS
INSTALAÇÃO REDE ESGOTO DOS BANHEIROS

Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

PREZIDENTE DA COMISSÃO
FIS. nº 20
RUBRICADO

OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	17	FOLHA: 18
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	08/05/2023	A	Sexta-Feira 12/05/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

SERVIÇOS DE ELETRICA, EMBUTIR FIAÇÃO NOS CONDUITES
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO
ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA

Anotação do Fiscal da Obra:

S. Oliveira

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 18

FOLHA: 19

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 15/05/2023 A

Sexta-Feira

19/05/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



		CONSERVIT Construção e Conservação Ltda	
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	19	FOLHA: 20
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	22/05/2023	A	Sexta-Feira 26/05/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA

Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Fls. nº 23
 RUBRICADO



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	20	FOLHA: 21
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	29/05/2023	A	Quarta-Feira 31/05/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA

Anotação do Fiscal da Obra:

Sérgio

Conservit

Fiscal da Obra

Sônia Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 21 **FOLHA:** 22

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Quinta-Feira 01/06/2023 A Sexta-Feira 02/06/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA
ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO
ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA
COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC

Anotação do Fiscal da Obra:

Sálvio

Conservit

Fiscal da Obra

Sálvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 22 **FOLHA:** 23

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 05/06/2023 A

Sexta-Feira 09/06/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA LAVANDERIA E BANHEIROS

COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC

EXECUÇÃO DO CONTRA-PISO (SERVIÇO EXTRA)

INSTAL. DE PIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COZINHA E LAVANDERIA (S.EXTRA)

Anotação do Fiscal da Obra:

Sávio Oliveira da Silva

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102045



		CONSERVIT Construção e Conservação Ltda	
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
		DIAS DE OBRA:	23
		FOLHA:	24
CONTRATO n.º: 129/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:	23/01/2023
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO:	23/05/2023
		TEMPO: BOM X	
		NUBLADO	
		CHUVOSO	
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	12/06/2023	A	Sexta-Feira 16/06/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DA LAVANDERIA E BANHEIROS

COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC

EXECUÇÃO DO CONTRA-PISO (SERVIÇO EXTRA)

INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

REPARO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS

INSTALAÇÃO DE VARIOS PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO

INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ
localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 24

FOLHA: 25

CONTRATO

n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 19/06/2023 A

Sexta-Feira

23/06/2023

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

COLOCAÇÃO DE PORTAS

ASSENTAMENTO DE PISO NA VARANDA

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO TIJOLO INHO NA FACHADA (SERVIÇO EXTRA)

Anotação do Fiscal da Obra:

Serviço

Conservit

Fiscal da Obra

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102045



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ
localidade rural denominada Pinuca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 25 **FOLHA:** 26

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 26/06/2023 A

Sexta-Feira

30/06/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DE PISO NA VARANDA

ASSENTAMENTO DE PISO NA SALA NOVA

Anotação do Fiscal da Obra:

Sérvio

Conservit

Fiscal da Obra

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845
