




REQUERIMENTO – 002/2024

MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA, com sede Rua João Requeijo, 03 – Loja 01 – Ponte dos leites, Cidade: Araruama, Estado: RJ, CEP: 28.977-315, Telefones: (22) 99776-0718 / 98823-7653, E-mail: mejeclda@hotmail.com, CNPJ: 40.781.490/0001-25 Insc. Estadual: 11.980.813, vem à presença de V. Exa. Requerer o pagamento da importância de R\$ 16.556,25 (Dezesseis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) a serem deduzidos os tributos retidos na Nota fiscal de Serviços No 004, referente a 3ª Medição da Execução da Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ, no período entre: 01 a 31/01/2024. Processo 5140/2022 e em conformidade com o contrato 041/2023, tomada de preço 006/2023..

Araruama, 19 de fevereiro de 2024.


Joseilson J. Dos Santos
Mejec Construções Ltda. - EPP
CPF: 795.458.747-91



MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA
Rua João Requeijo, 03 – Loja 01 – Ponte dos leites
Araruama / RJ - CEP 28.977-315
Tel.: (22) 99776-0718 / 98823-7653
E-mail: mejeclda@hotmail.com



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS



Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 38 distrito de Bom Jardim/RJ
240 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO EMP VÍCIOS PRELIMINARES	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MÉDIA				ACUMULADO				A REALIZAR	
				UNITARIO	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
01.050.0050-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO E SPDA PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	344,57	R\$ 3,20	R\$ 1.102,62	344,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.102,62	344,57	R\$ 1.102,62	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO					R\$ 1.102,62		R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 1.102,62		R\$ 1.102,62		R\$ 0,00
TIPO DE OBRAS															
02.004.0001-0	BARRAÇÃO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCEMENTO DE 6MM, E INSTALAÇÕES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES.	M2	12,00	R\$ 352,85	R\$ 4.234,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 4.234,20	12,00	R\$ 4.234,20	0,00	0,00
02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2,25	R\$ 380,99	R\$ 857,23	2,25	R\$ 857,23	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 857,23	2,25	R\$ 857,23	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 5.091,43		R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 5.091,43		R\$ 5.091,43		R\$ 0,00
SUPORTES															
04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DESPESA DO CAMINHÃO (VÍDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	3.450,00	R\$ 0,14	R\$ 483,00	1.725,00	R\$ 241,50	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 241,50	1.725,00	R\$ 241,50	1.725,00	241,50
04.014.0095-0	RETRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE ARRECAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	R\$ 217,92	R\$ 435,84		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 217,92	1,00	R\$ 217,92	1,00	217,92
04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	230,00	R\$ 0,64	R\$ 147,20	115,00	R\$ 73,60	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 73,60	115,00	R\$ 73,60	115,00	73,60
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES					R\$ 1.066,04		R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 533,02		R\$ 533,02		R\$ 533,02
VÍCIOS COMPLEMENTARES															
05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1X, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VÍDE ITEM 05.008.0008)	M2	21,60	R\$ 4,42	R\$ 95,47	21,60	R\$ 95,47	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 95,47	21,60	R\$ 95,47	0,00	0,00
05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	690,00	R\$ 9,10	R\$ 6.279,00	115,00	R\$ 1.046,50	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.046,50	115,00	R\$ 1.046,50	575,00	5.232,50
05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	230,00	R\$ 5,27	R\$ 1.212,10	115,00	R\$ 606,05	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 606,05	115,00	R\$ 606,05	115,00	606,05
05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	575,00	R\$ 0,43	R\$ 247,25	287,50	R\$ 123,63	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 123,63	287,50	R\$ 123,63	287,50	123,63
05.001.0163-0	RETRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERÂMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	M2	8,45	R\$ 49,28	R\$ 416,42	8,45	R\$ 416,42	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 416,42	8,45	R\$ 416,42	0,00	0,00
05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRIÇÃO EM PLOTTER COM AS DIMENSÕES DE 0,40X0,60M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 402,33	R\$ 402,33		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ -	1,00	402,33
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 8.653,57		R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 2.288,06		R\$ 2.288,06		R\$ 6.365,51
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 15.912,66		R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 9.015,13		R\$ 9.015,13		R\$ 6.897,53
RMA GERAL E PAVIMENTOS															
08.020.0008-0	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRÉ-FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPa, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	155,68	R\$ 65,96	R\$ 10.268,65		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ -	155,68	10.268,65
08.020.0030-0	ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PIEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	155,68	R\$ 46,24	R\$ 7.198,64		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ -	155,68	7.198,64
09.001.0100-0	GRAMA SINTÉTICA EUROPEIA EM ROLOS, COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, NA COR VERDE, INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANAS DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA PARA AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO, REGULARIZAÇÃO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	88,62	R\$ 77,79	R\$ 6.893,75		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ -	88,62	6.893,75
TOTAL DO ITEM 2.1 - BASES E PAVIMENTOS					R\$ 24.361,05		R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 24.361,05
MENTO DE TERRA															
03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	1,32	R\$ 44,88	R\$ 59,33		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ -		R\$ 59,33

15/05/2024

05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	12,00	R\$ 18,67	R\$ 224,04	12,00	R\$ 224,04	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 224,04	0,00	0,00
05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	40,00	R\$ 4,56	R\$ 182,40	40,00	R\$ 182,40	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00	R\$ 182,40	0,00	0,00
05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	5,00	R\$ 15,72	R\$ 78,60	5,00	R\$ 78,60	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 78,60	0,00	0,00
05.001.0146-0	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	6,99	R\$ 31,46	R\$ 219,91	6,99	R\$ 219,91	-	R\$ -	-	R\$ -	6,99	R\$ 219,91	0,00	0,00
05.055.0010-0	LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00	R\$ 76,46	R\$ 1.911,50		R\$ 1.911,50	-	R\$ -	-	R\$ -	25,00	R\$ 1.911,50	25,00	1.911,50
TOTAL DO ITEM 2.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
UTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS															
11.013.0135-0	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPa, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADEMSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLHADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	1,32	R\$ 1.731,41	R\$ 2.288,92		R\$ -	-	R\$ -	0,99	R\$ 1.716,69	0,99	R\$ 1.716,69	0,33	572,23
11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,14	R\$ 1.711,35	R\$ 244,72	-	R\$ -	-	R\$ -	0,10	R\$ 164,29	-	R\$ 164,29	0,05	80,43
12.003.0095-0	ALVENARIA DE TUILOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TUILOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZIO 20M	M2	54,87	R\$ 73,50	R\$ 4.032,65	-	R\$ -	20,20	R\$ 1.484,70	34,41	R\$ 2.528,84	-	R\$ 4.013,54	0,26	19,11
TOTAL DO ITEM 2.4 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS															
STIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS															
13.001.0015-0	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traco 1:3	M2	385,62	R\$ 23,86	R\$ 9.200,80	194,30	R\$ 4.636,09	99,75	R\$ 2.380,08	90,67	R\$ 2.165,34	-	R\$ 9.179,51	0,89	21,28
13.030.0252-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILOS CERAMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO	M2	51,74	R\$ 72,02	R\$ 3.726,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	51,74	3.726,60
13.301.0125-1	CONTRAPO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM	M2	12,26	R\$ 26,57	R\$ 325,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,26	325,75
13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	10,80	R\$ 64,14	R\$ 692,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,80	692,71
13.348.0075-0	SOLEIRA EM GRANTO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	3,50	R\$ 52,86	R\$ 185,01	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3,50	185,01
13.390.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, RESISTENCIA A ABRASAO P.EI-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	66,73	R\$ 59,29	R\$ 3.956,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	66,73	3.956,45
TOTAL DO ITEM 2.5 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS															
ADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
14.002.0071-0	PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 0,5MM, COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	R\$ 1.036,35	R\$ 6.218,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	6.218,10
14.004.0025-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,14	R\$ 130,54	R\$ 279,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,14	279,36
14.006.0077-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA, COM ALMOFADA, PARA ENTRADA DE SANITARIO, UMA FOLHA, DE ABRIR, DE 60X210X3,5CM E MARCO 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 563,92	R\$ 1.127,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	1.127,84
14.006.0037-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA,DE 80X210CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 610,75	R\$ 1.832,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	1.832,25
14.006.0038-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 70X210CM,COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 601,55	R\$ 601,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	601,55
14.006.0039-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAMADA, DE 80X210X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 413,47	R\$ 826,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	826,94
14.006.0005-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 550,99	R\$ 550,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	550,99
14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEC. S/COLOCACAO, DE FECHADURA CLINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"x2,1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO	UN	9,00	R\$ 187,43	R\$ 1.686,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	9,00	1.686,87
14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINEL FIÇOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	UN	2,00	R\$ 109,87	R\$ 219,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	219,74
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LAÇOS ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS															
15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXOES	UN	3,00	R\$ 148,21	R\$ 444,63	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	444,63
15.004.0070-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVIÇO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	1,00	R\$ 206,15	R\$ 206,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	206,15
TOTAL DO ITEM 2.7 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.8 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.9 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.10 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.11 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.12 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.13 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.14 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.15 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.16 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.17 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.18 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.19 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.20 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.21 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.22 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.23 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.24 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.25 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.26 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.27 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.28 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.29 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.30 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.31 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.32 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.33 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.34 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.35 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.36 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.37 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.38 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.39 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.40 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.41 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.42 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.43 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.44 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.45 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.46 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.47 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.48 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.49 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.50 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.51 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.52 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.53 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.54 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.55 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.56 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.57 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.58 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.59 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.60 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.61 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.62 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.63 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.64 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.65 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.66 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.67 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.68 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.69 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.70 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.71 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.72 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.73 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.74 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.75 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.76 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.77 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.78 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.79 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.80 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.81 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.82 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.83 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.84 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.85 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.86 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.87 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															
LACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS															
TOTAL DO ITEM 2.88 - EQUIPARIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS															

15.004.0105-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL. ESTES) EM PAVIMENTO TERREDO, COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM, COM CONEXOES, ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO, LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO	UN	4,00	R\$ 286,63	R\$ 1.146,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	4,00	1.146,52
15.018.0120-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	R\$ 6,24	R\$ 124,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	20,00	124,80
15.018.0130-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 7,18	R\$ 71,80	-	R\$ -	-	8,00	R\$ 57,44	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	8,00	R\$ 57,44	2,00	14,36
15.008.0085-0	Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiado em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	R\$ 2,65	R\$ 530,00	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	200,00	530,00
15.008.0090-0	Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiado em eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	R\$ 3,64	R\$ 728,00	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	200,00	728,00
15.008.0095-0	Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiado em eletrodutos, na bitola de 6mm², 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	R\$ 4,75	R\$ 950,00	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	200,00	950,00
15.008.0100-0	Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiado em eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	R\$ 6,85	R\$ 1.027,50	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	150,00	1.027,50
5 ITEM 2.7 - INSTALACOES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						0,00			57,44			0,00									57,44	5.310,37
ERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES																						
11.016.0003-0	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terras, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos até 15,00m, considerando as perdas e uma densidade de pintura antidiluição, exclusive cobertura e acessórios, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	88,62	R\$ 178,68	R\$ 15.834,62	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	88,62	15.834,62
16.005.0006-0	Cobertura em telhas trapézoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,5mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio 5/16" x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela área real de cobertura, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	88,62	R\$ 52,69	R\$ 4.669,39	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	88,62	4.669,39
16.005.0015-0	Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	17,63	R\$ 95,54	R\$ 1.684,37	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	17,63	1.684,37
16.004.0055-0	CONDUITOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	6,20	R\$ 59,17	R\$ 366,85	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	6,20	366,85
16.005.0005-0	CUMEEIRA DE GALVALUME COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABRA PARA CADA LADO, PARA TELHAS ONDULADAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	26,00	R\$ 60,85	R\$ 1.582,10	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	26,00	1.582,10
16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2", CAIBROS DE 3"x1,1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	23,42	R\$ 95,00	R\$ 2.224,90	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	23,42	2.224,90
16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	23,42	R\$ 51,77	R\$ 1.212,45	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	23,42	1.212,45
TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						27.574,69	0,00					0,00									0,00	27.574,69
IRAS																						
17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRES DEMAO DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	23,42	R\$ 13,78	R\$ 322,73	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	23,42	322,73
17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAO DE ACABAMENTO	M2	5,48	R\$ 14,79	R\$ 81,05	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	5,48	81,05
17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSO A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAO, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAO DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	1.098,67	R\$ 30,53	R\$ 33.542,27	356,95	R\$ 10.897,74	200,32	R\$ 6.115,83	223,66	R\$ 6.828,37	-	R\$ -	780,94	R\$ 23.841,95	317,73	9.700,33	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM 2.9 - PINTURAS						33.946,05	10.897,74		6.115,83		6.828,37	0,00			23.841,95		10.104,10					
ELIOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS																						
18.002.0085-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO MEDIO LUXO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCL. ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO, BOLSA DE LIGACAO, VALVULA DE DESCARGA DE 1,1/2" C/REGISTRO INTEGRADO, SISTEMA HIDROMECANICO (ISENTE DE GOLPE DE ARRIETE) COM CORPO EM LATAO, CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO, TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIVACAO, FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 277,77	R\$ 1.111,08	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	4,00	1.111,08
18.002.0055-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X33)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIVACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2", FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 196,90	R\$ 196,90	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	1,00	196,90
18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,3X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIVACAO, FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 670,53	R\$ 2.011,59	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	3,00	2.011,59



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	TOTAL
OS PRELIMINARES	%	56,65%	0,00%	0,00%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	100,00%
	R\$	9.015,13	-	-	1.379,51	1.379,51	1.379,51	1.379,51	1.379,51	15.912,66
A GERAL	%	11,74%	7,04%	9,40%	14,36%	14,36%	14,36%	14,36%	14,36%	100,00%
	R\$	16.732,22	10.038,05	13.401,53	20.481,34	20.481,34	20.481,34	20.481,34	20.481,34	142.578,52
	R\$	25.747,35	10.038,05	13.401,53	21.860,85	21.860,85	21.860,85	21.860,85	21.860,85	158.491,18
	%	6,060,93	2,362,96	3,154,72	5,146,04	5,146,04	5,146,04	5,146,04	5,146,04	37,308,82
	R\$	31.808,28	12.401,01	16.556,25	27.006,89	27.006,89	27.006,89	27.006,89	27.006,89	195.800,00
	%	16,25%	6,33%	8,46%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	100,00%
ULADO:		31.808,28	44.209,29	60.765,55	87.772,44	114.779,33	141.786,22	168.793,11	195.800,00	
		16,25%	22,58%	31,03%	44,83%	58,62%	72,41%	86,21%	100,00%	

40.781.490/0001-25
MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA
RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PONTE DOS LEITES CEP 28.970-000
ARARUAMA-RJ

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 20081231-1

A: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

AL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO



EMBOÇO EXTERNO



EMBOÇO EXTERNO

A: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

AL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO



FORMA & CONCRETAGEM FUNDAÇÃO DA DESPENSA



ALVENARIA DA DESPENSA

A: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

AL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO



FORMA & CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO DO DEPOSITO

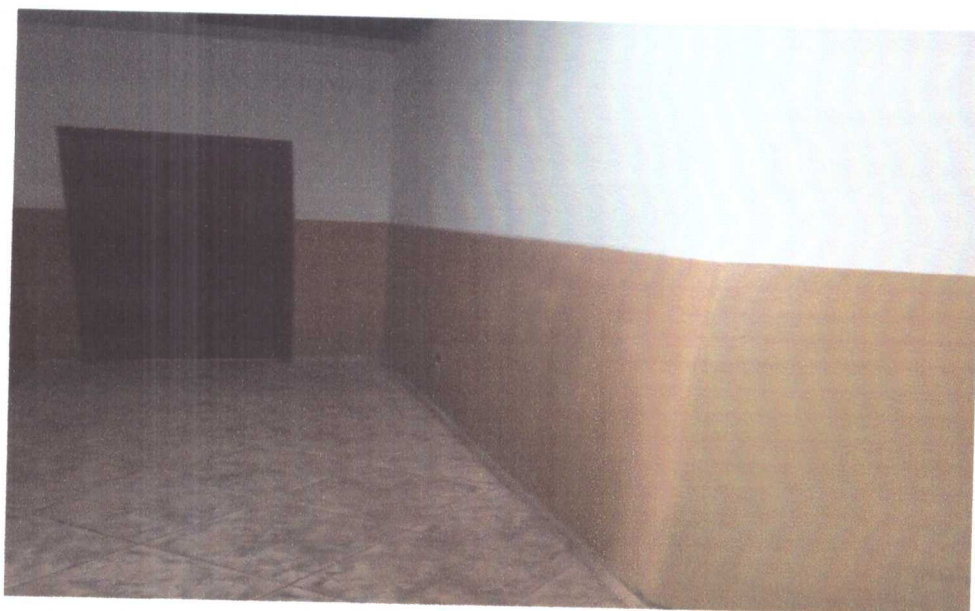


ALVENARIA DO DEPOSITO

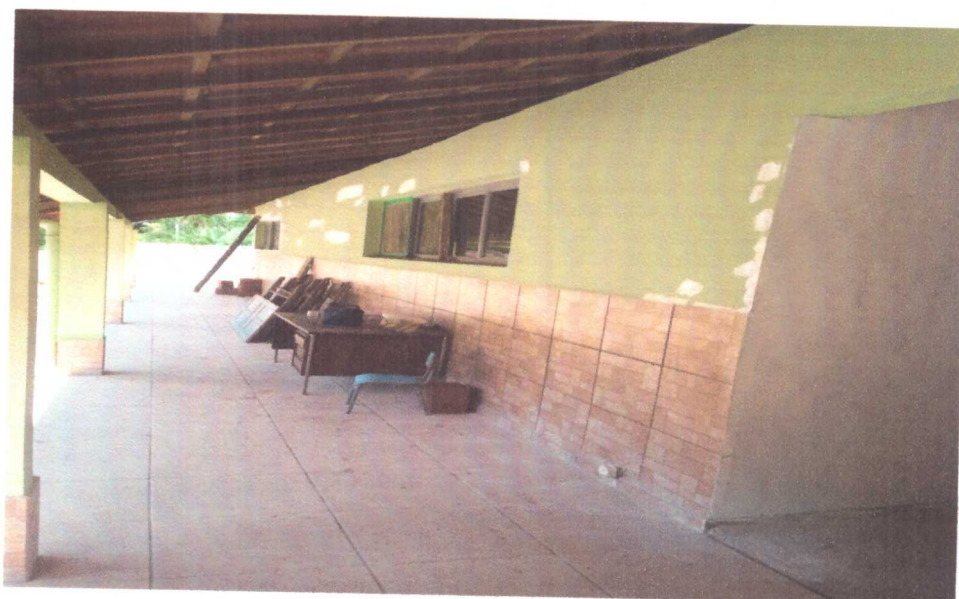
OA: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

AL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO




PINTURA INTERNA



PINTURA INTERNA

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	63			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	01/01/2024, segunda-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva			240	62	178
Chuva		Impraticavel	Raios					
Registro/ Observação da Contratada						Observações da Fiscalização/Clientes		
Não houve expediente nesta data.								
						Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato				0			0	
Engenheiro Civil				0			0	
Ajudante				0			0	
Armador				0			0	
Auxiliar Administrativo				0			0	
1/2 Oficial				0			0	
Carpinteiro				0			0	
Eletricista				0			0	
Encarregado				0			0	
Mestre de Obras				0			0	
Pedreiro				0			0	
Pintor				0			0	
Auxiliar de Sondador				0			0	
Encarregado de Sondagem				0			0	
Técnico em Edificações				0			0	
Tecnico Seg. Trabalho				0			0	
Topografo				0			0	
Vigia				0			0	
Total de Mão de Obra:				0	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
				Responsável - Fiscalização				
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização				
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil								

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	64		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	02/01/2024, terça-feira		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	63	177
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Cientes		
Continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.							
Continuação de pintura das paredes interna da escola.							
					Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato					0		0
Engenheiro Civil					0		0
Ajudante					1		0
Armador					0		0
Auxiliar Administrativo					0		0
1/2 Oficial					0		0
Carpinteiro					0		0
Eletricista					0		0
Encarregado					0		0
Mestre de Obras					0		0
Pedreiro					1		0
Pintor					1		0
Auxiliar de Sondador					0		0
Encarregado de Sondagem					0		0
Técnico em Edificações					1		0
Tecnico Seg. Trabalho					0		0
Topografo					0		0
Vigia					0		0
Total de Mão de Obra:					4	Total de Máquinas / Equipamentos	0
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 200812-5/0 Responsável - Mejec					Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	65	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	03/01/2024, quarta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva	240	64	176
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes		
Continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.						
Continuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato		0			0	
Engenheiro Civil		1			0	
Ajudante		1			0	
Armador		0			0	
Auxiliar Administrativo		0			0	
1/2 Oficial		0			0	
Carpinteiro		0			0	
Eletricista		0			0	
Encarregado		0			0	
Mestre de Obras		0			0	
Pedreiro		1			0	
Pintor		1			0	
Auxiliar de Sondador		0			0	
Encarregado de Sondagem		0			0	
Técnico em Edificações		0			0	
Tecnico Seg. Trabalho		0			0	
Topografo		0			0	
Vigia		0			0	
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
 Responsável - Mejec				Responsável - Fisacalização		
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2008123791						

	RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	67		
			DATA INICIAL:	31/10/2023		
			DATA FINAL:	27/06/2024		
			DATA DO RDO:	05/01/2024, sexta-feira		
CONTRANTE		Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva	240	66	174
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes		
Continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.						
Continuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0			0		
Engenheiro Civil	0			0		
Ajudante	1			0		
Armador	0			0		
Auxiliar Administrativo	0			0		
1/2 Oficial	0			0		
Carpinteiro	0			0		
Eletricista	0			0		
Encarregado	0			0		
Mestre de Obras	0			0		
Pedreiro	1			0		
Pintor	1			0		
Auxiliar de Sondador	0			0		
Encarregado de Sondagem	0			0		
Técnico em Edificações	1			0		
Tecnico Seg. Trabalho	0			0		
Topografo	0			0		
Vigia	0			0		
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos			
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2008129791						
Responsável - Mejec		Responsável - Fisacalização				

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	67	173
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
------------------------------------	--------------------------------------

	0		0
Gerente de Contrato	0		0
Engenheiro Civil	0		0
Ajudante	0		0
Armador	0		0
Auxiliar Administrativo	0		0
1/2 Oficial	0		0
Carpinteiro	0		0
Eletricista	0		0
Encarregado	0		0
Mestre de Obras	0		0
Pedreiro	0		0
Pintor	0		0
Auxiliar de Sondador	0		0
Encarregado de Sondagem	0		0
Técnico em Edificações	0		0
Tecnico Seg. Trabalho	0		0
Topografo	0		0
Vigia	0		0
	0	Total de Máquinas / Equipamentos	0

Responsável - Fiscação



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	69
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	07/01/2024, domingo

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	68	172
Chuva		Impraticavel		Raios				



Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
------------------------------------	--------------------------------------


Vão houve expediente nesta data.

Mão de Obra / Função		Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato	0		0
Engenheiro Civil	0		0
Ajudante	0		0
Armador	0		0
Auxiliar Administrativo	0		0
1/2 Oficial	0		0
Carpinteiro	0		0
Eletricista	0		0
Encarregado	0		0
Mestre de Obras	0		0
Pedreiro	0		0
Pintor	0		0
Auxiliar de Sondador	0		0
Encarregado de Sondagem	0		0
Técnico em Edificações	0		0
Tecnico Seg. Trabalho	0		0
Topografo	0		0
Vigia	0		0
Total de Mão de Obra:	0	Total de Máquinas / Equipamentos	0

Responsável - Mejec
Emerson M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2008129

Responsável - Fiscalização

	RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO				RDO No	70	
					DATA INICIAL:	31/10/2023	
					DATA FINAL:	27/06/2024	
					DATA DO RDO:	08/01/2024, segunda-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva		240	69	171
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.							
Continuação de pintura das paredes interna da escola.							
							
					Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0			0			
Engenheiro Civil	1			0			
Ajudante	1			0			
Armador	0			0			
Auxiliar Administrativo	0			0			
1/2 Oficial	0			0			
Carpinteiro	0			0			
Eletricista	0			0			
Encarregado	0			0			
Mestre de Obras	0			0			
Pedreiro	1			0			
Pintor	1			0			
Auxiliar de Sondador	0			0			
Encarregado de Sondagem	0			0			
Técnico em Edificações	1			0			
Tecnico Seg. Trabalho	0			0			
Topografo	0			0			
Vigia	0			0			
Total de Mão de Obra:		5	Total de Máquinas / Equipamentos		0		
							
Responsável - Mejec					Responsável - Fiscalização		
							

	RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO				RDO No	71	
					DATA INICIAL:	31/10/2023	
					DATA FINAL:	27/06/2024	
					DATA DO RDO:	09/01/2024, terça-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	70	170
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.							
Continuação de pintura das paredes interna da escola.							
					Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0				0		
Engenheiro Civil	0				0		
Ajudante	1				0		
Armador	0				0		
Auxiliar Administrativo	0				0		
1/2 Oficial	0				0		
Carpinteiro	0				0		
Eletricista	0				0		
Encarregado	0				0		
Mestre de Obras	0				0		
Pedreiro	1				0		
Pintor	1				0		
Auxiliar de Sondador	0				0		
Encarregado de Sondagem	0				0		
Técnico em Edificações	1				0		
Tecnico Seg. Trabalho	0				0		
Topografo	0				0		
Vigia	0				0		
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0	
 Engenheiro M. da Silva CREA-RJ 20061297-1				Responsável - Fiscalização			


RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO


		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	79
				DATA INICIAL:	31/10/2023
				DATA FINAL:	27/06/2024
				DATA DO RDO:	17/01/2024, quarta-feira

CONTRANTE		Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		

CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva		240	78	162
Chuva		Impraticavel	Raios				

Registro/ Observação da Contratada		Observações da Fiscalização/Cientes		
Colocação de formas e concretagem fundação do deposito.				
Continuação de pintura das paredes interna da escola.				
		Mão de Obra / Função		Máquinas / Equipamentos
Prete de Contrato	0		0	
genheiro Civil	0		0	
udante	1		0	
mador	0		0	
xiliar Administrativo	0		0	
2 Oficial	0		0	
rpinteiro	0		0	
tricista	0		0	
carregado	0		0	
estre de Obras	0		0	
dreiro	1		0	
tor	1		0	
iliar de Sondador	0		0	
arregado de Sondagem	0		0	
nico em Edificações	1		0	
nico Seg. Trabalho	0		0	
ografo	0		0	
a	0		0	
al de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos	0
 Responsável - Mejec		 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 20081244-1		
		Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	80	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	18/01/2024, quinta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva	240	79	161
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes		
nicio da alvenaria do deposito.						
Continuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
Prete de Contrato				0	0	
engenheiro Civil				0	0	
udante				1	0	
mador				0	0	
xiliar Administrativo				0	0	
2 Oficial				0	0	
rpinteiro				0	0	
etricista				0	0	
carregado				0	0	
estre de Obras				0	0	
dreiro				1	0	
tor				1	0	
iliar de Sondador				0	0	
arregado de Sondagem				0	0	
nico em Edificações				1	0	
nico Seg. Trabalho				0	0	
ografo				0	0	
a				0	0	
al de Mão de Obra:				4	Total de Máquinas / Equipamentos	
					0	
 Responsável - Mejec				Responsável - Fisacalização		
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 20081277-1						

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	81			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	19/01/2024, sexta-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva			240	80	160
Chuva		Impraticavel	Raios					
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes			
Continuação da alvenaria do deposito.								
Continuação de pintura das paredes interna da escola.								
					Mão de Obra / Função			
Gerente de Contrato		0				0		
Engenheiro Civil		0				0		
Condutor		1				0		
Mecânico		0				0		
Auxiliar Administrativo		0				0		
2 Oficial		0				0		
Farpinteiro		0				0		
Etricista		0				0		
Carregado		0				0		
Mestre de Obras		0				0		
Farpinteiro		1				0		
Motor		1				0		
Auxiliar de Sondador		0				0		
Carregado de Sondagem		0				0		
Mecânico em Edificações		1				0		
Mecânico Seg. Trabalho		0				0		
Topografo		0				0		
Sua		0				0		
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0		
 Responsável - Mejer				Responsável - Fiscalização				
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 200812222-1								



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	82
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	20/01/2024, sábado

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	81	159
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Cientes
Não houve atividades nesta data.	
Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos

Gerente de Contrato	0		0
Engenheiro Civil	0		0
Condutor	1		0
Operador	0		0
Auxiliar Administrativo	0		0
2º Oficial	0		0
Operante	0		0
Eletricista	0		0
Carregador	0		0
Assistente de Obras	0		0
Operário	1		0
Auxiliar de Sondador	1		0
Carregador de Sondagem	0		0
Técnico em Edificações	1		0
Técnico Seg. Trabalho	0		0
Topógrafo	0		0
Outros	0		0
Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos	0

Responsável - Mejec

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 200812371

Responsável - Fiscalização

RDO No	83
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	21/01/2024, domingo

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	82	158
Chuva		Impraticavel		Raios				

[illegible]

Gerente de Contrato	0	0
Engenheiro Civil	0	0
Ajudante	1	0
Armador	0	0
Auxiliar Administrativo	0	0
./2 Oficial	0	0
Carpinteiro	0	0
Electricista	0	0
Encarregado	0	0
Festive de Obras	0	0
Fedreiro	1	0
Intor	1	0
Auxiliar de Sondador	0	0
Encarregado de Sondagem	0	0
Técnico em Edificações	1	0
Técnico Seg. Trabalho	0	0
Topografo	0	0
gia	0	0
	0	0

Total de Máquinas / Equipamentos		0
4		
Responsável - Mejec		Responsável - Fiscaлизация

Responsável - Mejec

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2000220-2

Responsável - Fiscaalização



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

RDO No 86
DATA INICIAL: 31/10/2023
DATA FINAL: 27/06/2024
DATA DO RDO: 24/01/2024, quarta-feira

CONTRANTE

Nº CONTRATO

OBJETO DO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

041/2023

OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO

PARALIZAÇÕES

PERÍODO

PRAZO (Dias)

DIAS (CORRIDOS)

DIAS (REstante)

Bom

X

5

Chuva

240

85

155

Chuva

Impraticavel

Raios

Registro/ Observação da Contratada

Observações da Fiscalização/Clientes

Finalização da alvenaria do depósito.

Continuação de pintura das paredes interna da escola.

Mão de Obra / Função

Máquinas / Equipamentos

Gerente de Contrato	0	0
Engenheiro Civil	0	0
Ajudante	1	0
Armador	0	0
Auxiliar Administrativo	0	0
1/2 Oficial	0	0
Carpinteiro	0	0
Eletricista	0	0
Encarregado	0	0
Mestre de Obras	0	0
Medreiro	0	0
Montador	1	0
Auxiliar de Sondador	1	0
Encarregado de Sondagem	0	0
Técnico em Edificações	0	0
Técnico Seg. Trabalho	1	0
Topógrafo	0	0
Segurança	0	0
	0	0

Total de Mão de Obra:

4

Total de Máquinas / Equipamentos

0

Responsável - Mejec

Responsável - Fiscalização

Evertton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 20081297-1

DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	25/01/2024, quinta-feira

FÊS DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstantE)
X	5		Chuva		240	86	154
	Impraticavel		Raios				


[illegible]

	
Responsável - Meiec	Responsável - Fiscalização

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 20081291-1

Responsável - Fisacalização

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 88	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 26/01/2024, sexta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
Bom	X	5	Chuva		
Chuva		Impraticavel	Raios		
				PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
				240	87
				DIAS (RESTANTE)	
				153	
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes	
Termino das escavações para fundação da despesa.					
Continuação de pintura das paredes interna da escola.					
				Mão de Obra / Função	
Gerente de Contrato		0	0		
Engenheiro Civil		0	0		
Judante		1	0		
Armador		0	0		
Auxiliar Administrativo		0	0		
/2 Oficial		0	0		
Arpinteiro		0	0		
Eletricista		0	0		
Encarregado		0	0		
Mestre de Obras		0	0		
Pedreiro		1	0		
Pintor		1	0		
Auxiliar de Sondador		0	0		
Encarregado de Sondagem		0	0		
Técnico em Edificações		1	0		
Técnico Seg. Trabalho		0	0		
Topografo		0	0		
Gua		0	0		
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		
			0		
Responsável - Mejer:				Responsável - Fiscalização	
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 20081237-1					

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	89				
				DATA INICIAL:	31/10/2023				
				DATA FINAL:	27/06/2024				
				DATA DO RDO:	27/01/2024, sábado				
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ					
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)	
Bom	X	5		Chuva		240	88	152	
Chuva		Impraticavel		Raios					
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes				
Continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.									
Continuação de pintura das paredes interna da escola.									
									
					Mão de Obra / Função				
Gerente de Contrato					0	0			
Engenheiro Civil					0	0			
Ajudante					1	0			
Armador					0	0			
Auxiliar Administrativo					0	0			
1/2 Oficial					0	0			
Carpinteiro					0	0			
Eletricista					0	0			
Encarregado					0	0			
Mestre de Obras					0	0			
Pedreiro					1	0			
Porteiro					1	0			
Auxiliar de Sondador					0	0			
Encarregado de Sondagem					0	0			
Técnico em Edificações					1	0			
Técnico Seg. Trabalho					0	0			
Topografo					0	0			
Segurança					0	0			
Total de Mão de Obra:					4	Total de Máquinas / Equipamentos			0
									
Responsável - Mejer					Responsável - Fiscalização				
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 20081231-1									

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	91
				DATA INICIAL:	31/10/2023
				DATA FINAL:	27/06/2024
				DATA DO RDO:	29/01/2024, segunda-feira
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)
Bom	X	5	Chuva		240
Chuva		Impraticavel	Raios		90
					DIAS (CORRIDOS)
					DIAS (RESTANTE)
					150
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes	
Colocação de formas e concretagem da fundação da despesa.					
Continuação de pintura das paredes interna da escola.					
				Mão de Obra / Função	
Gerente de Contrato				0	0
Engenheiro Civil				0	0
Ajudante				1	0
Armador				0	0
Auxiliar Administrativo				0	0
/2 Oficial				0	0
Arpinteiro				0	0
Eletricista				0	0
Encarregado				0	0
Faleiro de Obras				0	0
Ferreiro				1	0
Motor				1	0
Auxiliar de Sondador				0	0
Encarregado de Sondagem				0	0
Técnico em Edificações				1	0
Técnico Seg. Trabalho				0	0
Topografo				0	0
Sua				0	0
Total de Mão de Obra:				4	Total de Máquinas / Equipamentos
					0
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização	

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	63
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	01/01/2024, segunda-feira

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5		Chuva		240	62	178
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
Não houve expediente nesta data.	
Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos

Gerente de Contrato	0		0
Engenheiro Civil	0		0
Ajudante	0		0
Armador	0		0
Auxiliar Administrativo	0		0
1/2 Oficial	0		0
Carpinteiro	0		0
Eletricista	0		0
Encarregado	0		0
Mestre de Obras	0		0
Medreiro	0		0
Montador	0		0
Auxiliar de Sondador	0		0
Encarregado de Sondagem	0		0
Técnico em Edificações	0		0
Técnico Seg. Trabalho	0		0
Topografo	0		0
Segurança	0		0
Total de Mão de Obra:	0	Total de Máquinas / Equipamentos	0



Responsável - Mejec	Responsável - Fiscalização
---------------------	----------------------------


Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 200000000-0

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

Responsável - Fiscação

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	67	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	05/01/2024, sexta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva	240	66
Chuva		Impraticavel		Raios		174
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.						
Continuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato				0	0	
Engenheiro Civil				0	0	
Ajudante				1	0	
Armador				0	0	
Auxiliar Administrativo				0	0	
1/2 Oficial				0	0	
Carpinteiro				0	0	
Eletricista				0	0	
Encarregado				0	0	
Mestre de Obras				0	0	
Pedreiro				1	0	
Pintor				1	0	
Auxiliar de Sondador				0	0	
Encarregado de Sondagem				0	0	
Técnico em Edificações				1	0	
Tecnico Seg. Trabalho				0	0	
Topografo				0	0	
Vigia				0	0	
Total de Mão de Obra:				4	Total de Máquinas / Equipamentos	
					0	
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2008129791						
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	68	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	06/01/2024, sábado	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva	240	67	173
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes		
Não houve expediente nesta data.						
				Mão de Obra / Função		
Preposto de Contrato	0		0		0	
Engenheiro Civil	0		0		0	
Condutor	0		0		0	
Operador	0		0		0	
Auxiliar Administrativo	0		0		0	
Motorista Oficial	0		0		0	
Arquiteto	0		0		0	
Eletricista	0		0		0	
Carregador	0		0		0	
Mestre de Obras	0		0		0	
Medeiro	0		0		0	
Motor	0		0		0	
Auxiliar de Sondador	0		0		0	
Carregado de Sondagem	0		0		0	
Técnico em Edificações	0		0		0	
Técnico Seg. Trabalho	0		0		0	
Topógrafo	0		0		0	
Geia	0		0		0	
Total de Mão de Obra:		0		Total de Máquinas / Equipamentos		0
 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		
						

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	70			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	08/01/2024, segunda-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5				240	69	171
Chuva		Impraticavel						
Registro/ Observação da Contratada						Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.								
Continuação de pintura das paredes interna da escola.								
						Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato		0				0		
Engenheiro Civil		1				0		
Ajudante		1				0		
Armador		0				0		
Auxiliar Administrativo		0				0		
1/2 Oficial		0				0		
Arpinteiro		0				0		
Eletricista		0				0		
Encarregado		0				0		
Mestre de Obras		0				0		
Pedreiro		1				0		
Pintor		1				0		
Auxiliar de Sondador		0				0		
Encarregado de Sondagem		0				0		
Técnico em Edificações		1				0		
Técnico Seg. Trabalho		0				0		
Topografo		0				0		
Vigia		0				0		
Total de Mão de Obra:		5		Total de Máquinas / Equipamentos		0		
 Responsável						Responsável - Fiscalização		



RDO No	71
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	09/01/2024, terça-feira

RDO No	71
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	09/01/2024, terça-feira

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
<u>Bom</u>	X	<u>5</u>		Chuva		240	70	170
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
------------------------------------	--------------------------------------

continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.	
continuação de pintura das paredes interna da escola.	

Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos
----------------------	-------------------------


Gerente de Contrato	0	0
Engenheiro Civil	0	0
Estudante	1	0
Formador	0	0
Auxiliar Administrativo	0	0
1/2 Oficial	0	0
Arquiteto	0	0
Eletricista	0	0
Encarregado	0	0
Mestre de Obras	0	0
Medeiro	1	0
Minutor	1	0
Auxiliar de Sondador	0	0
Encarregado de Sondagem	0	0
Técnico em Edificações	1	0
Técnico Seg. Trabalho	0	0
Topógrafo	0	0
Trigão	0	0

total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos	0
-----------------------	---	----------------------------------	---

Ewerton M. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2008128791

Responsável - Mejac

Responsável - Fiscaalização

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	73	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	11/01/2024, quinta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)
Bom	X	5	Chuva			240
Chuva		Impraticavel	Raios			72
						DIAS (CORRIDOS)
						DIAS (RESTANTE)
						168
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
ontinuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.						
ontinuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
Prete de Contrato				0		
genheiro Civil				0		
udante				1		
mador				0		
xiliar Administrativo				0		
2 Oficial				0		
rpinteiro				0		
etricista				0		
carregado				0		
estre de Obras				0		
dreiro				1		
itor				1		
xiliar de Sondador				0		
carregado de Sondagem				0		
cnico em Edificações				1		
cnico Seg. Trabalho				0		
pografo				0		
ja				0		
Total de Mão de Obra:				4		
				Total de Máquinas / Equipamentos		
				0		
 Responsável - Mejec Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2008129791				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 77	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 15/01/2024, segunda-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
Bom	X	5	Chuva		
Chuva		Impraticavel	Raios		
				PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
				240	76
				DIAS (RESTANTE)	
				164	
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes	
Início das escavações para fundação do depósito.					
Continuação de pintura das paredes interna da escola.					
				Mão de Obra / Função	
Gerente de Contrato		0			0
Engenheiro Civil		0			0
Ajudante		1			0
Armador		0			0
Auxiliar Administrativo		0			0
1/2 Oficial		0			0
Carpinteiro		0			0
Eletricista		0			0
Encarregado		0			0
Mestre de Obras		0			0
Pedreiro		1			0
Pintor		1			0
Auxiliar de Sondador		0			0
Encarregado de Sondagem		0			0
Técnico em Edificações		1			0
Tecnico Seg. Trabalho		0			0
Topografo		0			0
Vigia		0			0
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0
 Responsável - Mejer Ewerton M. da Sil. Engenheiro Civil CREA-RJ 2008123/J1				Responsável - Fiscalização	

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 80	
				DATA INICIAL: 31/10/2023	
				DATA FINAL: 27/06/2024	
				DATA DO RDO: 18/01/2024, quinta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ	
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	
Bom	X	5	Chuva		
Chuva		Impraticavel	Raios		
				PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
				240	79
				DIAS (REstante)	
				161	
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes	
Início da alvenaria do deposito.					
Continuação de pintura das paredes interna da escola.					
				Mão de Obra / Função	
Gerente de Contrato		0			
Engenheiro Civil		0		0	
Ajudante		1		0	
Armador		0		0	
Auxiliar Administrativo		0		0	
1/2 Oficial		0		0	
Carpinteiro		0		0	
Eletricista		0		0	
Encarregado		0		0	
Mestre de Obras		0		0	
Pedreiro		1		0	
Pintor		1		0	
Auxiliar de Sondador		0		0	
Encarregado de Sondagem		0		0	
Técnico em Edificações		1		0	
Tecnico Seg. Trabalho		0		0	
Topografo		0		0	
Vigia		0		0	
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos	
				0	
Ewerton M. da Silveira Engenheiro Civil CREA RJ 2008123-1 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização	

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	81	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	19/01/2024, sexta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva	240	80	160
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
ntinuação da alvenaria do deposito.						
ntinuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
Prete de Contrato		0			0	
engenheiro Civil		0			0	
udante		1			0	
mador		0			0	
xiliar Administrativo		0			0	
2 Oficial		0			0	
rpinteiro		0			0	
etricista		0			0	
icarregado		0			0	
estre de Obras		0			0	
dreiro		1			0	
ntor		1			0	
xiliar de Sondador		0			0	
icarregado de Sondagem		0			0	
ecnico em Edificações		1			0	
ecnico Seg. Trabalho		0			0	
opografo		0			0	
gia		0			0	
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		
Ewerton M. da Silveira Engenheiro Civil CRFA-RJ 7008129/1						



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	82
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	20/01/2024, sábado

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5		Chuva		240	81	159
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Cientes
io houve atividades nesta data.	
Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos

Gerente de Contrato	0	0
Engenheiro Civil	0	0
Ajudante	1	0
Armador	0	0
Auxiliar Administrativo	0	0
1/2 Oficial	0	0
Carpinteiro	0	0
Eletricista	0	0
Encarregado	0	0
Mestre de Obras	0	0
Pedreiro	1	0
Pintor	1	0
Auxiliar de Sondador	0	0
Encarregado de Sondagem	0	0
Técnico em Edificações	1	0
Tecnico Seg. Trabalho	0	0
Topografo	0	0
Vigia	0	0

Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos	0
-----------------------	---	----------------------------------	---

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 20081297-1
Responsável - Mejec

Responsável - Fiscalização



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	83
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	21/01/2024, domingo



CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ


CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5		Chuva		240	82	158
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
o houve atividades nesta data.	

Mão de Obra / Função		Máquinas / Equipamentos	
Prete de Contrato	0		0
engenheiro Civil	0		0
adante	1		0
mador	0		0
xiliar Administrativo	0		0
2 Oficial	0		0
rpinteiro	0		0
etricista	0		0
carregado	0		0
estre de Obras	0		0
dreiro	1		0
rtor	1		0
xiliar de Sondador	0		0
carregado de Sondagem	0		0
cnico em Edificações	1		0
cnico Seg. Trabalho	0		0
pografo	0		0
gia	0		0
Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos	0

Responsável - M. Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CRFA-RJ 2008129/1	Responsável - Fiscalização
--	----------------------------

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	90	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	28/01/2024, domingo	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		240	89	151
Chuva		Impraticavel				
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes		
Continuação de execução de chapisco e emboço dos muros internamente.						
Continuação de pintura das paredes interna da escola.						
						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0			0		
Engenheiro Civil	0			0		
Ajudante	1			0		
Armador	0			0		
Auxiliar Administrativo	0			0		
1/2 Oficial	0			0		
Carpinteiro	0			0		
Eletricista	0			0		
Encarregado	0			0		
Mestre de Obras	0			0		
Pedreiro	1			0		
Pintor	1			0		
Auxiliar de Sondador	0			0		
Encarregado de Sondagem	0			0		
Técnico em Edificações	1			0		
Tecnico Seg. Trabalho	0			0		
Topografo	0			0		
Vigia	0			0		
Total de Mão de Obra	4	Total de Máquinas / Equipamentos		0		
 Engenheiro M. da Silva CREA RJ 1748129/3-1				Responsável - Fiscaização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	91	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	29/01/2024, segunda-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva	240	90	150
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes		
olocação de formas e concretagem da fundação da despesa.						
ontinuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
erente de Contrato	0		0			
ngenheiro Civil	0		0			
judante	1		0			
rmador	0		0			
uxiliar Administrativo	0		0			
/2 Oficial	0		0			
arpinteiro	0		0			
letricista	0		0			
ncarregado	0		0			
lestre de Obras	0		0			
edreiro	1		0			
intor	1		0			
uxiliar de Sondador	0		0			
ncarregado de Sondagem	0		0			
écnico em Edificações	1		0			
ecnico Seg. Trabalho	0		0			
opografo	0		0			
igia	0		0			
total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos		0		
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2008129791 Responsável - Mejec				Responsável - Fisicalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	92	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	30/01/2024, terça-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)
Bom	X	5	Chuva			240
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
ício da execução da alvenaria da despensa.						
ontinuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato		0				0
Engenheiro Civil		0				0
Judante		1				0
Operador		0				0
Auxiliar Administrativo		0				0
1/2 Oficial		0				0
Arpinteiro		0				0
Eletricista		0				0
Carregador		0				0
Festreador de Obras		0				0
Medidor		1				0
Intor		1				0
Auxiliar de Sondador		0				0
Carregador de Sondagem		0				0
Técnico em Edificações		1				0
Técnico Seg. Trabalho		0				0
Topografo		0				0
Siga		0				0
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0
 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		
Ewerthon M. da Silva Engenheiro Civil CRM-RO 2008129791						

