




REQUERIMENTO – 003/2024


MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA, com sede Rua João Requeijo, 03 – Loja 01 – Ponte dos leites, Cidade: Araruama, Estado: RJ, CEP: 28.977-315, Telefones: (22) 99776-0718 / 98823-7653, E-mail: mejec Ltda@hotmail.com, CNPJ: 40.781.490/0001-25 Insc. Estadual: 11.980.813, vem à presença de V. Exa. Requerer o pagamento da importância de R\$ 18.201,97 (Dezoito mil duzentos e um reais e noventa e sete centavos) a serem deduzidos os tributos retidos na Nota fiscal de Serviços No 05, referente à 4ª Medição da Execução da Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ, no período entre: 01/02/2024 até 29/02/2024. Processo 5140/2022 e em conformidade com o contrato 041/2023, tomada de preço 006/2022.

Araruama, 26 de março de 2024.


Mejec Construções Ltda - EPP
Ewerton Marinho da Silva
Sócio Proprietário/Administrador
RG 12.108.962-7 IFP/RJ
CPF 093.724.087-78

40.781.490/0001-25
MEJEC CONSTRUÇÕES
LTDA
RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PONTE DOS LEITES CEP 28.970-000
ARARUAMA-RJ

MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA
Rua João Requeijo, 03 – Loja 01 – Ponte dos leites
Araruama / RJ - CEP 28.977-315
Tel.: (22) 99776-0718 / 98823-7653
Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA RJ 240812979





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS



Obra: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ
Prazo: 240 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MÉDIA

		DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.	PREÇOS		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		A REALIZAR	
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						UNITARIO	TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
1.1 - PROJETO													
1.1.1	01.050.0050-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALCAÇÃO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	344,57	R\$ 3,20	R\$ 1.102,62	-	R\$ -	344,57	R\$ 1.102,62	0,00	0,00	
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS				TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO									
1.2.1	02.004.0001-0	BARRAÇÃO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALAÇÕES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES.	M2	12,00	R\$ 352,85	R\$ 4.234,20	-	R\$ -	12,00	R\$ 4.234,20	0,00	0,00	
1.2.2	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2,25	R\$ 380,99	R\$ 857,23	-	R\$ -	2,25	R\$ 857,23	0,00	0,00	
1.3 - TRANSPORTES				TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS									
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	3.450,00	R\$ 0,14	R\$ 483,00	1.552,50	R\$ 217,35	3.277,50	R\$ 458,85	172,50	24,15	
1.3.2	04.014.0095-0	RETRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	R\$ 217,92	R\$ 435,84	1,00	R\$ 217,92	2,00	R\$ 435,84	0,00	0,00	
1.3.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	230,00	R\$ 0,64	R\$ 147,20	103,50	R\$ 66,24	218,50	R\$ 139,84	11,50	7,36	
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES									
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	21,60	R\$ 4,42	R\$ 95,47	-	R\$ -	21,60	R\$ 95,47	0,00	0,00	
1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMMES	690,00	R\$ 9,10	R\$ 6.279,00	517,50	R\$ 4.709,25	632,50	R\$ 5.755,75	57,50	523,25	
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	230,00	R\$ 5,27	R\$ 1.212,10	115,00	R\$ 606,05	230,00	R\$ 1.212,10	0,00	0,00	
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	575,00	R\$ 0,43	R\$ 247,25	250,00	R\$ 107,50	537,50	R\$ 231,13	37,50	16,13	
1.4.5	05.001.0163-0	RETRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERÂMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	M2	8,45	R\$ 49,28	R\$ 416,42	-	R\$ -	8,45	R\$ 416,42	0,00	0,00	
1.4.6	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRIÇÃO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 402,33	R\$ 402,33	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	402,33	
2.0 - REFORMA GERAL				TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
2.1 - BASES E PAVIMENTOS				TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 200812970

2.1.1	08.020.0008-0	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRÉ-FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESURA DE 6CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	155,68	R\$ 65,96	R\$ 10.268,65	-	R\$ -	-	R\$ -	155,68	10.268,65
2.1.2	08.020.0030-0	ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	155,68	R\$ 46,24	R\$ 7.198,64	-	R\$ -	-	R\$ -	155,68	7.198,64
2.1.3	09.001.0100-0	GRAMA SINTÉTICA EUROPEIA, EM ROLOS, COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, NA COR VERDE, INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA PARA AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO, REGULARIZAÇÃO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	88,62	R\$ 77,79	R\$ 6.893,75	-	R\$ -	-	R\$ -	88,62	6.893,75

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL DO ITEM 2.2 - BASES E PAVIMENTOS												
2.2.1	03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	1,32	R\$ 44,88	R\$ 59,33	1,29	R\$ 57,76	1,29	R\$ 57,76	0,04	1,57
				TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA		59,33	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 24.361,05	

2.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.1	05.001.0023-0	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTIEIRO DE SERVIÇO	M3	7,30	R\$ 67,63	R\$ 493,44	-	R\$ -	7,30	R\$ 493,44	0,00	0,00
2.3.2	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	12,00	R\$ 18,67	R\$ 224,04	-	R\$ -	12,00	R\$ 224,04	0,00	0,00
2.3.3	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UN	40,00	R\$ 4,56	R\$ 182,40	-	R\$ -	40,00	R\$ 182,40	0,00	0,00
2.3.4	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	5,00	R\$ 15,72	R\$ 78,60	-	R\$ -	5,00	R\$ 78,60	0,00	0,00
2.3.5	05.001.0146-0	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PA/LAVATÓRIO OU BANCA SECA DE ATÉ 1,00M DE ALTURA E ATÉ 0,80M DE LARGURA	M	6,99	R\$ 31,46	R\$ 219,91	-	R\$ -	6,99	R\$ 219,91	0,00	0,00
2.3.6	05.055.0010-0	LETRA DE AÇO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00	R\$ 76,46	R\$ 1.911,50	-	R\$ -	-	R\$ -	25,00	1.911,50
				TOTAL DO ITEM 2.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		3.109,88	0,00		1.198,38		1.911,50	

2.4 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

2.4.1	11.013.0135-0	CONCRETO ARMADO, FCC=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADE, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 80KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	1,32	R\$ 1.731,41	R\$ 2.288,92	0,30	R\$ 519,42	1,29	R\$ 2.236,12	0,03	52,81
2.4.2	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,14	R\$ 1.711,35	R\$ 244,72	-	R\$ -	0,10	R\$ 164,29	0,05	80,43
2.4.3	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ/0,20M	M2	54,87	R\$ 73,50	R\$ 4.032,65	-	R\$ -	54,61	R\$ 4.013,54	0,26	19,11
				TOTAL DO ITEM 2.4 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		6.566,30	519,42		6.413,95		152,35	

2.5 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

2.5.1	13.001.0015-0	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3	M2	385,62	R\$ 23,86	R\$ 9.200,80	-	R\$ -	384,72	R\$ 9.179,51	0,89	21,28
2.5.2	13.030.0252-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO	M2	51,74	R\$ 72,02	R\$ 3.726,60	-	R\$ -	-	-	51,74	3.726,60
2.5.3	13.301.0125-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 3CM	M2	12,26	R\$ 26,57	R\$ 325,75	-	R\$ -	-	-	12,26	325,75
2.5.4	13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	10,80	R\$ 64,14	R\$ 692,71	-	R\$ -	-	-	10,80	692,71
2.5.5	13.348.0075-0	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	3,50	R\$ 52,86	R\$ 185,01	-	R\$ -	-	-	3,50	185,01
2.5.6	13.330.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERÂMICO, ANTIDERRAPANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, RESISTÊNCIA A ABRASÃO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFÍCIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	66,73	R\$ 59,29	R\$ 3.956,45	-	R\$ -	-	-	66,73	3.956,45
				TOTAL DO ITEM 2.5 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		18.087,32	0,00		9.179,51		8.907,81	

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA RJ 20181202-2

2.6.1	14.002.0071-0	PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, COM ESPESURA DE 0,5MM, COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	R\$ 1.036,35	R\$ 6.218,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
2.6.2	14.004.0025-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUNI,DE 6MM DE ESPESSURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,14	R\$ 130,54	R\$ 279,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-		6,00
2.6.3	14.006.0077-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA, COM ALMOFADA, PARA ENTRADA DE SANITARIO, UMA FOLHA, DE ABRI, DE 60X210X3,5CM E MARCO 73X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 563,92	R\$ 1.127,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	2,14	279,36
2.6.4	14.006.0037-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA,DE 80X210CM, COM MARCO DE 73X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 610,75	R\$ 1.832,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	2,00	1.127,84
2.6.5	14.006.0038-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 70X210CM,COM MARCO DE 73X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 601,55	R\$ 601,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	3,00	1.832,25
2.6.6	14.006.0039-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA, DE 80X210X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS,AJUELA E ALIZARES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 413,47	R\$ 826,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	2,00	826,94
2.6.7	14.006.0005-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM, FOLHEADA MAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 550,99	R\$ 550,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	550,99
2.6.8	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIIR, DE ENTRADA DE SERVICO, CONSTANDO DE FORNEC, S/COLOCACAO, DE:-FECHADURAE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"x2,1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO	UN	9,00	R\$ 187,43	R\$ 1.686,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	9,00	1.686,87
2.6.9	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINES FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	UN	2,00	R\$ 109,87	R\$ 219,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	2,00	219,74

13.343,64	0,00	0,00	13.343,64
-----------	------	------	-----------

950,00

1.027,91

~~Erigeron M. da Silva~~
~~Erigeron M. da Silva~~
~~1.027,91~~

2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

	PORTEINTEL	CUBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	9 - PINTURAS
	0,00	27.574,69	
TOTAL GERAL:	R\$ 84.000,00		


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO MEDIO LUXO, COM MEDIDAS EM																																																																																																			

18.002.0085-0	DE DESCARGA DE 1.1/2" C/REGISTRADO INTEGRADO, SISTEMA HIDROMECANICO (SENSE DE CONTE POR
2.10.1	

[illegible][illegible]

2.10.5	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 23,06	R\$ 69,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	3,00	69,18
2.10.6	18.013.0117-0	SIFAO 1680, DE 1.1/2"X1.1/2", EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 64,50	R\$ 258,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	4,00	258,00
2.10.7	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 194,19	R\$ 776,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	4,00	776,76
2.10.8	15.020.0200-0	LAMPADA LED, BULBO, A60/DV, 12W, 100/240V, BASE E-27 FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	R\$ 7,08	R\$ 283,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	40,00	283,20
2.10.9	18.260.0065-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	R\$ 3,50	R\$ 140,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	40,00	140,00
2.10.10	12.035.0001-0	PARDEE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANTO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	11,29	R\$ 344,66	R\$ 3.889,47	-	R\$ -	-	R\$ -	-	11,29	3.889,47
2.10.11	18.082.0051-0	BANCA DE GRANTO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,20	R\$ 514,00	R\$ 616,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1,20	616,80
2.10.12	18.002.0027-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA), TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (52X39)CM. FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680, 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603, RA	UN	2,00	R\$ 182,00	R\$ 364,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	2,00	364,00
TOTAL DO ITEM 2.10 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS													
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL						10.162,46	0,00	0,00	50.384,96	92.193,56			
TOTAL:						158.491,18	14.733,66	65.324,41	93.166,77	21.931,46			
B.D.I						23,54%	37.308,82	15.377,37	80.701,77	115.098,23			
TOTAL GERAL:						195.800,00	18.201,97						


40.781.490/0001-25
MEJEC CONSTRUÇÕES
LTD
 RUA JOÃO REQUEIJO, 03
 PONTE DOS LEITES CEP 28.970-000
 ARARUAMA-RJ

Emerton M. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 1008129791



MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

LOCAL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 4ª MEDIÇÃO



CHAPISCO EXTERNO



40.781.490/0001-25

MEJEC CONSTRUÇÕES
LTDA

CHAPISCO EXTERNO

RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PONTE DOS LEITES CEP 28.970-000
ARARUAMA-RJ

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA RJ 2008129791



MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

LOCAL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 4ª MEDIÇÃO



EMBOÇO EXTERNO



40.781.490/0001-25
MEJEC CONSTRUÇÕES
LTDA

ALVENARIA E CHAPISCO EXTERNO

RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PONTE DOS LEITES CEP 28.970-000
ARARUAMA-RJ

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2008129791



MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

LOCAL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 4ª MEDIÇÃO



ALVENARIA EXTERNA



40.781.490/0001-25

MEJEC CONSTRUÇÕES
LTDA

EMBOÇO INTERNO

RUA JOÃO REQUEIJO, 03
PONTE DOS LEITES - CEP 28.970-000
ARARUAMA-RJ

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2008120701



MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich

LOCAL: Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 4ª MEDIÇÃO



EMBOÇO EXTERNO



40.781.490/0001-25

MEJEC CONSTRUÇÕES
LTDA

PINTURA EXTERNA

RUA JOÃO REQUEJO, 07
PONTE DOS LEITES - CEP 26.973-000
ARAIJÁ - RJ

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA RJ 2008129791



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	97
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	04/02/2024, domingo

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ


CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	96	144
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Cientes
Não houve expediente nesta data.	
Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos

Gerente de Contrato	0	0
Engenheiro Civil	0	0
Ajudante	0	0
Armador	0	0
Auxiliar Administrativo	0	0
1/2 Oficial	0	0
Carpinteiro	0	0
Eletricista	0	0
Encarregado	0	0
Mestre de Obras	0	0
Pedreiro	0	0
Pintor	0	0
Auxiliar de Sondador	0	0
Encarregado de Sondagem	0	0
Técnico em Edificações	0	0
Tecnico Seg. Trabalho	0	0
Topografo	0	0
Vigia	0	0

Total de Mão de Obra:	0	Total de Máquinas / Equipamentos	0
-----------------------	---	----------------------------------	---

Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 208817/2011 Responsável - Mejec	Responsável - Fiscalização
---	----------------------------

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	98	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	05/02/2024, segunda-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)
Bom	X	5	Chuva		240	97
Chuva		Impraticavel	Raios			143
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação da execução da alvenaria da despensa.						
Continuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0		0			
Engenheiro Civil	1		0			
Ajudante	1		0			
Armador	0		0			
Auxiliar Administrativo	0		0			
1/2 Oficial	0		0			
Carpinteiro	0		0			
Eletricista	0		0			
Encarregado	0		0			
Mestre de Obras	0		0			
Pedreiro	1		0			
Pintor	1		0			
Auxiliar de Sondador	0		0			
Encarregado de Sondagem	0		0			
Técnico em Edificações	1		0			
Tecnico Seg. Trabalho	0		0			
Topografo	0		0			
Vigia	0		0			
Total de Mão de Obra:		5	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 0008129791 Responsável - Mejec				Responsável - Fisacalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	99	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	06/02/2024, terça-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva	240	98	142
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação da execução da alvenaria da despensa.						
Continuação de pintura das paredes interna da escola.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0			0		
Engenheiro Civil	0			0		
Ajudante	1			0		
Armador	0			0		
Auxiliar Administrativo	0			0		
1/2 Oficial	0			0		
Carpinteiro	0			0		
Eletricista	0			0		
Encarregado	0			0		
Mestre de Obras	0			0		
Pedreiro	1			0		
Pintor	1			0		
Auxiliar de Sondador	0			0		
Encarregado de Sondagem	0			0		
Técnico em Edificações	0			0		
Tecnico Seg. Trabalho	0			0		
Topografo	0			0		
Vigia	0			0		
Total de Mão de Obra:		3	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CPF: RJ 2008129795 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	103
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	10/02/2024, sábado

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva		240	102	138
Chuva		Impraticavel	Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Cientes
Não houve expediente nesta data.	

Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos
Gerente de Contrato	0
Engenheiro Civil	0
Ajudante	0
Armador	0
Auxiliar Administrativo	0
1/2 Oficial	0
Carpinteiro	0
Eletricista	0
Encarregado	0
Festreiro de Obras	0
Ferreiro	0
Motor	0
Auxiliar de Sondador	0
Encarregado de Sondagem	0
Técnico em Edificações	0
Técnico Seg. Trabalho	0
Topógrafo	0
Trator	0
Total de Mão de Obra:	0
	Total de Máquinas / Equipamentos
	0

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA RJ/000127901
Responsável - Mejec

Responsável - Fiscalização



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	106
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	13/02/2024, terça-feira

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva		240	105	135
Chuva		Impraticavel	Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
Não houve expediente nesta data.	

Mão de Obra / Função		Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato	0		0
Engenheiro Civil	0		0
Ajudante	0		0
Armador	0		0
Auxiliar Administrativo	0		0
1/2 Oficial	0		0
Carpinteiro	0		0
Eletricista	0		0
Encarregado	0		0
Mestre de Obras	0		0
Pedreiro	0		0
Pintor	0		0
Auxiliar de Sondador	0		0
Encarregado de Sondagem	0		0
Técnico em Edificações	0		0
Tecnico Seg. Trabalho	0		0
Topografo	0		0
Vigia	0		0

Total de Mão de Obra:	0	Total de Máquinas / Equipamentos	0
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 2008223701 Responsável - Mejec		Responsável - Fisacalização	



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No 110
DATA INICIAL: 31/10/2023
DATA FINAL: 27/06/2024
DATA DO RDO: 17/02/2024, sábado

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	109	131
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
Não houve expediente nesta data.	
Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos

Gerente de Contrato	0	0
Engenheiro Civil	0	0
Ajudante	0	0
Armador	0	0
Auxiliar Administrativo	0	0
1/2 Oficial	0	0
Carpinteiro	0	0
Eletricista	0	0
Encarregado	0	0
Mestre de Obras	0	0
Pedreiro	0	0
Pintor	0	0
Auxiliar de Sondador	0	0
Encarregado de Sondagem	0	0
Técnico em Edificações	0	0
Tecnico Seg. Trabalho	0	0
Topografo	0	0
Vigia	0	0
Total de Mão de Obra:	0	Total de Máquinas / Equipamentos 0

Ewerton M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 008129793

Responsável - Mejec

Responsável - Fiscalização



RDO No	112
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	19/02/2024, segunda-feira

RDO No	112
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	19/02/2024, segunda-feira

CONTRANTE		Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	111	129
Chuva		Impraticavel		Raios				

Chuva	Impraticável	Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
-------	--------------	------------------------------------	--------------------------------------

...ção da execução da chapisco e emboço da despesa.

nício da execução da chapisco e emboço do depósito.

Mão de Obra / Função		Máquinas / Equipamentos
	0	0
Gerente de Contrato	0	0
Engenheiro Civil	1	0
Ajudante	0	0
Armador	0	0
Auxiliar Administrativo	0	0
1/2 Oficial	0	0
Carpinteiro	0	0
Eletricista	0	0
Encarregado	0	0
Mestre de Obras	1	0
Pedreiro	1	0
Pintor	0	0
Auxiliar de Sondador	0	0
Encarregado de Sondagem	1	0
Técnico em Edificações	0	0
Tecnico Seg. Trabalho	0	0
Topografo	0	0
Vigia		
Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos
		0

Responsável - Mejec

Responsável - Fiscaalização

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	115			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	22/02/2024, quinta-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva			240	114	126
Chuva		Impraticavel	Raios					
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes			
Continuação da execução da chapisco e emboço da despensa.								
Continuação da execução da chapisco e emboço do depósito.								
					Mão de Obra / Função			
Gerente de Contrato	0				0			
Engenheiro Civil	0				0			
Ajudante	1				0			
Armador	0				0			
Auxiliar Administrativo	0				0			
1/2 Oficial	0				0			
Carpinteiro	0				0			
Eletricista	0				0			
Encarregado	0				0			
Mestre de Obras	0				0			
Pedreiro	1				0			
Pintor	1				0			
Auxiliar de Sondador	0				0			
Encarregado de Sondagem	0				0			
Técnico em Edificações	1				0			
Tecnico Seg. Trabalho	0				0			
Topografo	0				0			
Vigia	0				0			
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0		
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CR-20002-2023-011				Responsável - Fiscalização				

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	116		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	23/02/2024, sexta-feira		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)	
Bom	X	5		Chuva	240	115	125
Chuva		Impraticavel		Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes			
Continuação da execução da chapisco e emboço da despesa.							
Continuação da execução da chapisco e emboço do deposito.							
				Mão de Obra / Função			
Gerente de Contrato	0			0			
Engenheiro Civil	0			0			
Ajudante	1			0			
Armador	0			0			
Auxiliar Administrativo	0			0			
1/2 Oficial	0			0			
Carpinteiro	0			0			
Eletricista	0			0			
Encarregado	0			0			
Mestre de Obras	0			0			
Pedreiro	1			0			
Pintor	1			0			
Auxiliar de Sondador	0			0			
Encarregado de Sondagem	0			0			
Técnico em Edificações	1			0			
Tecnico Seg. Trabalho	0			0			
Topografo	0			0			
Vigia	0			0			
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0		
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2008128791 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização			

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	117		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	24/02/2024, sábado		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	116	124
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes		
Não houve expediente nesta data.							
					Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0				0		
Engenheiro Civil	0				0		
Ajudante	0				0		
Armador	0				0		
Auxiliar Administrativo	0				0		
1/2 Oficial	0				0		
Carpinteiro	0				0		
Eletricista	0				0		
Encarregado	0				0		
Mestre de Obras	0				0		
Pedreiro	0				0		
Pintor	0				0		
Auxiliar de Sondador	0				0		
Encarregado de Sondagem	0				0		
Técnico em Edificações	0				0		
Tecnico Seg. Trabalho	0				0		
Topografo	0				0		
Vigia	0				0		
Total de Mão de Obra:			0	Total de Máquinas / Equipamentos			0
Ererton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2008129754							
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização			

				RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 118		
				DATA INICIAL: 31/10/2023				
				DATA FINAL: 27/06/2024				
				DATA DO RDO: 25/02/2024, domingo				
CONTRANTE				Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM				041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5		Chuva		240	117	123
Chuva		Impraticavel		Raios				
Registro/ Observação da Contratada						Observações da Fiscalização/Clientes		
Não houve expediente nesta data.								
						Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0				0			
Engenheiro Civil	0				0			
Ajudante	0				0			
Armador	0				0			
Auxiliar Administrativo	0				0			
1/2 Oficial	0				0			
Carpinteiro	0				0			
Eletricista	0				0			
Encarregado	0				0			
Mestre de Obras	0				0			
Pedreiro	0				0			
Pintor	0				0			
Auxiliar de Sondador	0				0			
Encarregado de Sondagem	0				0			
Técnico em Edificações	0				0			
Tecnico Seg. Trabalho	0				0			
Topografo	0				0			
Vigia	0				0			
Total de Mão de Obra:				0		Total de Máquinas / Equipamentos		
						0		
 Responsável - MEJEC CREA-RJ 2008123456						Responsável - Fiscalização		

MEJEC				RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	119	
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	26/02/2024, segunda-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)	
Bom	X	5	Chuva		240	118	122	
Chuva		Impraticavel	Raios					
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes			
Continuação da execução da chapisco e emboço da despensa.								
Continuação da execução da chapisco e emboço do deposito.								
Mão de Obra / Função					Máquinas / Equipamentos			
Gerente de Contrato			0			0		
Engenheiro Civil			1			0		
Ajudante			1			0		
Armador			0			0		
Auxiliar Administrativo			0			0		
1/2 Oficial			0			0		
Carpinteiro			0			0		
Eletricista			0			0		
Encarregado			0			0		
Mestre de Obras			0			0		
Pedreiro			1			0		
Pintor			1			0		
Auxiliar de Sondador			0			0		
Encarregado de Sondagem			0			0		
Técnico em Edificações			1			0		
Tecnico Seg. Trabalho			0			0		
Topografo			0			0		
Vigia			0			0		
Total de Mão de Obra:			5	Total de Máquinas / Equipamentos		0		
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 2008129791								
Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização				

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	120		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	27/02/2024, terça-feira		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	119	121
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação da execução da chapisco e emboço da despensa.							
Continuação da execução da chapisco e emboço do depósito.							
Mão de Obra / Função					Máquinas / Equipamentos		
Gerente de Contrato	0				0		
Engenheiro Civil	0				0		
Ajudante	1				0		
Armador	0				0		
Auxiliar Administrativo	0				0		
1/2 Oficial	0				0		
Carpinteiro	0				0		
Eletricista	0				0		
Encarregado	0				0		
Mestre de Obras	0				0		
Pedreiro	1				0		
Pintor	1				0		
Auxiliar de Sondador	0				0		
Encarregado de Sondagem	0				0		
Técnico em Edificações	0				0		
Tecnico Seg. Trabalho	0				0		
Topografo	0				0		
Vigia	0				0		
Total de Mão de Obra:			3	Total de Máquinas / Equipamentos			0
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 26081292-1				Responsável - Fiscalização			

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	121	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	28/02/2024, quarta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva	240	120	120
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Continuação da execução da chapisco e emboço da despesa.						
Continuação da execução da chapisco e emboço do depósito.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0		0			
Engenheiro Civil	0		0			
Ajudante	1		0			
Armador	0		0			
Auxiliar Administrativo	0		0			
1/2 Oficial	0		0			
Carpinteiro	0		0			
Eletricista	0		0			
Encarregado	0		0			
Mestre de Obras	0		0			
Pedreiro	1		0			
Pintor	1		0			
Auxiliar de Sondador	0		0			
Encarregado de Sondagem	0		0			
Técnico em Edificações	1		0			
Tecnico Seg. Trabalho	0		0			
Topografo	0		0			
Vigia	0		0			
Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos	0			
Everson M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2688129791 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	122				
				DATA INICIAL:	31/10/2023				
				DATA FINAL:	27/06/2024				
				DATA DO RDO:	29/02/2024, quinta-feira				
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ					
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)	
Bom	X	5	Chuva			240	121	119	
Chuva		Impraticavel	Raios						
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes				
Continuação da execução da chapisco e emboço da despesa.									
Continuação da execução da chapisco e emboço do depósito.									
					Mão de Obra / Função				
Gerente de Contrato					0	0			
Engenheiro Civil					1	0			
Ajudante					1	0			
Armador					0	0			
Auxiliar Administrativo					0	0			
1/2 Oficial					0	0			
Carpinteiro					0	0			
Eletricista					0	0			
Encarregado					0	0			
Mestre de Obras					0	0			
Pedreiro					1	0			
Pintor					1	0			
Auxiliar de Sondador					0	0			
Encarregado de Sondagem					0	0			
Técnico em Edificações					0	0			
Técnico Seg. Trabalho					0	0			
Topografo					0	0			
Vigia					0	0			
Total de Mão de Obra:					4	Total de Máquinas / Equipamentos			0
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2108129794 Responsável - Mejec					Responsável - Fiscalização				



RDO No	95
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	02/02/2024, sexta-feira

RDO No	95
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	02/02/2024, sexta-feira

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	94	146
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
------------------------------------	--------------------------------------

Continuação da execução da alvenaria da despensa.

Continuação de pintura das paredes interna da escola.

Mão de Obra / Função	Máquinas / Equipamentos
----------------------	-------------------------


Gerente de Contrato	0	0
Engenheiro Civil	0	0
Ajudante	1	0
Armador	0	0
Auxiliar Administrativo	0	0
1/2 Oficial	0	0
Carpinteiro	0	0
Eletricista	0	0
Encarregado	0	0
Mestre de Obras	0	0
Pedreiro	1	0
Plintor	1	0
Auxiliar de Sondador	0	0
Encarregado de Sondagem	0	0
Técnico em Edificações	1	0
Técnico Seg. Trabalho	0	0
Topografo	0	0
Figia	0	0

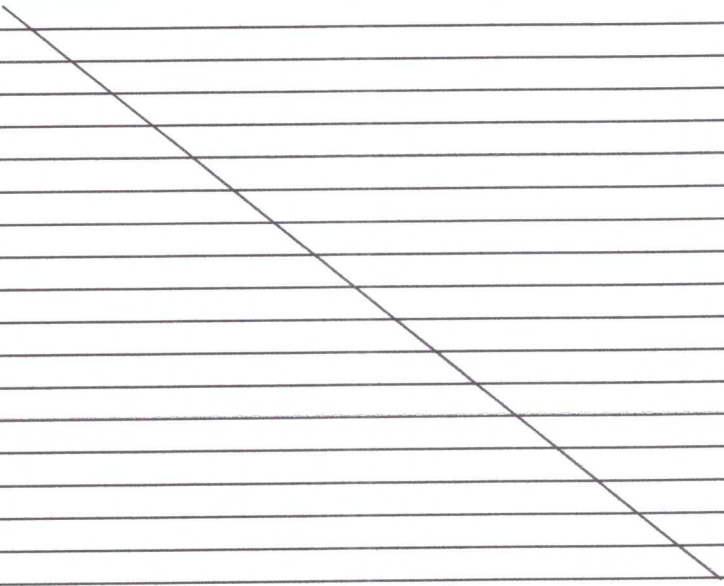

Total de Mão de Obra:	4	Total de Máquinas / Equipamentos	0
-----------------------	---	----------------------------------	---

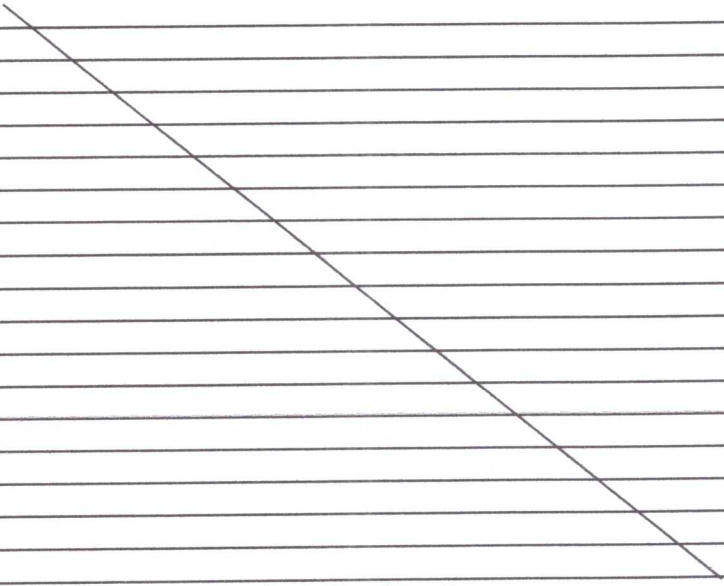

Responsável: R. Mejc

Responsável - Fiscaalização


		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	96	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	03/02/2024, sábado	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva	240	95	145
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes		
Não houve expediente nesta data.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato		0			0	
Engenheiro Civil		0			0	
Ajudante		0			0	
Armador		0			0	
Auxiliar Administrativo		0			0	
1/2 Oficial		0			0	
Carpinteiro		0			0	
Eletricista		0			0	
Encarregado		0			0	
Mestre de Obras		0			0	
Pedreiro		0			0	
Pintor		0			0	
Auxiliar de Sondador		0			0	
Encarregado de Sondagem		0			0	
Técnico em Edificações		0			0	
Técnico Seg. Trabalho		0			0	
Topografo		0			0	
Figia		0			0	
Total de Mão de Obra:		0	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 20061247-2 Responsável - Mejec						
				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	98			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	05/02/2024, segunda-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	97	143
Chuva		Impraticavel		Raios				
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes				
Continuação da execução da alvenaria da despensa.								
Continuação de pintura das paredes interna da escola.								
				Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos
Gerente de Contrato		0				0		
Engenheiro Civil		1				0		
Ajudante		1				0		
Armador		0				0		
Auxiliar Administrativo		0				0		
1/2 Oficial		0				0		
Carpinteiro		0				0		
Eletricista		0				0		
Encarregado		0				0		
Mestre de Obras		0				0		
Pedreiro		1				0		
Pintor		1				0		
Auxiliar de Sondador		0				0		
Encarregado de Sondagem		0				0		
Técnico em Edificações		1				0		
Tecnico Seg. Trabalho		0				0		
Topografo		0				0		
Vigia		0				0		
Total de Mão de Obra:		5		Total de Máquinas / Equipamentos		0		
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 2006129701 Responsável - Mejec				Responsável - Fisacalização				

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	100		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	07/02/2024, quarta-feira		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	99	141
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes		
ontinuação da execução da alvenaria da despensa.							
ontinuação de pintura das paredes interna da escola.							
							
					Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato				0			0
Engenheiro Civil				0			0
Ajudante				1			0
Armador				0			0
Auxiliar Administrativo				0			0
1/2 Oficial				0			0
Carpinteiro				0			0
Eletricista				0			0
Encarregado				0			0
Mestre de Obras				0			0
Pedreiro				1			0
Pintor				1			0
Auxiliar de Sondador				0			0
Encarregado de Sondagem				0			0
Técnico em Edificações				1			0
Tecnico Seg. Trabalho				0			0
Topografo				0			0
Fisica				0			0
Total de Mão de Obra:				4	Total de Máquinas / Equipamentos		0
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 24061297/91 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização			

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	101		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	08/02/2024, quinta-feira		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	100	140
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes		
ontinuação da execução da alvenaria da despensa.							
ontinuação de pintura das paredes interna da escola.							
							
					Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato				0		0	
Engenheiro Civil				0		0	
Ajudante				1		0	
Armador				0		0	
Auxiliar Administrativo				0		0	
1/2 Oficial				0		0	
Carpinteiro				0		0	
Eletricista				0		0	
Encarregado				0		0	
Mestre de Obras				0		0	
Pedreiro				1		0	
Pintor				1		0	
Auxiliar de Sondador				0		0	
Encarregado de Sondagem				0		0	
Técnico em Edificações				1		0	
Tecnico Seg. Trabalho				0		0	
Topografo				0		0	
Vigia				0		0	
Total de Mão de Obra:				4	Total de Máquinas / Equipamentos	0	
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 2008129791 Responsável - Mejec					Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	102		
				DATA INICIAL:	31/10/2023		
				DATA FINAL:	27/06/2024		
				DATA DO RDO:	09/02/2024, sexta-feira		
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ			
CONDIÇÕES DO TEMPO			PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva		240	101	139
Chuva		Impraticavel	Raios				
Registro/ Observação da Contratada					Observações da Fiscalização/Clientes		
termino da execução da alvenaria da despensa.							
termino de pintura das paredes interna da escola.							
					Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato		0				0	
Engenheiro Civil		0				0	
Ajudante		1				0	
Armador		0				0	
Auxiliar Administrativo		0				0	
1/2 Oficial		0				0	
Carpinteiro		0				0	
Eletricista		0				0	
Encarregado		0				0	
Mestre de Obras		0				0	
Pedreiro		1				0	
Pintor		1				0	
Auxiliar de Sondador		0				0	
Encarregado de Sondagem		0				0	
Técnico em Edificações		1				0	
Tecnico Seg. Trabalho		0				0	
Topografo		0				0	
Fisica		0				0	
Total de Mão de Obra:		4		Total de Máquinas / Equipamentos		0	
Everton M. da Silva Engenheiro Civil Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização			

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	105			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	12/02/2024, segunda-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5	Chuva			240	104	136
Chuva		Impraticavel	Raios					
Registro/ Observação da Contratada						Observações da Fiscalização/Clientes		
Não houve expediente nesta data.								
						Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato				0			0	
Engenheiro Civil				0			0	
Ajudante				0			0	
Armador				0			0	
Auxiliar Administrativo				0			0	
1/2 Oficial				0			0	
Carpinteiro				0			0	
Eletricista				0			0	
Encarregado				0			0	
Mestre de Obras				0			0	
Pedreiro				0			0	
Pintor				0			0	
Auxiliar de Sondador				0			0	
Encarregado de Sondagem				0			0	
Técnico em Edificações				0			0	
Tecnico Seg. Trabalho				0			0	
Topografo				0			0	
Vigia				0			0	
Total de Mão de Obra:				0	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
 Ewerthon M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 21841297-1 Responsável - Mejec						Responsável - Fiscalização		



RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO

RDO No	106
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	13/02/2024, terça-feira

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

CONDIÇÕES DO TEMPO				PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5		Chuva		240	105	135
Chuva		Impraticavel		Raios				

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
Não houve expediente nesta data.	

Mão de Obra / Função		Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato	0		0
Engenheiro Civil	0		0
Ajudante	0		0
Armador	0		0
Auxiliar Administrativo	0		0
1/2 Oficial	0		0
Carpinteiro	0		0
Eletricista	0		0
Encarregado	0		0
Mestre de Obras	0		0
Pedreiro	0		0
Pintor	0		0
Auxiliar de Sondador	0		0
Encarregado de Sondagem	0		0
Técnico em Edificações	0		0
Tecnico Seg. Trabalho	0		0
Topografo	0		0
Vigia	0		0
Total de Mão de Obra:	0	Total de Máquinas / Equipamentos	0

Ernesto M. da Silva Engenheiro Civil CPF: 20084737-23 Responsável - Mejec	Responsável - Fiscalização
---	----------------------------



RDO No	107
DATA INICIAL:	31/10/2023
DATA FINAL:	27/06/2024
DATA DO RDO:	14/02/2024, quarta-feira

CONTRANTE	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	041/2023	OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ

Registro/ Observação da Contratada	Observações da Fiscalização/Clientes
------------------------------------	--------------------------------------

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. On the left side, there is a vertical margin line, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled document. There is no handwriting or other markings on the page.

Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 20081293-0	
Responsável - Meiec	Responsável - Fiscalização

Responsável - Mejec

Responsável - Fiscaalização

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	109								
				DATA INICIAL:	31/10/2023								
				DATA FINAL:	27/06/2024								
				DATA DO RDO:	16/02/2024, sexta-feira								
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ									
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)							
Bom	X	5	Chuva	240	108	132							
Chuva		Impraticavel	Raios										
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes									
Não houve expediente nesta data.													
							Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos		
							Gerente de Contrato	0			0		
Engenheiro Civil	0			0									
Ajudante	0			0									
Armador	0			0									
Auxiliar Administrativo	0			0									
1/2 Oficial	0			0									
Carpinteiro	0			0									
Eletricista	0			0									
Encarregado	0			0									
Mestre de Obras	0			0									
Pedreiro	0			0									
Pintor	0			0									
Auxiliar de Sondador	0			0									
Encarregado de Sondagem	0			0									
Técnico em Edificações	0			0									
Tecnico Seg. Trabalho	0			0									
Topografo	0			0									
Vigia	0			0									
Total de Mão de Obra:		0	Total de Máquinas / Equipamentos		0								
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 0706129791													
Responsável - Mejec				Responsável - Fisacalização									


		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	113	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	20/02/2024, terça-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva	240	112	128
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes		
Continuação da execução da chapisco e emboço da despesa.						
Continuação da execução da chapisco e emboço do depósito.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0			0		
Engenheiro Civil	0			0		
Ajudante	1			0		
Armador	0			0		
Auxiliar Administrativo	0			0		
1/2 Oficial	0			0		
Carpinteiro	0			0		
Eletricista	0			0		
Encarregado	0			0		
Mestre de Obras	0			0		
Pedreiro	1			0		
Pintor	1			0		
Auxiliar de Sondador	0			0		
Encarregado de Sondagem	0			0		
Técnico em Edificações	1			0		
Tecnico Seg. Trabalho	0			0		
Topografo	0			0		
Vigia	0			0		
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 2008029791 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		


		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	114			
				DATA INICIAL:	31/10/2023			
				DATA FINAL:	27/06/2024			
				DATA DO RDO:	21/02/2024, quarta-feira			
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ				
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)
Bom	X	5		Chuva		240	113	127
Chuva		Impraticavel		Raios				
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes				
Continuação da execução da chapisco e emboço da despesa.								
Continuação da execução da chapisco e emboço do deposito.								
				Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos
Gerente de Contrato		0				0		
Engenheiro Civil		1				0		
Ajudante		1				0		
Armador		0				0		
Auxiliar Administrativo		0				0		
1/2 Oficial		0				0		
Carpinteiro		0				0		
Eletricista		0				0		
Encarregado		0				0		
Mestre de Obras		0				0		
Pedreiro		1				0		
Pintor		1				0		
Auxiliar de Sondador		0				0		
Encarregado de Sondagem		0				0		
Técnico em Edificações		1				0		
Tecnico Seg. Trabalho		0				0		
Topografo		0				0		
Vigia		0				0		
Total de Mão de Obra:		5		Total de Máquinas / Equipamentos		0		
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA-RJ 2006129791 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização				

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	115						
				DATA INICIAL:	31/10/2023						
				DATA FINAL:	27/06/2024						
				DATA DO RDO:	22/02/2024, quinta-feira						
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ							
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)		DIAS (CORRIDOS)		DIAS (RESTANTE)	
Bom	X	5		Chuva		240		114		126	
Chuva		Impraticavel		Raios							
Registro/ Observação da Contratada						Observações da Fiscalização/Clientes					
Continuação da execução da chapisco e emboço da despensa.											
Continuação da execução da chapisco e emboço do depósito.											
Mão de Obra / Função						Máquinas / Equipamentos					
Gerente de Contrato				0						0	
Engenheiro Civil				0						0	
Ajudante				1						0	
Armador				0						0	
Auxiliar Administrativo				0						0	
I/2 Oficial				0						0	
Carpinteiro				0						0	
Eletricista				0						0	
Encarregado				0						0	
Mestre de Obras				0						0	
Pedreiro				1						0	
Pintor				1						0	
Auxiliar de Sondador				0						0	
Encarregado de Sondagem				0						0	
Técnico em Edificações				1						0	
Técnico Seg. Trabalho				0						0	
Topografo				0						0	
Figia				0						0	
Total de Mão de Obra:				4		Total de Máquinas / Equipamentos				0	
Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA/RJ 20004209201 Responsável - Mejec						Responsável - Fiscalização					

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	116	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	23/02/2024, sexta-feira	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva	240	115	125
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Cientes		
Continuação da execução da chapisco e emboço da despesa.						
Continuação da execução da chapisco e emboço do deposito.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0			0		
Engenheiro Civil	0			0		
Ajudante	1			0		
Armador	0			0		
Auxiliar Administrativo	0			0		
1/2 Oficial	0			0		
Carpinteiro	0			0		
Eletricista	0			0		
Encarregado	0			0		
Mestre de Obras	0			0		
Pedreiro	1			0		
Pintor	1			0		
Auxiliar de Sondador	0			0		
Encarregado de Sondagem	0			0		
Técnico em Edificações	1			0		
Tecnico Seg. Trabalho	0			0		
Topografo	0			0		
Vigia	0			0		
Total de Mão de Obra:		4	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
Everton M. da Silva Engenheiro Civil CPF: 01.206129701 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	118	
				DATA INICIAL:	31/10/2023	
				DATA FINAL:	27/06/2024	
				DATA DO RDO:	25/02/2024, domingo	
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ		
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES	PERÍODO	PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (REstante)
Bom	X	5	Chuva	240	117	123
Chuva		Impraticavel	Raios			
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes		
Não houve expediente nesta data.						
				Mão de Obra / Função		
Gerente de Contrato	0		0			
Engenheiro Civil	0		0			
Ajudante	0		0			
Armador	0		0			
Auxiliar Administrativo	0		0			
1/2 Oficial	0		0			
Carpinteiro	0		0			
Eletricista	0		0			
Encarregado	0		0			
Mestre de Obras	0		0			
Pedreiro	0		0			
Pintor	0		0			
Auxiliar de Sondador	0		0			
Encarregado de Sondagem	0		0			
Técnico em Edificações	0		0			
Tecnico Seg. Trabalho	0		0			
Topografo	0		0			
Vigia	0		0			
Total de Mão de Obra:		0	Total de Máquinas / Equipamentos		0	
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CPF: 01.200.814.793 Responsável - Mejec				Responsável - Fiscalização		

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No 119									
				DATA INICIAL: 31/10/2023									
				DATA FINAL: 27/06/2024									
				DATA DO RDO: 26/02/2024, segunda-feira									
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ									
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)		DIAS (CORRIDOS)		DIAS (REstante)			
Bom	X	5		Chuva			240	118	122				
Chuva		Impraticavel		Raios									
Registro/ Observação da Contratada							Observações da Fiscalização/Cientes						
Continuação da execução da chapisco e emboço da despesa.													
Continuação da execução da chapisco e emboço do deposito.													
												Mão de Obra / Função	
Gerente de Contrato							0						
Engenheiro Civil							1						
Ajudante							1						
Armador							0						
Auxiliar Administrativo							0						
1/2 Oficial							0						
Carpinteiro							0						
Eletricista							0						
Encarregado							0						
Mestre de Obras							0						
Pedreiro							1						
Pintor							1						
Auxiliar de Sondador							0						
Encarregado de Sondagem							0						
Técnico em Edificações							1						
Técnico Seg. Trabalho							0						
Topografo							0						
Vigia							0						
Total de Mão de Obra:							5		Total de Máquinas / Equipamentos			0	
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA/RJ 206872973-1 Responsável - Mejec							Responsável - Fiscalização						

		RELATÓRIO DIARIO DE OBRA - RDO		RDO No	120				
				DATA INICIAL:	31/10/2023				
				DATA FINAL:	27/06/2024				
				DATA DO RDO:	27/02/2024, terça-feira				
CONTRANTE		Nº CONTRATO		OBJETO DO CONTRATO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		041/2023		OBJETO: Reforma e Ampliação Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antônio - 3º distrito de Bom Jardim/RJ					
CONDIÇÕES DO TEMPO		PARALIZAÇÕES		PERÍODO		PRAZO (Dias)	DIAS (CORRIDOS)	DIAS (RESTANTE)	
Bom	X	5		Chuva		240	119	121	
Chuva		Impraticavel		Raios					
Registro/ Observação da Contratada				Observações da Fiscalização/Clientes					
Continuação da execução da chapisco e emboço da despesa.									
Continuação da execução da chapisco e emboço do depósito.									
				Mão de Obra / Função				Máquinas / Equipamentos	
Gerente de Contrato	0							0	
Engenheiro Civil	0							0	
Ajudante	1							0	
Armador	0							0	
Auxiliar Administrativo	0							0	
1/2 Oficial	0							0	
Carpinteiro	0							0	
Eletricista	0							0	
Encarregado	0							0	
Mestre de Obras	0							0	
Pedreiro	1							0	
Pintor	1							0	
Auxiliar de Sondador	0							0	
Encarregado de Sondagem	0							0	
Técnico em Edificações	0							0	
Técnico Seg. Trabalho	0							0	
Topografo	0							0	
Figia	0							0	
Total de Mão de Obra:		3		Total de Máquinas / Equipamentos					0
 Ewerton M. da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 2008129701				Responsável - Fiscalização					
Responsável - Mejec									

