

CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA


"CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA HUMBERTO NEVES, N° 10, JARDIM BOA ESPERANÇA – BOM JARDIM/RJ".

5ª MEDIÇÃO

Período: 20/04/2023 a 31/07/2024

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO	CND TRIBUTOS FEDERAIS E INSS
PLANILHA DE MEDIÇÃO	CND FGTS
DIÁRIO DE OBRAS	CND ESTADUAL
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CND DIVIDA ATIVA
GFIP/SEFIP	CND MUNICIPAL
CONTRACHEQUES	CND TRABALHISTA
GUIA E COMPROVANTE FGTS	DECLARAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO

09.594.456/0001-00
Conservit Construção e conservação Ltda.
Avenida Vicente Jol, s/n
Volta da Ferradura
CEP 28.545-000 MACUCO - RJ





À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Governador Roberto Silveira, 144 – Centro - Bom Jardim/RJ

CEP: 28.660-000

CNPJ nº: 11.867.889/0001-25

At.: Sr. Wueliton Pires.
Secretário de Saúde

Ref.: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na Rua Humberto Neves, nº 10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ.

Tomada de Preços nº 005/2023

Contrato nº 054/2023


Processo Administrativo nº 0982/2023

Prezado Senhor,

A empresa **CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA**, com endereço à Avenida Vicente Joi, s/nº, Volta da Ferradura, Macuco - RJ, CNPJ nº 09.594.456/0001-00, vem solicitar à **5ª medição**, dos serviços executados no período de 20/04/2024 a 31/07/2024, referente ao contrato supracitado, de "CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na Rua Humberto Neves, nº 10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ".

Macuco-RJ, 12/08/2024

Atenciosamente,


.....
Assinatura do representante legal
Nome: Ademir Joi
Cargo: Proprietário
CPF: 381.017.857-87
Documento de identidade: 81.212.303-2 DETRAN-RJ

09.594.456/0001-00
Conservit Construção e conservação Ltda.
Avenida Vicente Joi, s/n
Volta da Ferradura
CEP 28.545-000 MACUCO - RJ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

CODIGO EMOP

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PRECOS

UNITARIO

TOTAL

1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.1

05.005.0012-1

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

55,00

5,00

275,00

1.4.2

05.006.0001-1

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMMES

1.122,00

10,00

11.220,00

1.4.3

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

374,00

6,00

2.244,00

1.4.4

05.008.0008-1

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

M2

374,00

0,50

187,00

1.4.5

05.050.0001-0

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESURA,INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSÕES DE 0,40X0,60M,FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

475,00

475,00

TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.401,00

TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

44.939,24

2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL

2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO

2.1.1

01.003.0001-0

SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO

M

60,00

120,00

7.200,00

2.1.2

01.008.0050-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATÉ 50KM

UN

1,00

7.000,00

7.000,00

2.1.3

01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

M

82,80

20,00

1.656,00

TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO

15.856,00

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

291,39

53,00

15.443,67

TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,00

44.939,24

15.856,00

15.443,67

14.401,

5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 20/04/2024 a 31/07/2024						
REALIZADO			A REALIZAR			
Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	
10,00	50,00	18,18%	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
74,00	444,00	19,79%	0,00	0,00	0,00%	
74,00	37,00	19,79%	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%	1,00	475,00	100,00%	
	531,00			475,00		
	681,00			475,00		
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	0,00			0,00		
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%		0,00		

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102945

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

dec/22

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITARIO	TOTAL
2.3 - TRANSPORTES						
2.3.1	04.005.0123-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T	T X KM	8.741,40	1,40	12.237,96
				TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES		12.237,96
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.4.2	16.034.0003-0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, MACIÇOS, SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORÇÃO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO À BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZAÇÃO COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACIÇO	M2	78,63	115,00	9.042,45
				TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		9.042,45
2.5 - PAVIMENTAÇÃO						
2.5.1	09.001.0002-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO, PARA R	M2	301,78	20,00	6.035,60
2.5.3	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,95	500,00	4.975,00
				TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAÇÃO		11.010,60
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						
2.6.1	11.013.0130-0	CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	27,84	2.200,00	61.248,00
2.6.3	11.030.0020-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATÉ 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURANEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/CONCRETO FCK=20MPA	M2	263,40	R\$ 158,00	41.617,20
2.6.5	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,73	2.000,00	1.460,00

5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 20/04/2024 a 31/07/2024						
REALIZADO			A REALIZAR			
Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00			0,00			
0,00	0					

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

dez/22

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
2.6.8	12.005.0020-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	180,00	80,00	14.400,00
2.6.9	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ 0,20M	M2	886,50	88,00	78.012,00
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						196.737,20
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
2.7.1	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1.773,00	29,00	51.417,00
2.7.2	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS, DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE AÇAME E REJUNTADAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	222,43	49,50	11.010,28
2.7.4	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	315,88	28,00	8.844,64
2.7.5	13.301.0125-B	CONTRAPISO BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 3CM	M2	263,40	28,00	7.375,20
2.7.6	13.380.0011-0	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO: AJUSTRO, COM 4CM DE ESPESURA MÉDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4; 8) CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO, SUPERFÍCIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, COM 3 POLIMENTOS MECÂNICOS, EXCLUSIVE JUNTA	M2	222,43	70,00	15.570,10
2.7.7	13.036.0015-0	RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM EXCM DE ESPESURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3; 2) INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	262,10	57,00	14.939,70
2.7.8	13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3; 3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	31,80	70,00	2.226,00
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						111.382,92

5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 20/04/2024 a 31/07/2024

REALIZADO				A REALIZAR			
Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%		
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
89,50	7.876,00	10,10%	0,00	0,00	0,00%		
7.876,00			0,00				
1.152,45	33.421,05	65,00%	0,00	0,00	0,00%		
0,00	0,00	0,00%	222,43	11.010,28	100,00%		
0,00	0,00	0,00%	315,88	8.844,64	100,00%		
0,00	0,00	0,00%	263,40	7.375,20	100,00%		
0,00	0,00	0,00%	222,43	15.570,10	100,00%		
0,00	0,00	0,00%	262,10	14.939,70	100,00%		
0,00	0,00	0,00%	31,80	2.226,00	100,00%		
33.421,05			59.965,92				


Sérgio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102945

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITARIO	TOTAL
2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						
2.8.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1,1/2" COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇAO	M2	9,60	917,00	8.803,20
2.8.2	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇAO	UN	25,00	620,00	15.500,00
2.8.3	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU PAINÉIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇAO	M2	28,32	425,00	12.036,00
2.8.4	14.007.0338-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FORNECIMENTO	UN	2,00	67,00	134,00
2.8.5	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FORNECIMENTO	UN	4,00	29,00	116,00
2.8.6	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEC. S/ COLOCAÇAO, DE: FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO; -3 DOBRADICAS 3"X2, 1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLOS DE LATAO	UN	24,00	230,00	5.520,00
TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						42.109,20
2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
2.9.1	15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTTJOS GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM.(1,00X0,50X1,80)M, ALVENARIA TIJOLOS MACIOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM ESPESURA DE 10CM E COBERTUTUA COM ESPESURA DE 6CM, AMBAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4, CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP	UN	1,00	2.150,00	2.150,00
2.9.2	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E COLOCAÇAO	UN	1,00	170,00	170,00
2.9.3	15.002.0096-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIOS(7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), MEDINDO 1,50X2,20X0,90M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	UN	1,00	3.100,00	3.100,00

5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 20/04/2024 a 31/07/2024						
REALIZADO				A REALIZAR		
Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$		
0,00	0,00	0,00%	9,60	8.803,20	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	25,00	15.500,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	28,32	12.036,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	2,00	134,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	4,00	116,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	24,00	5.520,00	100,00%	
0,00			42.109,20			
0,00	0,00	0,00%	1,00	2.150,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	1,00	170,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	1,00	3.100,00	100,00%	

Sévio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102945

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

dez/22

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITARIO	TOTAL
2.9.4	15.002.0630-0	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CLINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	4.700,00	4.700,00
2.9.5	15.002.0665-0	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	8.300,00	8.300,00
2.9.6	15.004.0061-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOS	UN	5,00	347,00	1.735,00
2.9.7	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOS	UN	13,00	155,00	2.015,00
2.9.8	15.004.0133-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCL. ESTE)EM PAVIMENTO TERREO, PARTE DE UM CONJ. DE DOIS OU MAIS VASOS COMPREENDENDO:INST. HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOS,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCL. CONEXOS, EXCL. TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00	250,00	1.250,00
2.9.9	15.004.0180-0	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GREIHA REDONDA E PORTA-GREIHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	135,00	675,00
2.9.10	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	73,00	146,00
2.9.11	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	21,00	105,00
2.9.12	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACIO 3/8"x600MM, FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	36,00	36,00
2.9.13	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,00	455,00	1.820,00
2.9.14	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	11,00	77,00
2.9.15	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	31,00	310,00

5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 20/04/2024 a 31/07/2024						
REALIZADO				A REALIZAR		
Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	
1,00	4.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
1,00	8.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%	5,00	1.735,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	13,00	2.015,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	5,00	1.250,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	5,00	675,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	2,00	146,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	5,00	105,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	1,00	36,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	4,00	1.820,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	7,00	77,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	10,00	310,00	100,00%	

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Sávio Oliveira da Silva

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA

LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

CNPJ: 09.594.456/0001-00



CONSERVIT
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

dez/22							5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 20/04/2024 a 31/07/2024					
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.16	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	115,00	100,00%
2.9.17	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO,PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	5,60	840,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	840,00	100,00%
2.9.18	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO,PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	8,20	820,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	820,00	100,00%
2.9.19	15.008.0105-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO,PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	11,00	550,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	550,00	100,00%
2.9.20	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO,PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	600,00	100,00%
2.9.21	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUITO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXÕES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	15,00	300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	15,00	4.500,00	100,00%
2.9.22	15.015.0035-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUITO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXÕES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	578,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00%	7,00	4.046,00	100,00%
2.9.23	15.015.0050-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUITO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXÕES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	738,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	3.690,00	100,00%
2.9.24	15.015.0171-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORÇA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXÕES	UN	7,00	385,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00%	7,00	2.695,00	100,00%



Sérgio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

dez/22

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%		QUANT.	R\$	%
2.9.25	15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	34,00	290,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00%		34,00	9.860,00	100,00%
2.9.26	15.015.0280-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	40,00	315,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00%		40,00	12.600,00	100,00%
2.9.27	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO COUSEMEIHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA, EMALHA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00	595,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00%		2,00	1.190,00	100,00%
2.9.28	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00%		10,00	450,00	100,00%
2.9.29	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	77,00	616,00	0,00	0,00	0,00%		8,00	616,00	100,00%
2.9.30	15.029.0014-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1,1/2" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	115,00	690,00	0,00	0,00	0,00%		6,00	690,00	100,00%
2.9.31	15.036.0031-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	20,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%
2.9.32	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00	9,00	1.080,00	120,00	1.080,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%
2.9.33	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	75,00	14,00	1.050,00	75,00	1.050,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%
2.9.34	15.036.0045-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	80,00	12,00	960,00	80,00	960,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%
2.9.35	15.036.0048-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00	25,00	1.500,00	60,00	1.500,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%
2.9.36	15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	50,00	18,00	900,00	50,00	900,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%
2.9.37	15.007.0204-0	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 3/4" (19MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%		1,00	100,00	100,00%

5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:

De: 20/04/2024 a 31/07/2024


Sérgio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITARIO	TOTAL
2.9.38	21.028.0015-0	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHÃO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, CONDUTORES DE 6 - 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	23,00	92,00
2.9.39	21.003.0057-0	POSTE DE AÇO RETO CONICO CONTINUO, ALTURA DE 9,00M, COM SAPATA, FORNECIMENTO	UN	1,00	3.400,00	3.400,00
2.9.40	15.011.0015-0	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO ENEL, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, 10KVA E 24KVA, TRIFASICA, INCL. CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA, POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO (ATE 100A) INTERNA, POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPECAO, HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO, MAT. NECESSARIOS, EXCL. POSTE, DISJUNTOR, CONDUTORES ENTR. SAIDA, ATERRAMENTO E CONECTORES	M	1,00	380,00	380,00
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						81.313,00
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
2.10.1	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2", CAIBROS DE 3"x1,1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESCOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	263,40	114,00	30.027,60
2.10.2	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMÍNIO/16"x250MM COM ROSCA EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEIRA, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	263,40	63,00	16.594,20
2.10.3	16.005.0008-0	CUMEIRA DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	40,00	64,00	2.560,00
2.10.4	16.007.0025-0	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	103,46	74,00	7.656,04
2.10.5	16.004.0055-A	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	103,46	59,00	6.104,14
2.10.6	16.011.0005-0	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA, INCL. MADEIRAMENTO EM PEÇAS DE MADEIRA PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, MEDIDO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	7,76	420,00	3.259,20
2.10.7	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7x500)MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	81,80	116,00	9.488,80
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						75.689,98

5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 20/04/2024 a 31/07/2024						
Quant.	REALIZADO		%	QUANT.	A REALIZAR	
	R\$				R\$	%
0,00	0,00	0,00%	4,00	92,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	1,00	3.400,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	1,00	380,00	100,00%	
20.490,00			60.823,00			
0,00	0,00	0,00%	263,40	30.027,60	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	263,40	16.594,20	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	40,00	2.560,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	103,46	7.656,04	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	103,46	6.104,14	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	7,76	3.259,20	100,00%	
0,00	0,00	0,00%	81,80	9.488,80	100,00%	
0,00			75.689,98			

Severino do Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

dez/22

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO	%	A REALIZAR		%	
					UNITARIO	TOTAL			R\$			QUANT.
2.11 - PINTURAS												
2.11.1	17.017.0370-0	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU ACETINADO, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE MADEIRAS EM TÁIS, ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR	M2	58,95	39,00	2.299,05	0,00	0,00	0,00%	58,95	2.299,05	100,00%
2.11.2	17.018.0265-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAO DE ACAB	M2	1777,47	37,00	65.766,39	0,00	0,00	0,00%	1.777,47	65.766,39	100,00%
2.11.3	17.025.0010-A	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAO	M2	263,40	4,90	1.290,66	0,00	0,00	0,00%	263,40	1.290,66	100,00%
			TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS					69.356,10				
2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS												
2.12.1	18.002.0030-A	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2", FORNECIMENTO	UN	8,00	418,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	3.344,00	100,00%
2.12.2	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	539,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	2.695,00	100,00%
2.12.3	18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	33,00	561,00	0,00	0,00	0,00%	17,00	561,00	100,00%
2.12.4	18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	33,00	561,00	0,00	0,00	0,00%	17,00	561,00	100,00%
2.12.5	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PARADE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	5,00	777,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	3.885,00	100,00%
2.12.6	18.006.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	120,00	100,00%
2.12.7	18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA, EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	134,00	100,00%
2.12.8	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	5,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	150,00	100,00%

5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:

De: 20/04/2024 a 31/07/2024

SANTO OLIVEIRA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 20/04/2024 a 31/07/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO		QUANT.	A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%		R\$	%
2.12.9	18.016.0035-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM CHAPA 18,304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20,304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFÕES 1680 1,1/2" X 1,1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	2.370,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	11.850,00	100,00%
2.12.10	18.016.0110-A	BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"1",EM TUBO DE 1,1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18,8,MEDINDO 60X60CM,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	20,00	270,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	5.400,00	100,00%
2.12.11	15.020.0155-0	LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	70,00	7,80	546,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	546,00	100,00%
2.12.12	18.260.0065-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	70,00	4,00	280,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	280,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS								61.787,05			29.526,00	
TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL								62.468,05			348.955,80	
TOTAL:								13.999,09			78.200,99	
B.D.I								76.467,14			427.156,79	
TOTAL GERAL:												

Sávio Oliveira do Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 51

FOLHA: 52

CONTRATO
n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TEMPO:

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira 22/04/2024

A

Sexta - Feira

26/04/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	3
Motorista	-

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

Concretagem da viga de travamento do muro de divisa.

Execução de emboço.

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

		CONSERVIT Construção e Conservação Ltda	
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL			
OBRA:	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ, localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.		
	SEMANA DE OBRA:	52	FOLHA: 53
CONTRATO n.º: 054/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023	TEMPO: BOM X NUBLADO X CHUVOSO X
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 31/12/2024	
DIA DA SEMANA			
Segunda - Feira	29/04/2024	A	Terça - Feira 30/04/2024

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	3
Motorista	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Concretagem da viga de travamento do muro de divisa.

Execução de emboço.

Anotação do Fiscal da Obra:

 Conservit	Fiscal da Obra
--	----------------

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102945



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 53

FOLHA: 54

CONTRATO

n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

TEMPO:

BOM

X

DIA DA SEMANA

Quarta-Feira 01/05/2024

Sexta - Feira 03/05/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	3
Motorista	-

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço

OBS: FERIADO NACIONAL DIA 01/05/2024 - DIA DO TRABALHO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 54

FOLHA: 55

CONTRATO

n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

TEMPO:

BOM

X

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira 06/05/2024

A

Sexta-Feira

10/05/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	3
Motorista	-

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ, localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.			
	SEMANA DE OBRA:	55	FOLHA:	56
CONTRATO	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023		TEMPO:	
n.º: 054/2023	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024		BOM	X
DIA DA SEMANA			NUBLADO	
Segunda - Feira	13/05/2024	A	Sexta - Feira	17/05/2024
			CHUVOSO	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	3
Motorista	-

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 56

FOLHA: 57

CONTRATO

n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira 20/05/2024 A

Sexta - Feira 24/05/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	3
Motorista	-

EQUIPAMENTO

<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>

Serviços realizados:

Execução de emboço

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102945

		CONSERVIT Construção e Conservação Ltda	
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL			
OBRA:	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ, localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.		
	SEMANA DE OBRA:	57	FOLHA: 58
CONTRATO n.º: 054/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023	TEMPO:
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024	BOM X
DIA DA SEMANA			NUBLADO
Segunda - Feira	27/05/2024	A	Sexta-Feira 31/05/2024
			CHUVOSO

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	3
Motorista	-


EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Execução de emboço

OBS: FERIADO NACIONAL DIA 30/05/2024 - CORPUS CHRISTI;

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit
Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 58

FOLHA: 59

CONTRATO

n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 03/06/2024

Sexta - Feira 07/06/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço

Execução da platibanda

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA:

59

FOLHA:

60

CONTRATO

n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

TEMPO:

BOM

X

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira

10/06/2024

A

Sexta-Feira

14/06/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço

Execução da platibanda

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 60

FOLHA: 61

CONTRATO
n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TEMPO:

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira 17/06/2024

A

Sexta - Feira

21/06/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço

Execução da platibanda

Colocação dos tubos rede hidráulica e esgoto

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 61

FOLHA: 62

CONTRATO

n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira

24/06/2024

A

Sexta - Feira

28/06/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço

Execução da platibanda

Colocação dos tubos rede hidráulica e esgoto

OBS: FERIADO MUNICIPAL DIA 24/06/2024 - (SÃO JOÃO BATISTA - PADROEIRO DA CIDADE) ;

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ, localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.				
SEMANA DE OBRA:		62	FOLHA:	63	
CONTRATO		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:		05/06/2023	TEMPO:
n.º: 054/2023		TÉRMINO P/ EXECUTIVO:		30/12/2024	BOM X
DIA DA SEMANA					NUBLADO
Segunda-Feira 01/07/2024		Sexta - Feira 05/07/2024		CHUVOSO	X

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço / reboco

Assentamento de caixonete

Execução da platibanda

Colocação dos tubos rede hidráulica e esgoto

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 63**FOLHA:** 64**CONTRATO**

n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023**TÉRMINO P/ EXECUTIVO:** 30/12/2024**TEMPO:**

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira 08/07/2024

A

Sexta-Feira

12/07/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	2
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço / reboco

Assentamento de caixonete

Execução da platibanda

Colocação dos tubos rede hidráulica e esgoto

Anotação do Fiscal da Obra:**Conservit****Fiscal da Obra**

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 64

FOLHA: 65

CONTRATO
n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TEMPO:

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

BOM

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira 15/07/2024

A

Sexta - Feira

19/07/2024

NUBLADO

CHUVOSO

X

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	1

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.
BETONEIRA	1

Serviços realizados:

Execução de emboço / reboco

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:

Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ,
localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.

SEMANA DE OBRA: 65

FOLHA: 66

CONTRATO

n.º: 054/2023

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023

TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024

TEMPO:

BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda - Feira 22/07/2024 A

Sexta - Feira 26/07/2024

NUBLADO

CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	1

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Execução de emboço / reboco

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra

		CONSERVIT Construção e Conservação Ltda	
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL			
OBRA:	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Esperança - Bom Jardim - RJ, localidade: Rua Humberto Neves, n.º 10, Boa Esperança - Bom Jardim/RJ.		
	SEMANA DE OBRA:	66	FOLHA: 67
CONTRATO n.º: 054/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 05/06/2023	TEMPO:
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/12/2024	BOM X
DIA DA SEMANA			NUBLADO
Segunda - Feira	29/07/2024	A	Quarta - Feira 31/07/2024 CHUVOSO

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	-
Servente	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

Execução de emboço / reboco

Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**


Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO - 20/04/2024 A 31/07/2024



EMBOÇO INTERNO

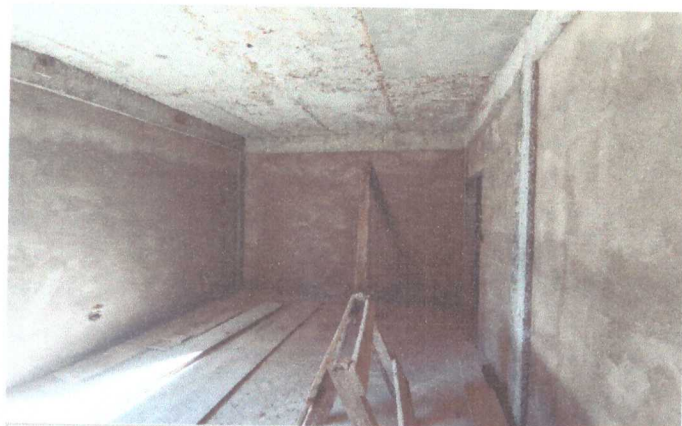

EMBOÇO INTERNO




EMBOÇO INTERNO



EMBOÇO INTERNO



EMBOÇO EXTERNO

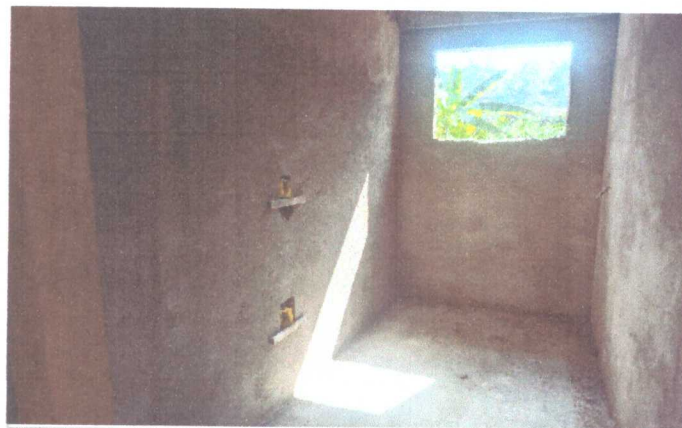

EMBOÇO INTERNO

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 7020102845




Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO - 20/04/2024 A 31/07/2024



PLATIBANDA



PLATIBANDA

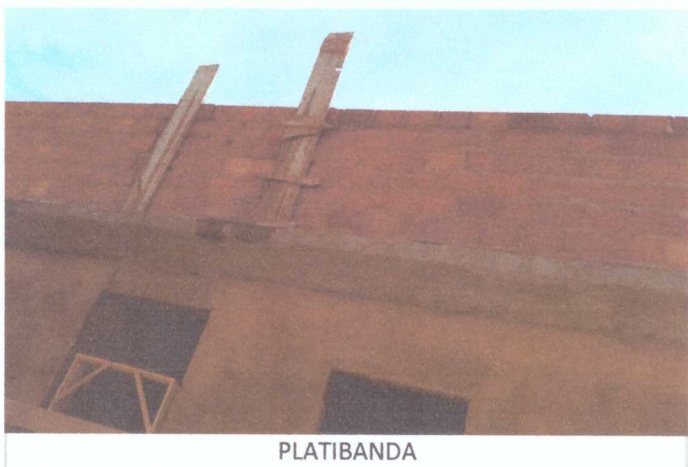

PLATIBANDA



FOSSA / FILTRO



FOSSA / FILTRO



REDE ESGOTO


Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

Endereço: Rua Humberto Neves, n°10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO - 20/04/2024 A 31/07/2024



REDE ESGOTO



REDE ESGOTO




Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845
