

SERD SERV SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

End: Av. Walter Vendas Rodrigues, n° 18, Bairro: Novo Mundo, Mun. Bom Jardim/RJ.

Tel: (22) 2566-2390

E-mail: contato@serderv.com.br

CNPJ: 11.836.428/0001-95 - INSC. ESTADUAL: 87.17.01.36



Obra:

E. M. CÉSAR MONTEIRO, E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS e E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS - Bom Jardim/RJ

CONTRATO: 051/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0738/2021 - TP: 001/2021

DATA DE INÍCIO: 07/06/2021

1ª Medição

Data: 21/07/2021

PLANILHA DE PRIMEIRA MEDIÇÃO

ESCOLA ARMANDO JORGE							ELEMENTOS DA MEDIÇÃO		
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITARIO	CUSTO TOTAL	MEDIÇÕES ANTERIORES	QUANTIDADES SERVIÇOS MEDIDOS	CUSTOS DA MEDIÇÃO
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS									
1.2.1	01.050.0050-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	898,10	2,65	2.379,96		0,00	0,00
1.2.2	01.050.0114-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	898,10	8,10	7.274,61		0,00	0,00
1.2.3	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	260,27	260,27		1,00	260,27
TOTAL DO ITEM			1.2 - CANTEIRO DE OBRAS						260,27
1.3 - TRANSPORTES									
1.3.1	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	0,08	1.009,80		2.805,00	252,45
1.3.2	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIECAO VERTICAL	M2	374,00	0,50	187,00		93,50	46,75
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES									299,20
* - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.4.1	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1",CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	2,19	120,45		13,75	30,11
1.4.2	05.006.0001-B	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADINHO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROIECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	748,00	4,68	3.500,64		187,00	875,16
1.4.3	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	4,33	1.619,42		93,50	404,85
1.4.4	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	0,35	130,90		93,50	32,72
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									1.342,84
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									1.902,31
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL									
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
2.4.1	05.001.0055-A	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	449,05	7,58	3.403,79		449,05	3.403,79
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									3.403,79
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									
2.6.1	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	2,00	1.537,47	3.074,94		0,00	0,00
2.6.2	12.003.0095-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M	M2	17,55	60,64	1.064,23		0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									0,00
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									
2.7.1	13.001.0015-A	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3	M2	592,32	19,97	11.828,63		197,44	3.942,87
2.7.2	13.030.0290-0	Revestimento de paredes com cerâmica, com medidas em torno de (32x57)cm, assente conforme item 13.025.0016	M2	103,80	77,57	8.051,76		47,60	3.692,33
2.7.3	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA-FORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR	M2	898,10	31,00	27.841,10		224,53	6.960,27
2.7.4	13.385.0170-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA COLUMBA, 2CM DE ESPESURA, COM 2 PONTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM CIMENTO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	16,80	15,77	264,93		8,40	132,46
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									14.727,93
2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS									
2.9.1	16.004.0050-A	Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	72,28	50,20	3.628,45			0,00
2.9.2	16.004.0055-A	Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	72,28	23,39	1.690,62		12,00	280,68
2.9.3	15.004.0061-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	2,00	214,94	429,88			0,00
2.9.4	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBTUIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	8,00	205,01	1.640,08		6,00	1.230,06
2.9.5	15.015.0035-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBTUIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	25,00	390,48	9.762,00		8,00	3.123,84
2.9.6	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTUIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+1,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	25,00	201,61	5.040,25		8,00	1.612,88

2.9.7	15.015.0280-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM ² , CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	20,00	221,09	4.421,80	7,00	1.547,63
2.9.8	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	4,83	338,10	18,00	86,94
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS								7.882,03
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES								
2.10.1	16.001.0050-A	MADERAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x4.1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADERAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	130,80	60,48	7.910,78	40,00	2.419,20
2.10.2	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADERAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	130,80	90,51	11.838,70	40,00	3.620,40
2.10.3	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	15,00	18,50	277,50	5,00	92,50
2.10.4	16.011.0005-A	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, inclusive maderamento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO E COLOCACAO	m2	15,00	229,87	3.448,05		0,00
2.10.5	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	179,62	74,39	13.361,93	89,00	6.620,71
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES								12.752,81
2.11 - PINTURAS								
2.11.1	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRES DEMAOIS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	47,04	11,25	529,20	11,76	132,30
2.11.2	17.017.0300-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOIS DE ACABAMENTO	M2	120,00	12,52	1.502,40	20,00	250,40
2.11.3	17.018.0080-A	Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	M2	1974,42	9,80	19.349,31	493,61	4.837,32
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS								5.220,02
2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS								
2.12.1	18.016.0030-A	BANCA DE AÇO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2"x1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.769,70	1.769,70	0,00	0,00
2.12.2	18.016.0040-A	CUBA DE AÇO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2"x1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	374,17	748,34	0,00	0,00
2.12.3	15.020.0155-A	LAMPADA LED, BULBO, A60/DY, 8W, 100/240V, BASE E-27, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	7,00	350,00	25,00	175,00
2.12.4	18.260.0065-A	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	2,71	135,50	25,00	67,75
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS								242,75
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL								44.229,83
SUBTOTAL (ARMANDO)								46.181,64

E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS								
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS			
					UNITARIO			TOTAL
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS								
1.2.1	01.050.0050-A	PROIETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.143,47	2,65	3.050,19	0,00	0,00
1.2.2	01.050.0114-A	PROIETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.143,47	8,10	9.262,10	0,00	0,00
1.2.3	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	260,27	260,27	1,00	260,27
TOTAL DO ITEM				1.2 - CANTEIRO DE OBRAS				260,27
1.3 - TRANSPORTES								
1.3.1	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJEICAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHHAO[VIDE ITEM 04.021.0010]	M2XKM	11.220,00	0,09	1.009,80	2.805,00	252,45
1.3.2	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJEICAO VERTICAL	M2	374,00	0,50	187,00	93,50	46,75
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES								299,20
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.4.1	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1",CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANGAIME OU OUTROS SUPORTE E MOVIMENTACAO[VIDE ITEM 05.008.0008]	M2	55,00	2,19	120,45	13,75	30,11
1.4.2	05.006.0001-B	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJEICAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	748,00	4,68	3.500,64	187,00	875,16
1.4.3	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	4,33	1.619,42	93,50	404,85
1.4.4	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	0,35	130,90	93,50	32,72
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								1.342,84
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES								1.902,91
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL								
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
2.4.1	05.001.0023-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUBOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	4,10	55,50	227,55	4,10	227,55
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								227,55
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS								
2.6.1	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	2,00	1.537,79	3.075,58	1,00	1.537,79

2.6.2	12.003.0095-A	ALVENARIA DE TUILOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TUILOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZIO, 20CM	M2	9,00	61,58	554,22		9,00	554,22
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									2.092,01
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									
2.7.1	13.001.0015-A	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3	M2	602,59	19,97	12.033,72		200,86	4.011,24
2.7.2	13.030.0290-0	Revestimento de paredes com cerâmica, com medidas em torno de (32x57)cm, assente conforme item 13.025.0016	M2	214,52	77,57	16.640,31		214,52	16.640,31
2.7.3	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFIORO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR	M2	129,71	31,00	4.021,01		70,00	2.170,00
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									22.821,55
2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS									
2.9.1	16.004.0050-A	Caixa de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	34,18	50,20	1.715,83		0,00	0,00
2.9.2	16.004.0055-A	Condutor para caixa de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	34,18	23,39	799,47		0,00	0,00
2.9.3	15.004.0061-A	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FIA COM 2 CUBAS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXÕES	UN	1,00	214,94	214,94		0,00	0,00
2.9.4	15.015.0020-A	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUZ, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	8,00	205,01	1.640,08		6,00	1.230,06
2.9.5	15.015.0280-A	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	253,94	2.539,40		10,00	2.539,40
2.9.6	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	65,00	4,83	313,95		35,00	169,05
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS									3.998,51
2.11 - PINTURAS/PORTAS/JANELAS									
2.11.1	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRÊS DEMACOS DE ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	92,08	11,25	585,90		26,00	292,50
2.11.2	14.002.0105-A	Bâscula de ferro de 0,50 x 0,30m em cantoneira de 3/4" x 1/8", com uma bêsula em cantoneira de 5/8" x 1/8", com alavanca de comando com punho cromado. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	324,52	649,04		2,00	649,04
2.11.3	14.002.0113-0	Janela com 4 módulos de basculantes de ferro, dispostos horizontalmente, enquadros em estrutura de madeira de lei, sendo os módulos formados por elementos de 75 x 150cm, com 8 bêsulas, em caixilhos de cantoneira de 7/8" x 1/8", bêsulas de 3/4" x 1/2" e fixados em quadros de madeira de lei com 5 x 10cm de seção, exclusive peitoril. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	646,68	1.293,36		0,00	0,00
2.11.4	17.017.0300-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMACO DE TINTA ANTIOXÍD E DUAS DEMACOS DE ACABAMENTO	M2	120,00	12,52	1.502,40		0,00	0,00
2.11.5	17.018.0080-0	Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	M2	3012,96	10,47	31.545,69		1.004,32	10.515,23
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS/PORTAS/JANELAS									11.456,77
2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS									
2.12.1	18.002.0090-A	Vaso sanitário de louça branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO	UN	2,00	339,37	678,74		0,00	0,00
2.12.2	15.004.0105-A	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à casa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões	UN	2,00	233,32	466,64		0,00	0,00
2.12.3	15.004.0063-A	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm e conexões	UN	2,00	118,18	236,36		0,00	0,00
2.12.4	18.002.0014-A	Idem item 18.002.0013, inclusive sifão em PVC flexível, válvula de escoamento cromada, rabicho em PVC, torneira de fechamento automático de parede, ativada por meio de 85mm, para lavatório e acessórios de fixação	UN	2,00	341,26	682,52		0,00	0,00
2.12.5	18.016.0030-A	BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 2.000X550MM, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2"X1.1/2", SOBRE APOIO DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1.769,63	1.769,63		0,00	0,00
2.12.6	18.016.0040-A	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2"X1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	416,29	832,58		0,00	0,00
2.12.7	15.020.0135-A	LAMPADA LED, BULBO, 60/0Y, 8W, 100/240V, BASE E-27, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00	7,00	350,00		50,00	350,00
2.12.8	18.260.0063-A	SUPOORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00	2,71	135,50		50,00	135,50
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS									485,50
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO E ACRESCIMO NO PRÉDIO PRINCIPAL									41.021,89
SUBTOTAL									42.924,34

1.3.1	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHADOR (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	0,09	1.009,80		2.805,00	252,45
1.3.2	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHADOR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	374,00	0,50	187,00		93,50	46,75
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES									299,20
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.4.1	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 18, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	2,19	120,45		13,75	30,11
1.4.2	05.006.0001-B	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	748,00	4,68	3.500,64		187,00	875,16
1.4.3	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	4,33	1.619,42		93,50	404,85
1.4.4	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	0,35	130,90		93,50	32,72
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									1.342,84
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									1.902,32
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO E ACRESCIMO NO PRÉDIO PRINCIPAL									
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									
2.7.1	13.001.0015-A	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3	M2	534,61	19,97	10.676,16		133,65	2.669,04
2.7.2	17.040.0022-0	Repintura de quadra sobre demarcação existente conforme o item 17.040.0021	M2	360,00	23,82	8.575,20		0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									2.669,04
2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS									
2.9.1	15.015.0020-A	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	205,01	2.050,10		0,00	0,00
	15.015.0035-A	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	390,48	3.904,80		0,00	0,00
2.9.3	15.015.0250-A	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	201,61	2.016,10		0,00	0,00
2.9.4	15.015.0280-A	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	221,09	2.210,90		0,00	0,00
2.9.5	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	40,00	4,83	193,20		0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS									0,00
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES									
2.10.1	16.011.0050-A	Cobertura translúcida, cristal, branca leitosa ou cores básicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, com aditivo estabilizante contra degradação dos raios U.V., estruturada com vau interno de poliéster, espessura de 1,5mm, para uso onde se requer iluminação natural controlada e privilegia-se a resistência à luz difratada, larguras úteis entre 990mm e 1020mm, comprimento até 6,00m, inclusive os acessórios para fixação. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M2	130,17	65,83	8.569,09		130,17	8.569,09
2.10.2	16.007.0023-A	Cumeeira em chapa de aço galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	30,00	41,10	1.233,00		30,00	1.233,00
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES									9.802,09
2.11 - PINTURAS									
2.11.1	17.017.0375-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRÊS DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOIS LIXAMENTO SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	47,04	11,25	529,20		23,52	264,60
2.11.2	17.017.0300-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE TINTA ANTIOXÍD E DUAS DEMÃO DE ACABAMENTO	M2	120,00	12,52	1.502,40		90,00	1.126,80
2.11.3	17.018.0080-0	Pinura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demões de acabamento	M2	2673,06	10,68	28.548,28		1.300,00	13.884,00
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS									15.275,40
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO E ACRESCIMO NO PRÉDIO PRINCIPAL									27.746,53
SUBTOTAL (CESAR)									29.648,84
TOTAL									
B.D.I.									118.704,68
TOTAL GERAL									24.607,48
									143.312,16

BOLETIM DIÁRIO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/RJ
CNPJ N.º: 28.561.041/0001-95



Obra: Serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de REFORMA DOS PRÉDIOS, E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS, situada na Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo, 1º Distrito- BJ, E. Mz. CÉSAR MONTEIRO, situada na Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim e E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS, situada na Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo, 1º Distrito de Bom Jardim.

Processo administrativo nº 0738/2021.

Tomada de Preços nº 001/2021, 26 de abril de 2021.

Contrato nº 051/2021, 27 de maio de 2021.

Unidade orçamentária:

Cód. Despesa: 4490.51.00

Programa de Trabalho n.º 0602.1236010501.014

Valor do contrato: R\$ 426.965,92 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Prazo inicial: 120 (cento e vinte) dias

Data de início: 07 de junho de 2021.

Data da conclusão: 07 de outubro de 2021

Fiscalização: Engenheiro civil Hudson Rodrigues de Souza – Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada: **SERD SERV SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

Endereço: Av. Walter Vendas Rodrigues, n.º 18, Nova Mundo, Bom jardim/RJ – CEP: 28660-000.

CNPJ: 11.836.428/0001-95

Responsável técnico: VERGILIO LOPES DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA n.º: 1996120879

ART nº: 2020210110794

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 14 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	1
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
14/06/2021	Instalação da placa de identificação da obra;
	Início da pintura do segurando pavimento;
	Chegada do material para pintura;
	Início Manutenção da calha do telhado.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.
Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 15 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Amador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
15/06/2021	Retirada das telhas translúcidas da cobertura;
	Início do lixamento das paredes do segundo pavimento;
	Retirada dos exaustores;
	Continuação da manutenção da calha do telhado.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 16 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Amador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
16/06/2021	Instalação das telhas translúcida;
	Pintura de ferrugem da cobertura com tinta óleo branca;
	Retirada dos extintores de incêndio;
	Emboço e aplicação de massa corrida no 2º pavimento;
	Continuação da manutenção da calha do telhado.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CESAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 17 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	1	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão MuncK	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
17/06/2021	Continuação da instalação das telhas translúcidas;
	Emboço e aplicação de massa corrida no 2º pavimento;
	Pintura e aplicação de massa corrida no teto dos banheiros do 2º pavimento.
	Continuação da manutenção da calha do telhado.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 18 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
18/06/2021	Continuação da instalação das telhas translúcidas;
	Emboço e aplicação de massa corrida no 2º pavimento;
	Pintura e aplicação de massa corrida no teto dos banheiros do 2º pavimento;
	Continuação da manutenção da calha do telhado.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 21 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
21/06/2021	Continuação da instalação das telhas translúcida;
	Emboço e aplicação de massa corrida no 2º pavimento;
	Pintura e aplicação de massa corrida no teto dos banheiros do 2º pavimento;
	Lixamento e pintura das grades de proteção da rampa de acessibilidade.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 22 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Amador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
22/06/2021	Continuação da instalação das telhas translúcida;
	Lixamento e pintura das grades de proteção da rampa de acessibilidade;
	Emboço e aplicação de massa corrida no 2º pavimento;
	Pintura das salas do 2º pavimento.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 23 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
23/06/2021	Emboço e aplicação de massa corrida no 2º pavimento;
	Pintura das salas do 2º pavimento;
	Lixamento e pintura das grades de proteção da rampa de acessibilidade.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 24 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
24/06/2021	Pintura das salas do 2º pavimento.			
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;			
	Lixamento e pintura das grades de proteção da rampa de acessibilidade.			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.
Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 25 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
25/06/2021	Pintura das salas do 2º pavimento.
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento.
	Lixamento e pintura das grades de proteção da rampa de acessibilidade.
	Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 28 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
28/06/2021	Pintura das salas do 2º pavimento.
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento.
	Emboço e aplicação de massa na faixa externa e fundos da escola.
	Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO
VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
29/06/2021	Pintura das salas do 2º pavimento.
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento.
	Emboço e aplicação de massa na faixa externa e fundos da escola.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 30 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
30/06/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;
	Emboço e aplicação de massa na faixa externa e fundos da escola.
	Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 01 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apolo	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
01/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;			
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;			
	Emboço e aplicação de massa na faixa externa e fundos da escola.			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 02 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
02/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;			
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;			
	Emboço e aplicação de massa na faixa externa e fundos da escola.			
<table border="1"><tr><td>Continuação/Verso</td><td>SIM</td><td>NÃO</td></tr></table>		Continuação/Verso	SIM	NÃO
Continuação/Verso	SIM	NÃO		

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 05 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
05/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;
	Lixamento e pintura com tinta a base de óleo nos portais do 2º pavimento e madeiras das salas de aula.
Continuação/Verso	
SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 06 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
06/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;
	Lixamento e pintura com tinta a base de óleo nos portais do 2º pavimento e madeiras das salas de aula.
Continuação/Verso	
SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 07 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Amador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
07/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;
	Continuação da colocação de manta no telhado;
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;
	Lixamento e pintura com tinta a base de óleo nos portais do 2º pavimento e madeiras das salas de aula
Continuação/Verso	
SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 08 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
08/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;		
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;		
	Lixamento e pintura com tinta a base de óleo nos portais do 2º pavimento e madeiras das salas de aula.		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º. 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 09 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
09/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;
	Lixamento e pintura com tinta a base de óleo nos portais do 2º pavimento e madeiras das salas de aula.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 12 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:	Continuação/Verso	SIM	NÃO
12/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;			
	Pintura da área externa;			
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;			
	Lixamento e pintura do teto da cozinha.			

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 13 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
13/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;
	Continuação da pintura da área externa;
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;
	Lixamento e pintura do teto da cozinha.
Continuação/Verso	
SIM	
NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 14 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
14/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;		
	Continuação da pintura da área externa.		
	Lixamento e pintura das salas do 1º pavimento;		
	Lixamento e pintura do teto dos banheiros do 1º pavimento;		
	Lixamento e pintura da dispensa.		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 15 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
15/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;		
	Continuação da pintura da área externa;		
	Lixamento e pintura do teto dos banheiros do 1º pavimento;		
	Lixamento e pintura do corredor (área livre) do 1º pavimento;		
	Lixamento e pintura da área de serviço inclusive pintura e lixamento dos portais e portas.		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 16 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Muncie	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
16/07/2021	Pintura das salas do 2º pavimento;		
	Montagem dos andaimes;		
	Lixamento e pintura do corredor (área livre) do 1º pavimento;		
	Lixamento e pintura da área de serviço inclusive pintura e lixamento dos portais e portas.		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO		Página:			
Obra:	Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.				
Local:	Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.				
DATA: 19 DE JULHO DE 2021					
REGISTROS DA CONTRATADA					
OCORRÊNCIAS					
Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:	
Manhã	X			Nenhuma observação	
Tarde	X				
Noite	X				
Visita Técnica da Contratante		0	Falhas de serviços de terceiros		0
Consulta à Fiscalização		0	Acidentes ocorridos		0
Resposta à Fiscalização		0	Outros:		
EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)					
Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador		1	
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas		0	
Pedreiro	0	Meio-Oficial		1	
Armador	0	Servente		2	
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador		0	
Pintor	1	Bombeiro		0	
Eletricista	0	Vigia/Outros:		0	
EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)					
Caminhão basculante	0	Caminhão Munck		0	
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira		0	
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador		0	
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo		0	
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador		0	
Retroescavadeira	0	Outros:			
Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:				
19/07/2021	Continuação da pintura da área externa.				
	Continuação da pintura das salas e portas.				
		Continuação/Verso	SIM	NÃO	
Contratante - Profissional Responsável Fiscal/Matricula			Contratada - Profissional Técnico Responsável		
Hudson Rodrigues de Souza Engenheiro civil Mat. 10/6265 – SMPE			VERGILIO LOPES DE CARVALHO Engenheiro civil CREA n.º: 1996120879		

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 20 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
20/07/2021	Continuação da pintura da área externa;
	Limpeza da quadra para pintura.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 21 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
21/07/2021	Continuação da pintura da área externa;		
	Limpeza da quadra para pintura;		
	Pintura do mastro;		
	Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

BOLETIM DIÁRIO DE OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/RJ
CNPJ N.º: 28.561.041/0001-95

Obra: Serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de REFORMA DOS PRÉDIOS, E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS, situada na Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo, 1º Distrito- BJ, E. Mz. CÉSAR MONTEIRO, situada na Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim e E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS, situada na Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo, 1º Distrito de Bom Jardim.

Processo administrativo nº 0738/2021.

Tomada de Preços nº 001/2021, 26 de abril de 2021.

Contrato nº 051/2021, 27 de maio de 2021.

Unidade orçamentária:

Cód. Despesa: 4490.51.00

Programa de Trabalho n.º 0602.1236010501.014

Valor do contrato: R\$ 426.965,92 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Prazo inicial: 120 (cento e vinte) dias

Data de início: 07 de junho de 2021.

Data da conclusão: 07 de outubro de 2021

Fiscalização: Engenheiro civil Hudson Rodrigues de Souza – Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada: **SERD SERV SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

Endereço: Av. Walter Vendas Rodrigues, n.º 18, Nova Mundo, Bom jardim/RJ – CEP: 28660-000.

CNPJ: 11.836.428/0001-95

Responsável técnico: VERGILIO LOPES DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA n.º: 1996120879

ART nº: 2020210110794

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- B.J.

DATA: 07 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	1
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retro-escavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
07/06/2021	Montagem de andaime
	Retirada de entulho
	Retirada do forro do corredor do segundo pavimento
	Início da retirada dos emboços do segundo pavimento
Continuação/Verso	
SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável:
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 08 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã		X		Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite		X		

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	1
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
08/06/2021	Retirada de forro de pvc
	Retirada de telhas coloniais
	Início da retirada do madeiramento do telhado
	Retirada de reboco
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 09 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	1
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
09/06/2021	Início da retirada do madeiramento do telhado			
	Escoramento do telhado com estruturas metálicas			
	Retirada de antena parabólica desativada			
	Montagem de andaime			
	Retirada de forro de pvc			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 10 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde		X		
Noite	X			

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde		X		
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	1
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências
10/06/2021	Continuação da substituição do madeiramento do telhado e telhas
	Início Manutenção da calha do telhado
	Movimentação de andaime
Continuação/Verso	
SIM	
NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 11 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	1
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
11/06/2021	Continuação da substituição do madeiramento do telhado e telhas			
	Continuação do reparo da calha do telhado			
	Movimentação de andaime			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 14 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	2
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
14/06/2021	Instalação da placa de identificação da obra
	Continuação do reparo do telhado
	Início da instalação do forro do segundo pavimento
	Reparo da rede elétrica
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO	Página:
---------------------------------	---------

Obra:	Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.
Local:	Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 15 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	


EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
15/06/2021	Continuação da instalação do forro de PVC		
	Retirada do reboco da parede		
	Emboço das paredes danificadas do 2º pavimento		
	Continuação do reparo da rede elétrica		
		Continuação/Verso	NÃO

Contratante - Profissional Responsável Fiscal/Matricula Hudson Rodrigues de Souza Engenheiro civil Mat. 10/6265 – SMPE	Contratada - Profissional Técnico Responsável  VERGILIO LOPES DE CARVALHO Engenheiro civil CREA n.º: 1996120879
--	---

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 16 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
16/06/2021	Continuação da instalação do forro de PVC			
	Troca do madeiramento do beiral			
	Reparo com massa acrílica no 2º pavimento			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

Contratante - Profissional Responsável Fiscal/Matricula Hudson Rodrigues de Souza Engenheiro civil Mat. 10/6265 – SMPE	Contratada - Profissional Técnico Responsável  VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO Engenheiro civil CREA n.º: 1996120879
--	---

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 18 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:				
18/06/2021	Continuação da substituição das madeiras do telhado;				
	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;				
	Continuação da instalação das seleiras de granito no 2º pavimento;				
	Retirada dos toldos da parte externa.				
			Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 21 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:				
21/06/2021	Emboço do 2º piso;				
	Lixamento e pintura das ferragens do 2º piso;				
	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;				
	Continuação da substituição das madeiras do telhado.				
			Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 22 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão MuncK	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
22/06/2021	Impermeabilização da calha do telhado;
	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;
	Emboço, lixamento e pintura do teto do banheiro 2º pavimento;
	Continuação da substituição das madeiras do telhado.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 23 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
23/06/2021	Impermeabilização da calha do telhado;			
	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;			
	Emboço, lixamento e pintura do teto do banheiro 2º pavimento;			
	Instalação elétrica refeita;			
	Continuação da substituição das madeiras do telhado.			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- B.J.

DATA: 24 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo Bom Chuvoso Impróprio Observações a previsão do tempo na semana:

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
24/06/2021	Impermeabilização da calha do telhado;		
	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;		
	Substituição de plafonier e lâmpadas do 2º pavimento;		
	Continuação da substituição das madeiras do telhado.		
	Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º. 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra:	Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.
Local:	Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 25 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	


EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão MuncK	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
25/06/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;		
	Continuação da substituição das madeiras do telhado;		
	Substituição de plafonier e lâmpadas do 2º pavimento.		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável Fiscal/Matricula Hudson Rodrigues de Souza Engenheiro civil Mat. 10/6265 - SMPE	Contratada - Profissional Técnico Responsável  VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO Engenheiro civil CREA n.º 1996120879
--	--

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 28 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
28/06/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;
	Envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;
	Pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;
	Continuação da substituição das madeiras do telhado.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	


EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
29/06/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;		
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;		
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;		
	Lixamento e pintura do corrimão com tinta óleo;		
	Continuação da substituição das madeiras do telhado.		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 30 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
30/06/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;		
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;		
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;		
	Emboço do corredor de acesso para o 2º piso incluindo o teto;		
	Continuação da substituição das madeiras do telhado.		
	Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


 VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
 Engenheiro civil
 CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 01 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo Bom Chuvoso Impróprio Observações a previsão do tempo na semana:

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
01/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;		
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;		
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;		
	Continuação do emboço do corredor de acesso para o 2º piso incluindo o teto;		
	Continuação da substituição das madeiras do telhado.		
		Continuação/Verso	SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 02 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
02/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;		
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;		
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;		
	Continuação do emboço do corredor de acesso para o 2º piso incluindo o teto;		
	Continuação da substituição das madeiras do telhado.		
	Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 05 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			



Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
05/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;			
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;			
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;			
	Continuação do emboço do corredor de acesso para o 2º piso incluindo o teto.			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 06 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
06/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;
	Continuação da pintura e fixamento das portas das salas com tinta óleo;
	Substituição de telhas francesas e coloniais.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 07 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	2
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
07/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;
	Continuação da substituição de telhas francesas e coloniais.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 08 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
08/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;
	Continuação da substituição de telhas francesas e coloniais.
	Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 09 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	2
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências;			
09/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;			
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;			
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;			
	Continuação da substituição de telhas francesas e coloniais.			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 12 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	2
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
12/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;			
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;			
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;			
	Continuação da substituição de telhas francesas e coloniais;			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Carliello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 13 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Amador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	2
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
13/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;
	Continuação do envernizamento das madeiras e rodapés das salas de aula e corredores;
	Continuação da pintura e lixamento das portas das salas com tinta óleo;
	Pintura das janelas.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

Página:

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ

REGISTROS DA CONTRATADA

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana
-------	-----	---------	-----------	---

Nenhuma observação

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Melo-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros	

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
14/07/2021	Continuação da pintura das salas do 2º pavimento;			
	Lixamento da parede da passarela;			
	Continuação da pintura das janelas.			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

CREA n.° 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 15 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Faixas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
15/07/2021	Pintura da passarela;
	Reparo da parede da cozinha para pintura;
	Manutenção da parte elétrica.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.
Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 16 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	2
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
16/07/2021	Continuação da pintura;
	Continuação do reparo das paredes da cozinha.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 17 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	2
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

17/07/2021

Colocação de azulejos;

Colocação de portal.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 19 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante

0

Falhas de serviços de terceiros

0

Consulta à Fiscalização

0

Acidentes ocorridos

0

Resposta à Fiscalização

0

Outros:

0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:

Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

19/07/2021

Continuação da colocação de azulejos;

Emboço nas paredes.

Continuação/Verso

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.
Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 20 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	2
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
20/07/2021	Continuação da colocação de azulejos;
	Continuação do emboço nas paredes;
	Pintura das salas do 1º andar.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 21 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Faixas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
21/07/2021	Continuação da colocação de azulejos;
	Continuação do emboço nas paredes;
	Pintura das salas do 1º andar.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

BOLETIM DIÁRIO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/RJ
CNPJ N.º: 28.561.041/0001-95



Obra: Serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de REFORMA DOS PRÉDIOS, E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS, situada na Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo, 1º Distrito- BJ, E. Mz. CÉSAR MONTEIRO, situada na Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim e E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS, situada na Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo, 1º Distrito de Bom Jardim.

Processo administrativo nº 0738/2021.
Tomada de Preços nº 001/2021, 26 de abril de 2021.
Contrato nº 051/2021, 27 de maio de 2021.

Unidade orçamentária:

Cód. Despesa: 4490.51.00

Programa de Trabalho n.º 0602.1236010501.014

Valor do contrato: R\$ 426.965,92 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Prazo inicial: 120 (cento e vinte) dias

Data de início: 07 de junho de 2021.

Data da conclusão: 07 de outubro de 2021

Fiscalização: Engenheiro civil Hudson Rodrigues de Souza – Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada: **SERD SERV SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

Endereço: Av. Walter Vendas Rodrigues, n.º 18, Nova Mundo, Bom jardim/RJ – CEP: 28660-000.

CNPJ: 11.836.428/0001-95

Responsável técnico: VERGILIO LOPES DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA n.º: 1996120879

ART nº: 2020210110794

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 07 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	1	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	2	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	2	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motonistas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	4
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0


Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
07/06/2021	Demolição da parede do refeitório
	Retirada do entulho
	Montagem de andaime
	Demolição da alvenaria da cantina para dar início a construção dos banheiros de acessibilidade

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879



DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 08 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã		X		Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite		X		

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	1	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	4
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
08/06/2021	Escavação para instalação da rede de esgoto dos banheiros de acessibilidade;		
	Instalação da rede de esgoto		
	Compactação do solo		
	Retirada do basculante da cantina		
	Início da alvenaria dos banheiros de acessibilidade		
	Demolição do rodapé e dos quadros do refeitório		
	Demolição de alvenaria para instalação de uma janela 1,00 x 1,00 no depósito de material de limpeza		
	Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 09 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
09/06/2021	Retirada do reboco da fachada lateral
	Alvenaria do banheiro de acessibilidade
	Retirada do forro de madeira do banheiro de acessibilidade
	Manutenção da parte elétrica, com retirada de ventilador de teto, troca de plafonier e lâmpadas
	Chegada do material para revestimento do refeitório
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879



DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 10 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde		X		
Noite	X			

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde		X		
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
10/06/2021	Retirada do reboco das paredes internas		
	Alvenaria do banheiro de acessibilidade		
	Início da instalação revestimento do refeitório		
	Continuação da manutenção da parte elétrica, com retirada de ventilador de teto, troca de plafonier e lâmpadas		
	Retirada de entulho		
		Continuação/Verso	SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 11 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
11/06/2021	Continuação da retirada do reboco das paredes internas
	Instalação da rede de água
	Emboço do banheiro de acessibilidade
	Continuação da instalação revestimento do refeitório
	Continuação da manutenção da parte elétrica, com retirada de ventilador de teto, troca de plafonier e lâmpadas
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 14 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
14/06/2021	Instalação da placa de identificação da obra;		
	Início da pintura das salas do segundo pavimento		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 15 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	


EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
15/06/2021	Continuação da pintura das salas do segundo pavimento		
	Início da pintura do corredor do segundo pavimento		
	Início do emboço dos dois banheiros da antiga cantina		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 16 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
16/06/2021	Continuação da pintura das salas e banheiro do segundo pavimento
	Continuação da pintura do corredor do segundo pavimento
	Continuação da colocação de piso na parede do refeitório
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 17 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	1	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	


EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
17/06/2021	Continuação da pintura das salas e banheiro do segundo pavimento		
	Continuação da colocação de piso na parede do refeitório		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 18 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
18/06/2021	Continuação da pintura das salas e banheiro no segundo pavimento
	Continuação da colocação de piso nas paredes do refeitório
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 21 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências
21/06/2021	Continuação da pintura das salas no segundo pavimento
	Continuação da colocação de piso nas paredes do refeitório

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 22 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
22/06/2021	Continuação da pintura das salas e banheiro
	Início da colocação de piso no banheiro

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de Incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 23 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
23/06/2021	Continuação da pintura das salas e corredor
	Continuação da colocação de piso no banheiro
Continuação/Verso	
SIM	
NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 24 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana.
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Amador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
24/06/2021	Continuação da pintura das salas e corredor		
	Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 25 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
25/06/2021	Continuação da pintura das salas e corredor
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 28 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
28/06/2021	Continuação da pintura das salas e corredor
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
29/06/2021	Continuação da pintura das salas e corredor
	Continuação da colocação de piso no banheiro
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 30 DE JUNHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
30/06/2021	Continuação da pintura das salas e corredor			
	Continuação da colocação de piso no banheiro			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO				Página								
Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.												
Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.												
DATA: 01 DE JULHO DE 2021												
REGISTROS DA CONTRATADA												
OCORRÊNCIAS												
Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:								
Manhã	X			Nenhuma observação								
Tarde	X											
Noite	X											
Visita Técnica da Contratante		1	Falhas de serviços de terceiros		0							
Consulta à Fiscalização		0	Acidentes ocorridos		0							
Resposta à Fiscalização		0	Outros:									
EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)												
Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador		0								
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas		0								
Pedreiro	1	Meio-Oficial		0								
Armador	0	Servente		3								
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador		0								
Pintor	0	Bombeiro		0								
Eletricista	0	Vigia/Outros:										
EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)												
Caminhão basculante	1	Caminhão Munck		0								
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira		0								
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador		0								
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho		0								
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador		0								
Retroescavadeira	0	Outros:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Data:</td> <td style="width: 85%;">Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">01/07/2021</td> <td>Continuação da pintura das salas e corredor</td> </tr> <tr> <td>Continuação da colocação de piso no banheiro</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>						Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:	01/07/2021	Continuação da pintura das salas e corredor	Continuação da colocação de piso no banheiro		
Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:											
01/07/2021	Continuação da pintura das salas e corredor											
	Continuação da colocação de piso no banheiro											
				Continuação/Verso	SIM							
				NÃO								
Contratante - Profissional Responsável Fiscal/Matricula Hudson Rodrigues de Souza Engenheiro civil Mat. 10/6265 – SMPE			Contratada - Profissional Técnico Responsável  VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO Engenheiro civil CREA n.º: 1996120879									

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 02 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
02/07/2021	Continuação da pintura das salas e corredor
	Continuação da colocação de piso no banheiro
Continuação/Verso	
SIM	
NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.
Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 05 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	3
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
05/07/2021	Continuação da colocação de piso no banheiro; Continuação da colocação de piso no refeitório; Emboço e pintura da cozinha; Pintura do teto e escada do corredor.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 06 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
06/07/2021	Continuação da Pintura
	Continuação da colocação de piso

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 07 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Melo-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	


EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
07/07/2021	Continuação da Pintura
	Continuação da colocação de piso
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 08 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
08/07/2021	Continuação da Pintura
	Continuação da colocação de piso
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 09 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
09/07/2021	Colocação de forro no banheiro
	Continuação da pintura das salas
	Rejunte da parede da cozinha e banheiro
Continuação/Verso	
SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 12 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
12/07/2021	Continuação do rejunte da parede da cozinha;
	Continuação da pintura e massa corrida nas paredes.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 13 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)


Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
13/07/2021	Rejunte dos banheiros
	Selador nas paredes da área externa
	Reboco nas janelas
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º. 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 14 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	1	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
14/07/2021	Continuação do rejunte dos banheiros
	Continuação da colocação de selador nas paredes da área externa
	Conserto do telhado do banheiro
	Colocação de tomadas
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável


VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 15 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	0
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	3
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
15/07/2021	Continuação do rejunte;
	Continuação da pintura;
	Início da colocação de madeiras no forro.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 16 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	0

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	0

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
16/07/2021	Continuação da pintura;
	Continuação da colocação de madeiras no forro.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 19 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Amador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
19/07/2021	Colocação de ferro;
	Continuação da pintura das portas e salas.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 20 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
20/07/2021	Continuação da colocação de ferro;
	Continuação da pintura das salas;
	Continuação da colocação de piso;
	Finalização da reforma do refeitório.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 21 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
21/07/2021	Continuação da pintura das salas;
	Continuação da colocação de piso;
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

07 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



08 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



09 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



10 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

11 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

14 DE JUNHO DE 2021.






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

15 DE JUNHO DE 2021.



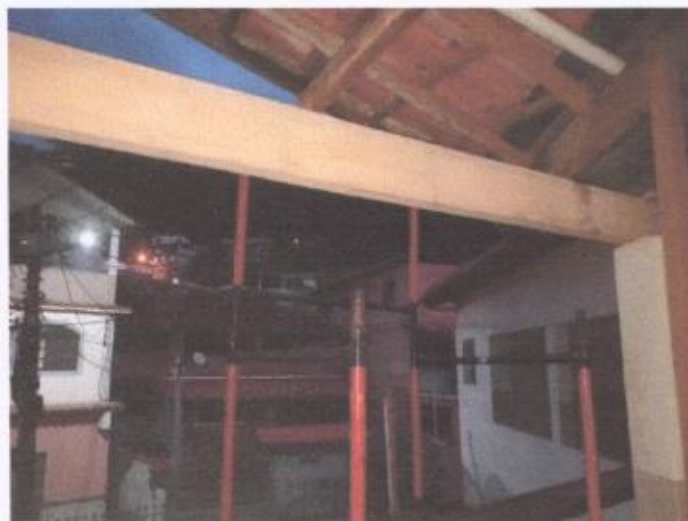

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

16 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

17 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

18 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

21 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

22 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

23 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

24 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

25 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

28 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

29 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

30 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**


01 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

02 DE JULHO DE 2021.



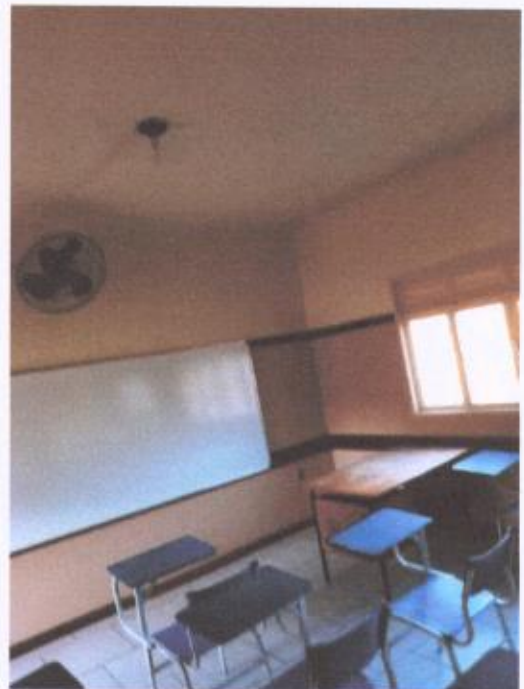

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

05 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



06 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

07 DE JULHO DE 2021.





164
RUBRICA

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

08 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

09 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



12 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



13 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

14 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



15 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



16 DE JULHO DE 2021.

Serd Serv



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



17 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

19 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**



20 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

21 DE JULHO DE 2021.







**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**




14 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

15 DE JUNHO DE 2021.



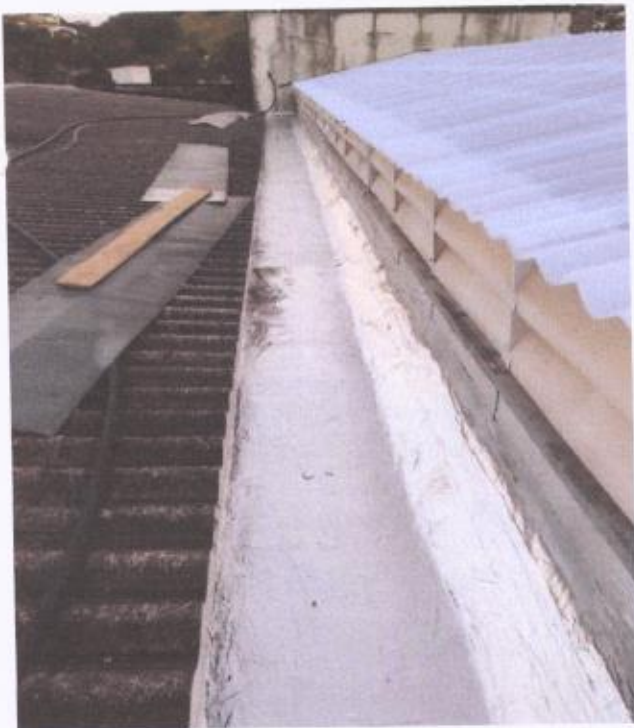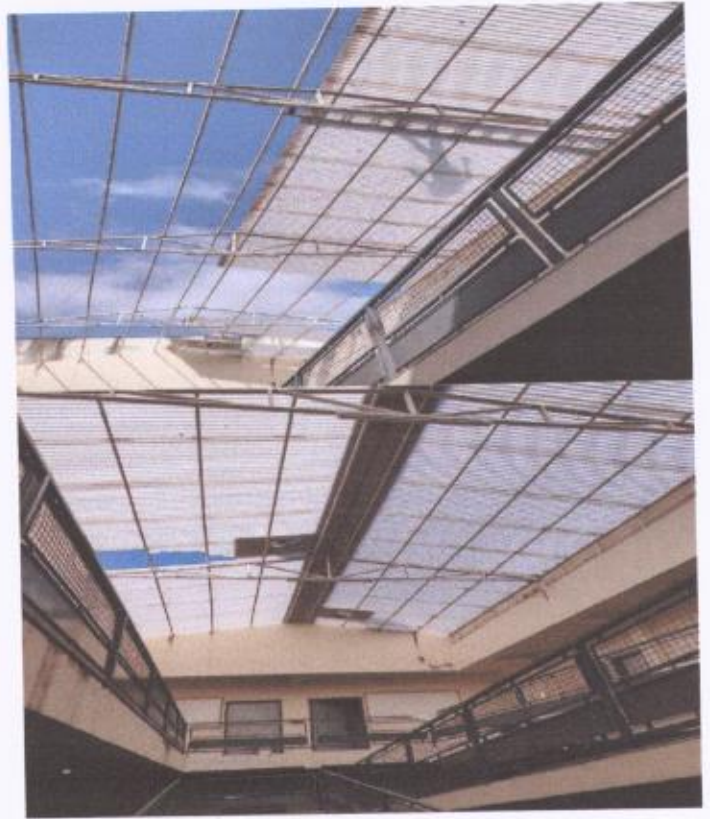

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

16 DE JUNHO DE 2021.






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

17 DE JUNHO DE 2021.



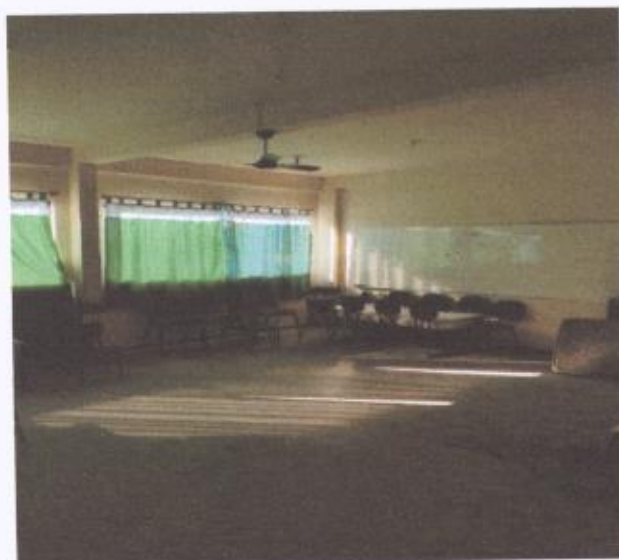

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

18 DE JUNHO DE 2021.



Serd Serv


Prestação de Serviços



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

21 DE JUNHO DE 2021.



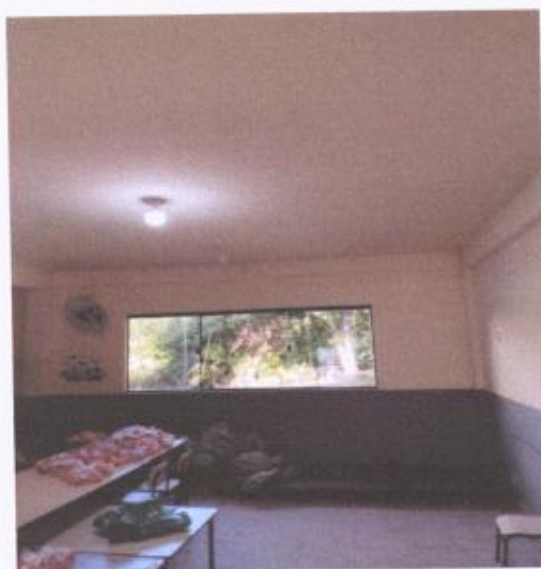

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

22 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

23 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

24 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

25 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

28 DE JUNHO DE 2021.







FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

29 DE JUNHO DE 2021.







**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

30 DE JUNHO DE 2021.



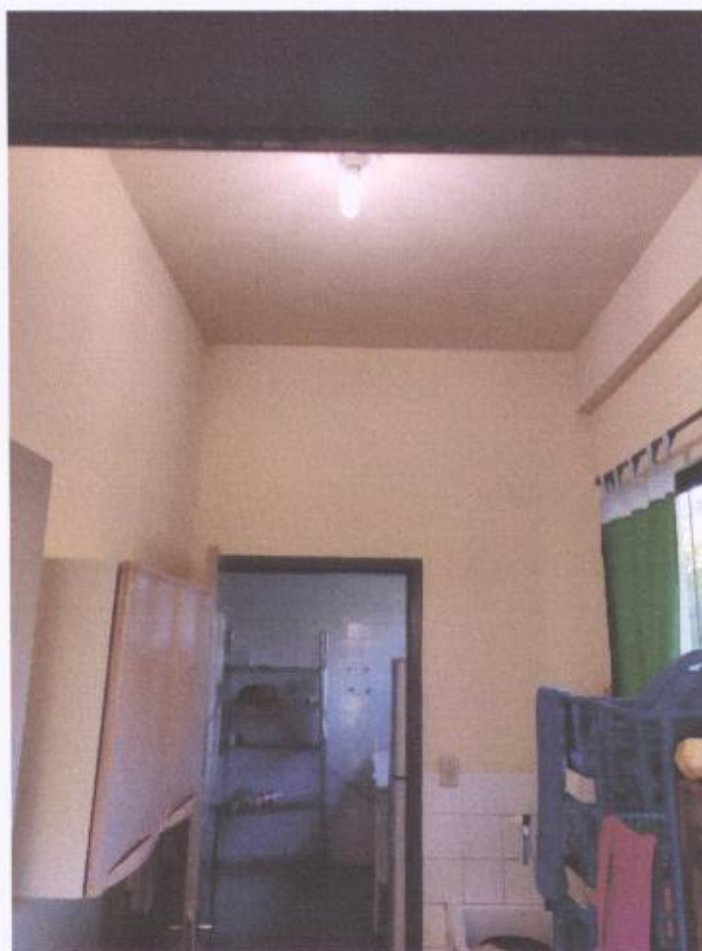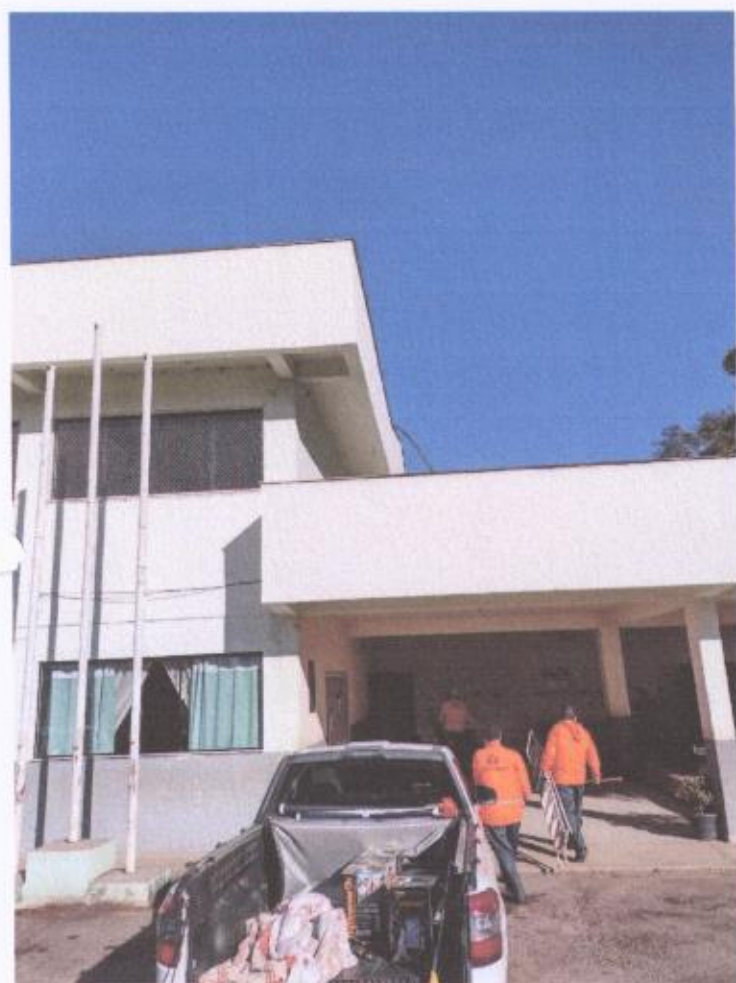



FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

01 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**



02 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

05 DE JULHO DE 2021.





PRE 10.00 218
08/8
RUBRICA

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

06 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

07 DE JULHO DE 2021.



Serd Serv



Prestação de Serviços



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

08 DE JULHO DE 2021.



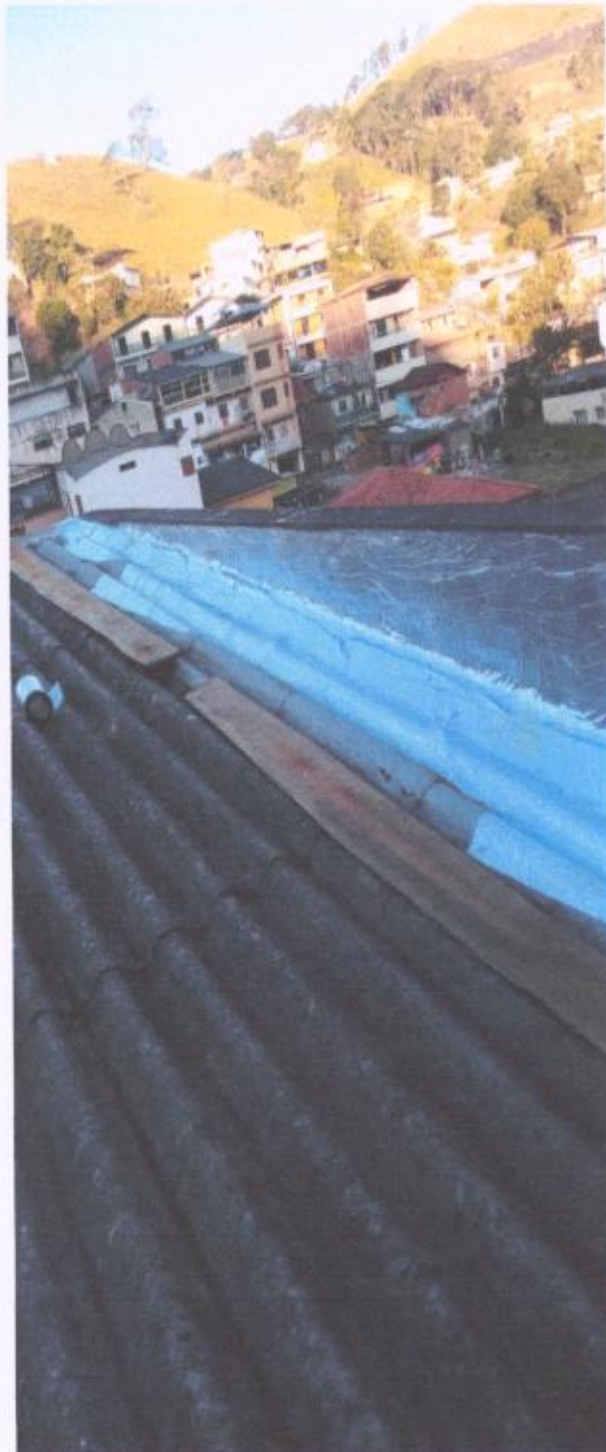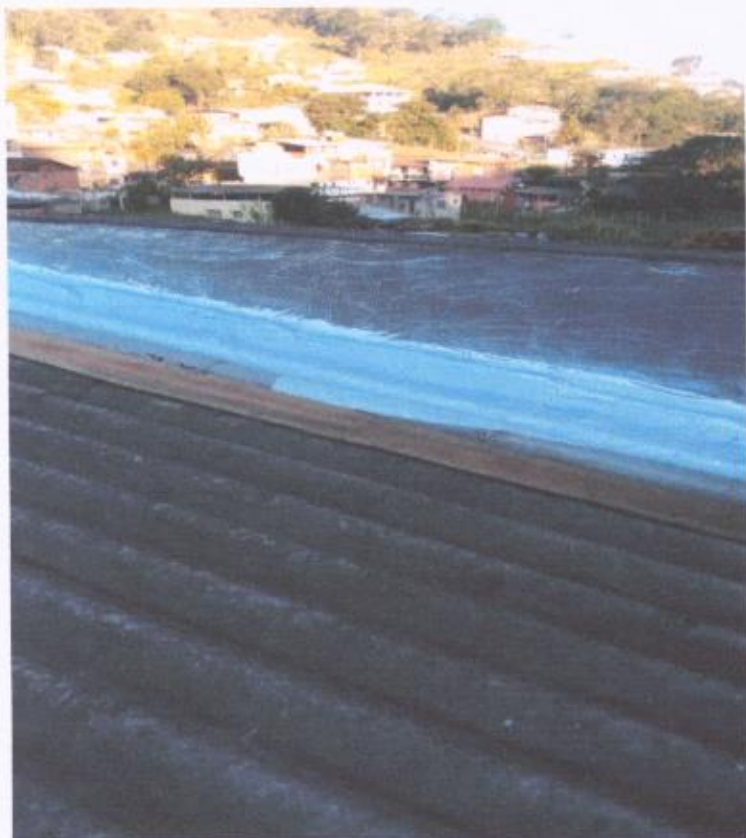

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

09 DE JULHO DE 2021.







FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

12 DE JULHO DE 2021.






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

13 DE JULHO DE 2021.



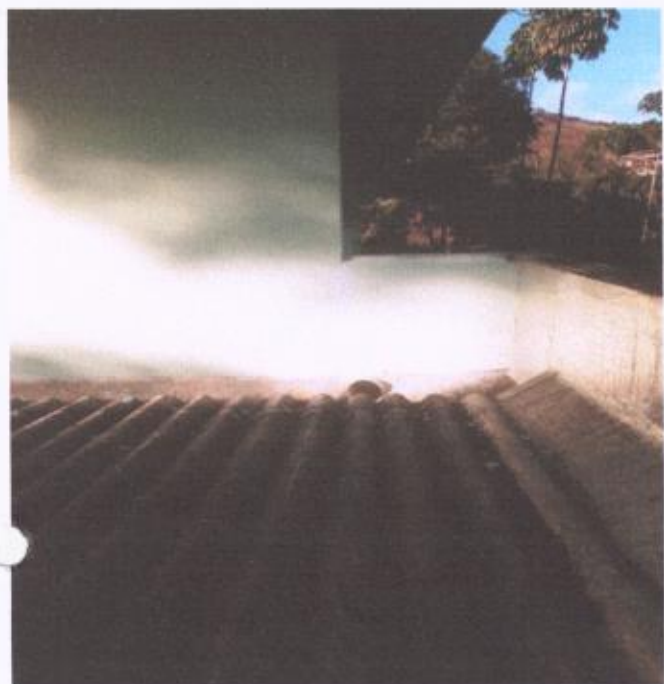

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

14 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

15 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

16 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

20 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

21 DE JULHO DE 2021.








**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

07 DE JUNHO DE 2021.





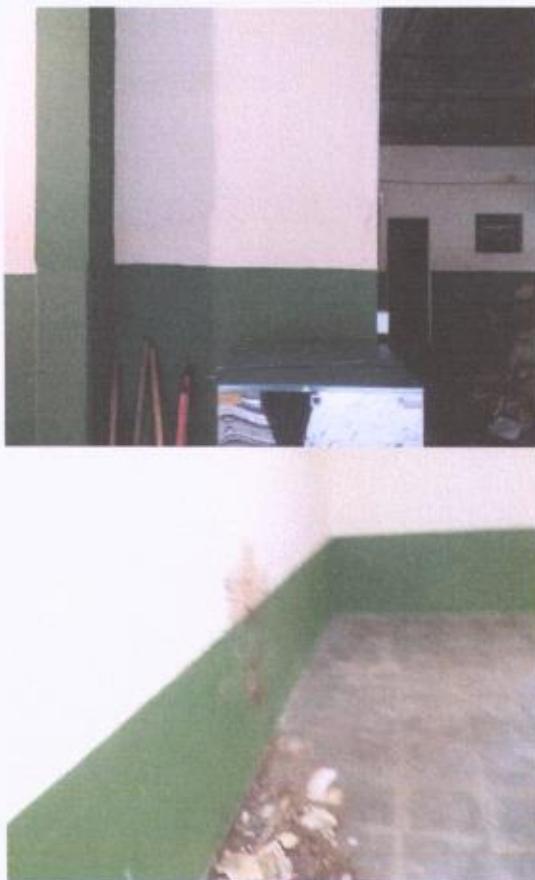



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



08 DE JUNHO DE 2021.






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



09 DE JUNHO DE 2021.





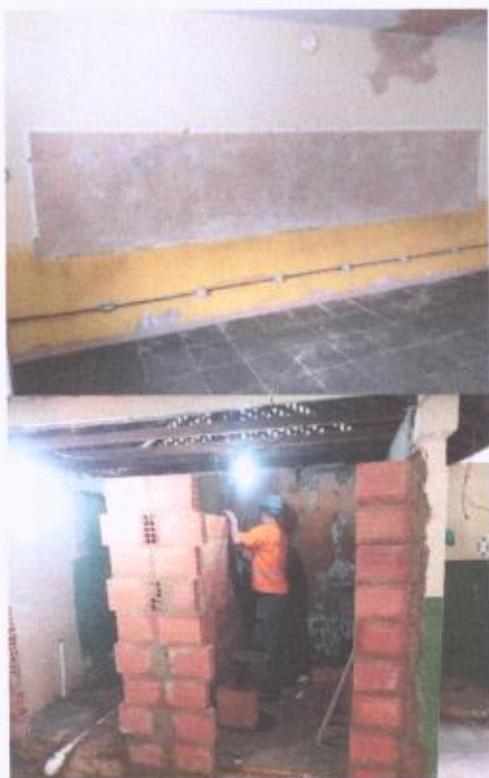


**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



10 DE JUNHO DE 2021.



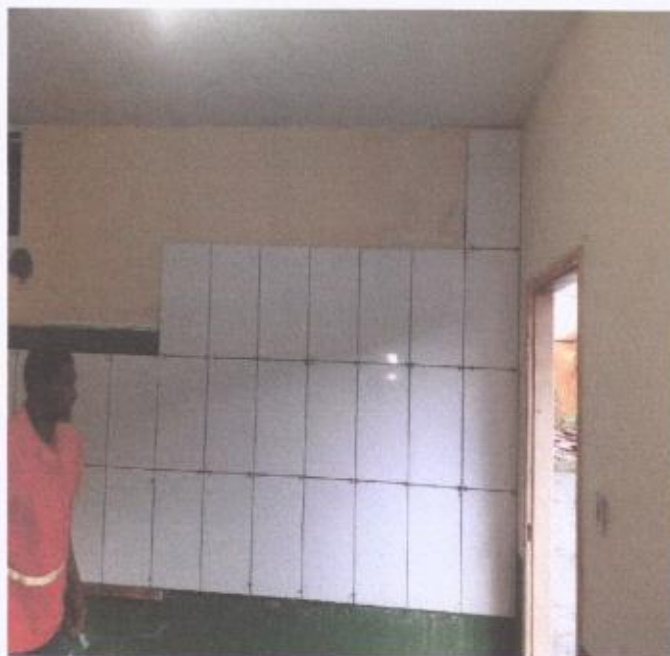

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



11 DE JUNHO DE 2021.






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

14 DE JUNHO DE 2021.



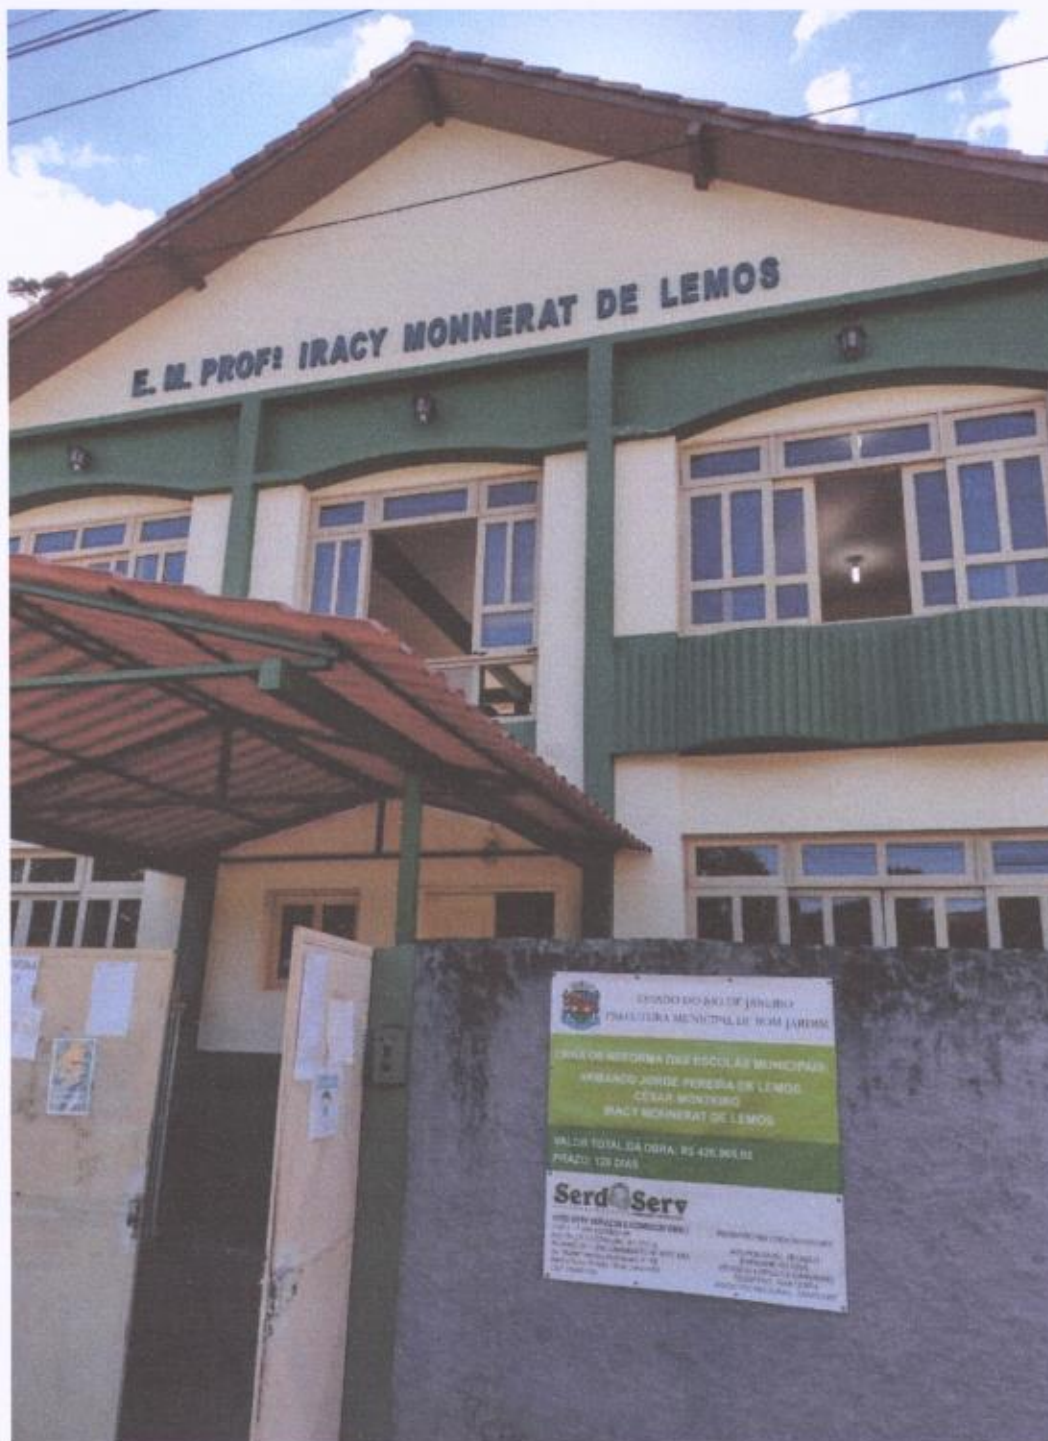


**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

15 DE JUNHO DE 2021.






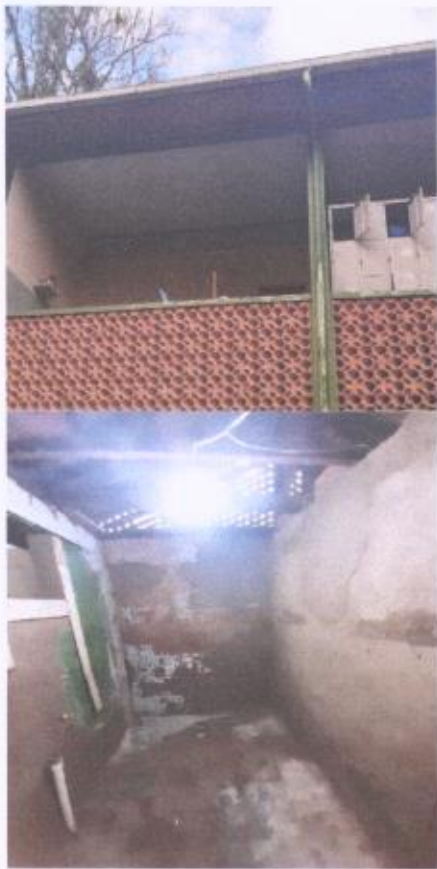





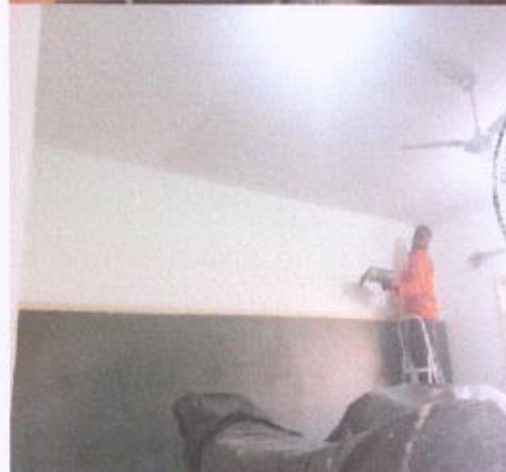




**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



16 DE JUNHO DE 2021.







**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



17 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



18 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**




21 DE JUNHO DE 2021.

Serd Serv

Prestação de Serviços



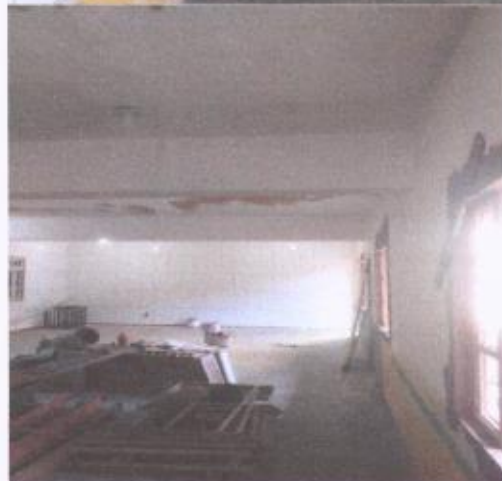

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



22 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



23 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



24 DE JUNHO DE 2021.






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



25 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



29 DE JUNHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



30 DE JUNHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

01 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



02 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

05 DE JULHO DE 2021.






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

06 DE JULHO DE 2021.



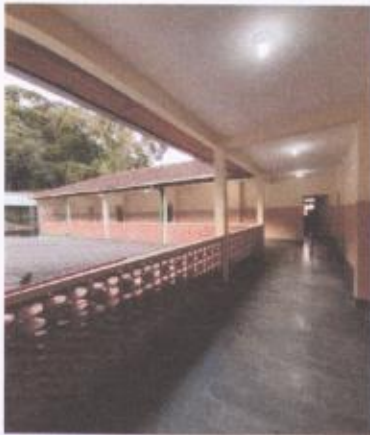

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

07 DE JULHO DE 2021.







**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



08 DE JULHO DE 2021.

Serd Serv

Prestação de Serviços

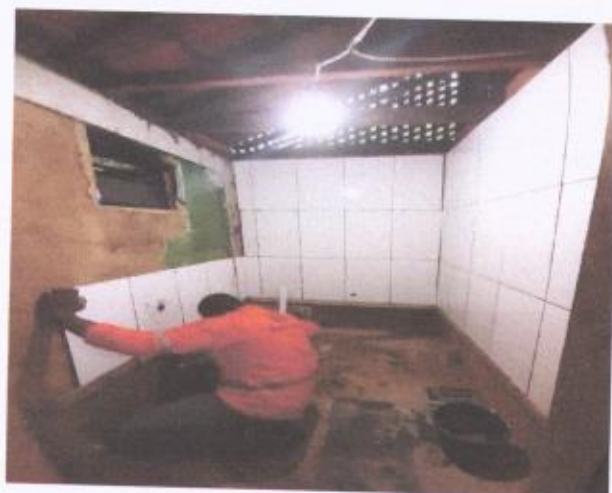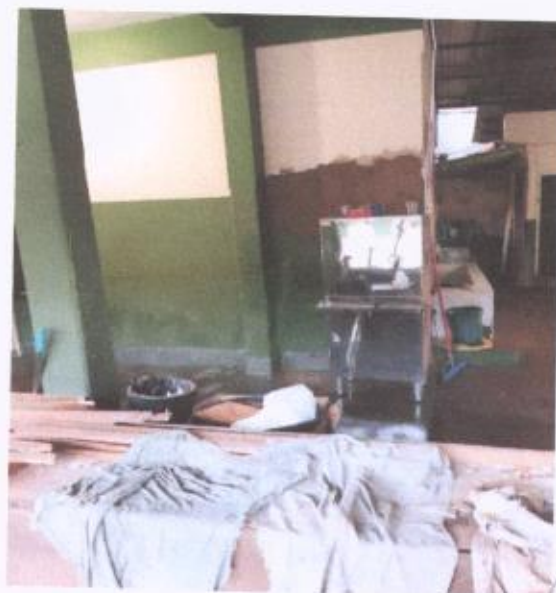



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

09 DE JULHO DE 2021.








**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**




12 DE JULHO DE 2021.

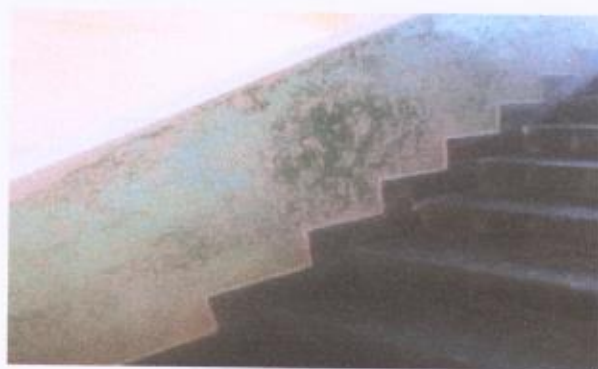

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



13 DE JULHO DE 2021.

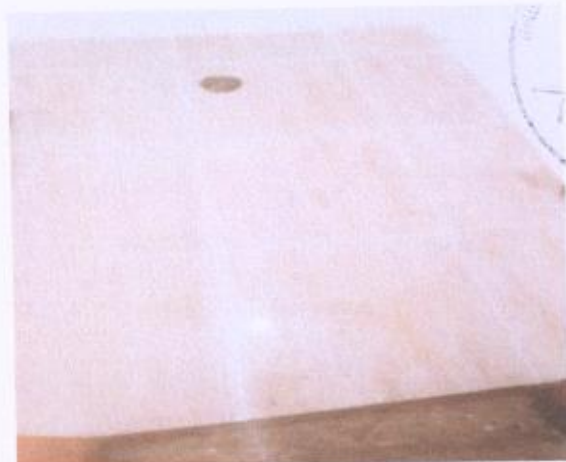

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



14 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**




15 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



16 DE JULHO DE 2021.

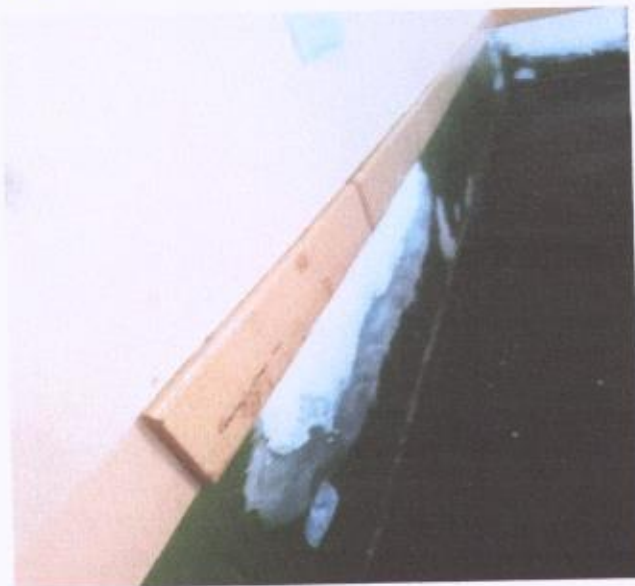




**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**




19 DE JULHO DE 2021.

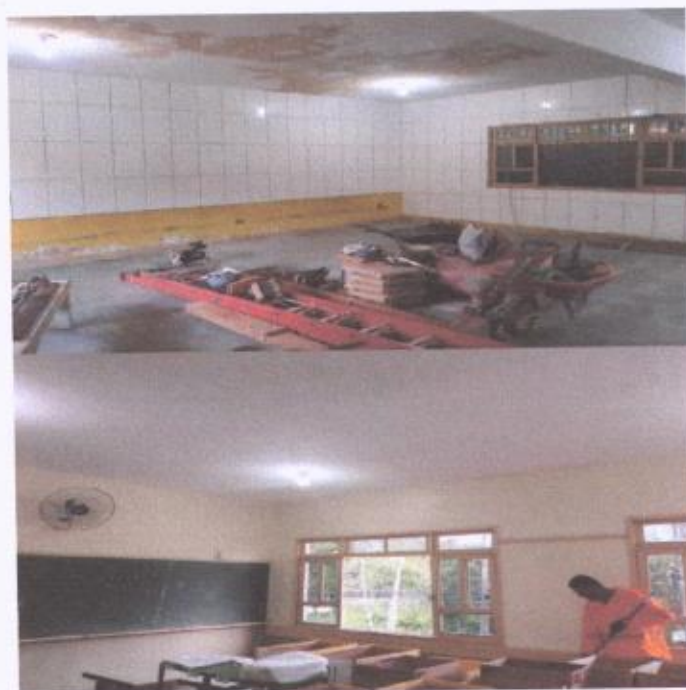

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



20 DE JULHO DE 2021.

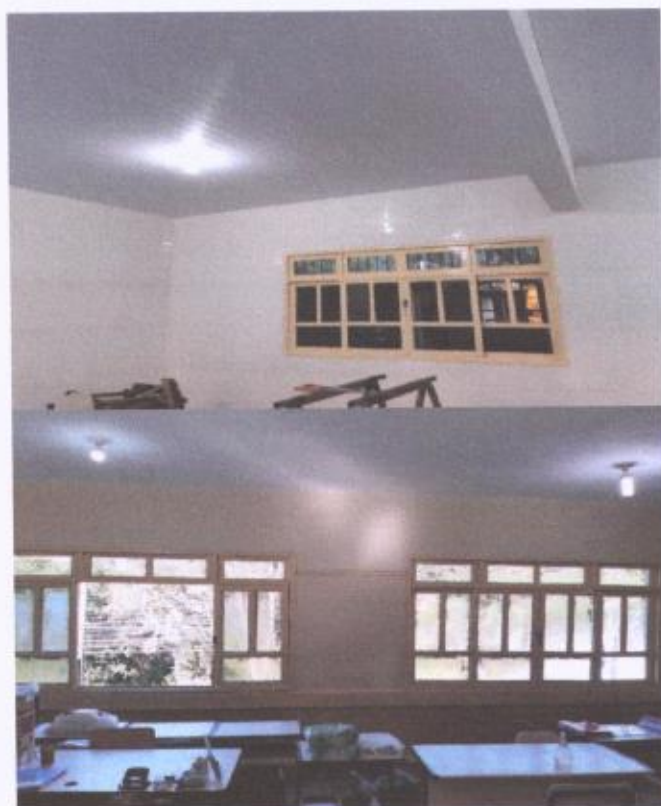

328
UBRICA



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**



21 DE JULHO DE 2021.



A CONTABILIDADE

A MEDIDA ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS
SERVIÇOS EXECUTADOS.
Pelo Promotor.

em 30/07/11

Procurador Municipal
Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil
Mat. 10/6265
