



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu –
RJ Cep: 28.695-000

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À Prefeitura Municipal de Bom Jardim

A empresa RB Nunes Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 34.939.102/0001-99, vêm por meio do seu representante legal, o SR. Ronilson Benedito Nunes, portador do RG 12803712-4 IFP/RJ solicitar a 1ª medição da obra cujo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE** Conforme contrato Nº 071/2023, Tomada de preços 007/2023.

Período: 04/09/2023 à 01/11/2023


Bom Jardim, 10 de novembro de 2023

Ronilson Benedito Nunes

RG: 12803712-4

Diretor Executivo

34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 09, PAPUCAIA, CEF 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



VIGA – soluções em serviços

viga.comerciorj@gmail.com



CNPJ: 04.888.102/0001-90 Inscricao estadual: 11.553.838

Endereço: Rua Victor Segal, 254, Vila Lf, Curitiba - Parana - CEP: 81190-000

Endereço: Rua Victor Segal, 254, Vila Lf, Curitiba - Parana - CEP: 81190-000

Nome:	Edson Carlos da Silva
CPF:	000.000.000-00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

UNIDADE

PREÇO

ITEM	CODIGO ANEP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL	Quant.	Valor	Quant.	Valor
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1 - CANTO DE OBRAS									
1.1.1	01.001.001.0	TRABALHO DE PREPARAÇÃO DO CANTO DE OBRAS COM TELHAS TRANSITÓRIAS DE AÇO GALVANIZADO, ESPRESSURA DE CIMENTO, LANTAS COM A VED. DE UTILIZAÇÃO INCLUSIVE ENCAMIÇAMENTO DE MADEIRA, UTILIZANDO 3 VERTS E PINTURA EM LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	18,00	R\$ 2.000,00	18	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.1.2	01.001.001.0	TRABALHO DE CORTA COM PAREDES E PISO DE MADEIRA DE 14,00 CM DE LARGURA DE TELHA DE PISO, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	12,00	R\$ 1.800,00	12	R\$ 1.800,00	0	R\$ -
1.1.3	01.001.001.0	TRABALHO DE CORTA COM PAREDES E PISO DE MADEIRA DE 14,00 CM DE LARGURA DE TELHA DE PISO, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	2,20	R\$ 678,20	2,20	R\$ 678,20	0	R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.1 - CANTO DE OBRAS									
					R\$ 4.478,20		R\$ 4.478,20		R\$ 4.478,20
1.2 - TRABALHOS DE OBRAS									
1.2.1	04.001.001.0	TRANSPORTES DE MADEIRA TUBULAR, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	18,00	R\$ 2.000,00	18	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.2.2	04.001.001.0	TRANSPORTES DE MADEIRA TUBULAR, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	12,00	R\$ 1.800,00	12	R\$ 1.800,00	0	R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.2 - TRABALHOS DE OBRAS									
					R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
1.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.3.1	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.3.2	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.3.3	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.3.4	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.3.5	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.3.6	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.3.7	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.3.8	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.3.9	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
1.3.10	05.001.001.0	PLATFÔRMA DE MADEIRA DE 10,00 CM DE LARGURA, INCLUSIVE CORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA E LANTAS DE 100 CM X 100 CM	M2	21,00	R\$ 2.000,00	21	R\$ 2.000,00	0	R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
					R\$ 12.600,00		R\$ 12.600,00		R\$ 12.600,00
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
					R\$ 19.886,20		R\$ 19.886,20		R\$ 19.886,20
2.0 - SERVIÇOS DE OBRAS									
2.1 - BASE E PAVIMENTO									

OK

[illegible]

Louise Freed

[illegible]

RUA USUALUR VICENTE SOUQUERA 253
LONDRE - INGLATERRA



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu - RJ Cep: 28.695-000

Relatório Fotográfico

Contrato

071/2023

Local: Barra Alegre - Bom Jardim RJ

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

Remoção de alambrado



Placa de identificação de obra



[Handwritten signature]



Colocação de tapume



Lixamento de pilar e terças



Aplicação de prime



SP



Retirada de rtreservatório de água e colocação de novo reservatório



10

Pintura com tinta esmalte sintético



Execução de alambrado

Handwritten signature or mark.



Assentamento de aduelas e colocação de portas e aplicação de verniz



JP




Assentamento de intertravado



Handwritten signature



Preparação de paredes do vestiário para pintura

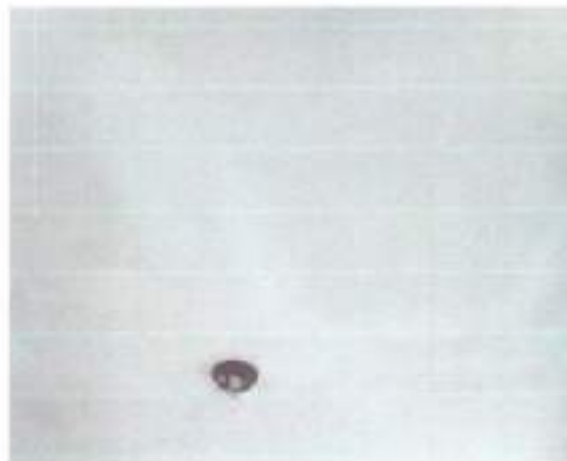

[Handwritten signature]



Aplicação de pintura com tinta acrílica na cor amarelo



JP



Correção de rachaduras no piso da quadra



[Handwritten signature]



Colocação de tela no alambrado



SP

Instalação de refletores na quadra



Reparo no telhado do vestiário



Roberto Redit Ar
34.939.102/0001-99

RB LINDEN COMÉRCIO E SERVIÇOS

RUA OSVALDO VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 3 - PARQUE ALTO DE SANTO ANTONIO
ENCHEREA - MARICÁ - RJ



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 04/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Arrancamento de alambrado e empilhamento no canteiro de trabalho.
Carlos André	Pedreiro	Retirada de calhas danificadas
Maicon José	Ajudante	Colocação de placa de identificação de obra
João Pedro	Ajudante	
Uelinton Martins	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Retirada de calhas danificadas
Colocação de placa de identificação de obra

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

04/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 05/09/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Arrancamento de alambrado e empilhamento no canteiro de trabalho.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	
Malcon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Uelinton Martins	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		
		CONTRATADA DATA
		Ass: 05/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 06/09/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Arrancamento de alambrado e empilhamento no canteiro de trabalho.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	
Malcon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Uelinton Martins	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA DATA
Ass: _____	____/____/____	Ass: _____ 06/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

07/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função
Jorge Henrique	Gestor de obra
Carlos André	Pedreiro
Malcen José	Ajudante
João Pedro	Ajudante
Carlos Rodrigo	Ajudante
Uelinton Martins	servente

Feriado da Independência - Sem atividade na obra

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

07/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 08/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Jorge Henrique Gestor de obra

Carlos André Pedreiro

Malcon José Ajudante

João Pedro Ajudante

Uelinton Martins Ajudante

Continuação Arrancamento de alambrado e empilhamento no canteiro de trabalho.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Continuação Arrancamento de alambrado e empilhamento no canteiro de trabalho.

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

08/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 11/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Lixamento dos pilares da quadra poliesportiva
Carlos André	Pedreiro	Execução de tapume de obra em telha galvanizada e engradamento de madeira
Maicon Jose	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

todas as etapas iniciadas na presente data , foram terminadas .

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

11/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu - RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 12/09/2023

Contrato: 071/2023

FISCAL:

DECORRIDO RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função
Jorge Henrique	Gestor de obra
Carlos André	Pedreiro
Maicon José	Ajudante
João Pedro	Ajudante
Carlos Rodrigo	Ajudante

Continuação Lixamento manual dos pilares da quadra poliesportiva
Continuação Execução de tapume de obra em telha galvanizada e engradamento de madeira

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Continuação Execução de tapume de obra em telha galvanizada e engradamento de madeira

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3 de 4 etapas foram concluídas

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

12/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 13/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função
Jorge Henrique	Gestor de obra
Carlos André	Pedreiro
Malcon José	Ajudante
João Pedro	Ajudante
Carlos Rodrigo	Ajudante

Continuação Lixamento manual dos pilares da quadra poliesportiva
Lixamento manual de terças

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Continuação Lixamento manual dos pilares da quadra poliesportiva

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

todas as etapas iniciadas na presente data, foram terminadas

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

13/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

14/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Continuação Lixamento manual de terças

Jorge Henrique Gestor de obra

Retirada de telhas galvanizadas danificadas

Carlos André Pedreiro

Malcon José Ajudante

João Pedro Ajudante

Carlos Rodrigo Ajudante

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Retirada de telhas galvanizadas danificadas

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

todas as etapas iniciadas na presente data foram terminadas.

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

14/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 15/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(X) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função
Jorge Henrique	Gestor de obra
Carlos André	Pedreiro
Maicon José	Ajudante
João Pedro	Ajudante
Carlos Rodrigo	Ajudante

Continuação Lixamento manual de terças
Colocação de telhas galvanizadas

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Continuação Lixamento manual de terças
Colocação de telhas galvanizadas

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

todas as etapas iniciadas na presente data , foram terminadas

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

____/____/____



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 18/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Aplicação de prime com compressor nos pilares da quadra
Carlos André	Pedreiro	Aplicação manual de prima nas terças
Maicon Jose	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

todas as etapas iniciadas na presente data , foram terminadas .

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

18/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu - RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 19/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função
Jorge Henrique	Gestor de obra
Carlos André	Pedreiro
Maicon José	Ajudante
João Pedro	Ajudante
Carlos Rodrigo	Ajudante

Continuação Aplicação de prime com compressor nos pilares da quadra
Continuação Aplicação manual de prima nas terças

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3 de 4 etapas foram concluídas

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass: 19/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 20/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função
Jorge Henrique	Gestor de obra
Carlos André	Pedreiro
Malcon José	Ajudante
João Pedro	Ajudante
Carlos Rodrigo	Ajudante

Continuação Aplicação de prime com compressor nos pilares da quadra
Continuação Aplicação manual de prima nas terças

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

todas as etapas iniciadas na presente data, foram terminadas

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu - RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 21/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Aplicação de prime com compressor nos pilares da quadra
Carlos André	Pedreiro	Continuação Aplicação manual de prima nas terças
Malcon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Continuação Aplicação de prime com compressor nos pilares da quadra
Continuação Aplicação manual de prima nas terças

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

todas as etapas iniciadas na presente data foram terminadas.

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:

21/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 22/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Jorge Henrique Gestor de obra

Aplicação de pintura com tinta esmalte sintético nos pilares da quadra (serviços executado com compressor)

Carlos André Pedreiro

Retirada de reservatório de água e colocação de um novo reservatório de água de 100 litros

Melicon José Ajudante

João Pedro Ajudante

Carlos Rodrigo Ajudante

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Retirada de reservatório de água e colocação de um novo reservatório de água de 100 litros

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIARIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

todas as etapas iniciadas na presente data , foram terminadas

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:

22/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

25/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Aplicação de pintura com tinta esmalte sintético nos pilares da quadra (serviços executado com compressor)
Carlos André	Pedreiro	Aplicação manual de pintura com tinta esmalte sintético nas terças.
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:

25/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 26/09/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Aplicação de pintura com tinta esmalte sintético nos pilares da quadra (serviços executado com compressor)
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	Aplicação manual de pintura com tinta esmalte sintético nas terças
Malcon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		
		CONTRATADA
		Ass:
		DATA 26/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

27/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Aplicação de pintura com tinta esmalte sintético nos pilares da quadra (serviços executado com compressor)
Carlos André	Pedreiro	Aplicação manual de pintura com tinta esmalte sintético nas terças
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Continuação Aplicação de pintura com tinta esmalte sintético nos pilares da quadra (serviços executado com compressor)
Aplicação manual de pintura com tinta esmalte sintético nas terças

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

27/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 28/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Execução de alambrado com tubos galvanizados, soldados com solda mig.
Carlos André	Pedreiro	Retirada de portas e janelas do vestiário
Malcon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Retirada de portas e janelas do vestiário

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

Altair Junior Serralheiro

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

28/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 29/09/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

[x] OPERAVEL [] NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Execução de alambrado com tubos galvanizados, soldados com solda mig.
Carlos André	Pedreiro	Assentamento de aduelas e recomposição de vão de portas e janelas
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

Altair Junior Serralheiro

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

29/09/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 02/10/2023

DECORRIDO RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

Contrato: 071/2023

FISCAL:

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Execução de alambrado com tubos galvanizados, soldados com solda mig.
Carlos André	Pedreiro	Continuação Assentamento de aduelas e recomposição de vão de portas e janelas
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

		Continuação Assentamento de aduelas e recomposição de vão de portas e janelas
--	--	---

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

Altair Junior Serralheiro

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:

02/10/23





CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 04/10/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Continuação Execução de alambrado com tubos galvanizados, soldados com solda mig.

Jorge Henrique Gestor de obra

Carlos André Pedreiro

Continuação Assentamentos de portas e colocação de fechaduras

Malcon José Ajudante

João Pedro Ajudante

Carlos Rodrigo Ajudante

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Continuação Assentamentos de portas e colocação de fechaduras

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

Altair Junior Serralheiro

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

04/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 05/10/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Jorge Henrique Gestor de obra

Continuação Execução de alambrado com tubos galvanizados, soldados com solda mig.

Carlos André Pedreiro

Regularização manual de solo para assentamento de intertravado

Maicon José Ajudante

João Pedro Ajudante

Carlos Rodrigo Ajudante

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

Altair Junior Serralheiro

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

05/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu - RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 06/10/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função
Jorge Henrique	Gestor de obra
Carlos André	Pedreiro
Malcon José	Ajudante
João Pedro	Ajudante
Carlos Rodrigo	Ajudante

Continuação Execução de alambrado com tubos galvanizados, soldados com solda mig.

Continuação Regularização manual de solo para assentamento de intertravado

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Continuação Execução de alambrado com tubos galvanizados, soldados com solda mig.

Continuação Regularização manual de solo para assentamento de intertravado

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

Altair Júnior Serralheiro

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

06/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 09/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO
FISCAL:		RESTANTE
		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Execução de pintura do alambrado com tinta esmalte sintético, utilizando compressor
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	Execução meio fio com bloco de concreto para sustentação da área do intertravado
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
Jhon		
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		
		CONTRATADA
		DATA
		Ass: 09/10/23

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 10/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Execução de pintura do alambrado com tinta esmalte sintético, utilizando compressor
Carlos André	Pedreiro	Continuação Execução meio fio com bloco de concreto para sustentação da área do intertravado
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
		Continuação Execução meio fio com bloco de concreto para sustentação da área do intertravado
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		Ass: 10/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 11/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO
FISCAL:		RESTANTE
		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Execução de pintura do alambrado com tinta esmalte sintético, utilizando compressor
Carlos André	Pedreiro	Assentamento de intertravado sobre colchão de pó de pedra.
Malcon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
		Continuação Execução de pintura do alambrado com tinta esmalte sintético, ut
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		
		CONTRATADA
		Ass:
		DATA
		11/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 12/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Assentamento de intertravado sobre colchão de pó de pedra.
Carlos André	Pedreiro	Execução de grade para fechamento entre o vestiário e o muro
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:
		Execução de grade para fechamento entre o vestiário e o muro.
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA ____/____/____	Ass:  DATA 12/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 13/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Assentamento de intertravado sobre colchão de pó de pedra.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	Lixamento manual de das paredes internas e externas do vestiário
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
		Lixamento manual de das paredes internas e externas do vestiário
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA 13/10/23	Ass: 



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA			
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 16/10/2023	
Contrato: 071/2023		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:	
Nome	Função	Continuação Assentamento de intertravado sobre colchão de pó de pedra.	
Jorge Henrique	Gestor de obra		
Carlos André	Pedreiro	Aplicação de selador acrílico nas paredes internas e externas do vestiário	
Maicon José	Ajudante		
João Pedro	Ajudante		
Carlos Rodrigo	Ajudante		
Jhon			
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO			
TOTAL			
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS			
Nenhuma			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA DATA
Ass:		11/10/23	Ass: 16/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 17/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO
FISCAL:		RESTANTE
		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Assentamento de intertravado sobre colchão de pó de pedra.
Carlos André	Pedreiro	Continuação plicação de selador acrílico nas paredes internas e externas do vestiário
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:
		Continuação Assentamento de intertravado sobre colchão de pó de pedra.
		Continuação plicação de selador acrílico nas paredes internas e externas do vestiário
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	17/10/23	

DIÁRIO DE OBRA					
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE				DATA	18/10/2023
Contrato: 071/2023				DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:				TEMPO	
				(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:			
Nome	Função				
Jorge Henrique	Gestor de obra	Aplicação de pintura com tinta acrílica na cor amarelo nas paredes internas e externas do vestiário.			
Carlos André	Pedreiro	Correção de rexadura de no piso da quadra			
Márcio José	Ajudante				
João Pedro	Ajudante				
Carlos Rodrigo	Ajudante				
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:			
PESSOAL DE OBRA INDIRETO					
TOTAL					
OCCORRÊNCIAS DIÁRIAS					
Nenhuma					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA	DATA	
Ass: _____		_____/_____/_____	Ass: _____	_____/_____/_____	



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 19/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Aplicação de pintura com tinta acrílica na cor amarelo nas paredes internas e externas do vestiário.
Carlos André	Pedreiro	Continuação Correção de rexadura de no piso da quadra
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA 11/11	Ass: DATA 19/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000


DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 20/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Aplicação de pintura com tinta acrílica na cor amarelo nas paredes internas e externas do vestiário.
Carlos André	Pedreiro	Continuação Correção de rexadura de no piso da quadra
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:
		Continuação Aplicação de pintura com tinta acrílica na cor amarelo nas paredes internas e externas do vestiário.
		Continuação Correção de rexadura de no piso da quadra
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA 11/11	Ass: DATA 20/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 23/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Colocação de tela no alambrado da quadra.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	instalação de 8 refletores de led na quadra.
Maicon Jose	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
Leandro Nunes	Eletricista	SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
		instalação de 8 refletores de led na quadra.
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	__/__/__	 23/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 24/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Colocação de tela no alambrado da quadra.
Carlos André	Pedreiro	
Maicon José	Ajudante	Instalação de quadro de energia de sobre e disjuntores
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
Leandro Nunes	Eletricista	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
		Instalação de quadro de energia de sobre e disjuntores
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		
		CONTRATADA
		Ass:
		DATA
		24/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 25/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Colocação de tela no alambrado da quadra.
Carlos André	Pedreiro	Execução de reparos no telhado do vestiário com substituição de telhas de fibrocimento e substituição de telhas cerâmicas no beiral.
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
		Continuação Colocação de tela no alambrado da quadra.
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	25/10/23	



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 27/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Execução de reparos no telhado do vestiário com substituição de telhas de fibrocimento e substituição de telhas cerâmicas no beiral.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	Lixamento manual das portas de madeira
Malcon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
		Lixamento manual das portas de madeira
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA 27/10/23	Ass: DATA 27/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 30/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Execução de reparos no telhado do vestiário com substituição de telhas de fibrocimento e substituição de telhas cerâmicas no beiral.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	Pintura de portas de madeira com verniz
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA ____/____/____	Ass:  DATA 30/10/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 31/10/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Execução de reparos no telhado do vestiário com substituição de telhas de fibrocimento e substituição de telhas cerâmicas no beiral.
Carlos André	Pedreiro	Continuação Pintura de portas de madeira com verniz
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:
		SERVIÇOS INICIADOS:
		Continuação Execução de reparos no telhado do vestiário com substituição de telhas de fibrocimento e substituição de telhas cerâmicas no beiral.
		Continuação Pintura de portas de madeira com verniz
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		Ass: 31/10/23
