

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À Prefeitura Municipal de Bom Jardim

A empresa RB Nunes Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 34.939.102/0001-99, vêm por meio do seu representante legal, o SR. Ronilson Benedito Nunes, portador do RG 12803712-4 IFP/RJ solicitar a 2ª medição da obra cujo o objeto é *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE* Conforme contrato Nº 071/2023, Tomada de preços 007/2023.


Período: 02/11/2023 à 10/12/2023

Bom Jardim, 03 de Janeiro de 2024



Ronilson Benedito Nunes
RG: 12803712-4
Diretor Executivo

34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 09 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À Prefeitura Municipal de Bom Jardim

A empresa RB Nunes Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 34.939.102/0001-99, vêm por meio do seu representante legal, o SR. Ronilson Benedito Nunes, portador do RG 12803712-4 IFP/RJ solicitar a 2ª medição da obra cujo o objeto é *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE* Conforme contrato Nº 071/2023, Tomada de preços 007/2023.

Período: 02/11/2023 à 10/12/2023

Bom Jardim, 03 de Janeiro de 2024



Ronilson Benedito Nunes

RG: 12803712-4

Diretor Executivo

34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Tel: (22) 99950-0940 E-mail: VilaCoronel@villacoronel.com.br

THOMAS J. BOWEN, University of Mississippi, 201 S. 3rd St., Hattiesburg, MS 39401-0001, U.S.A. (e-mail: jrbowen@olemiss.edu)

Obras:	Reforma Quadra Poliesportiva Barra Alegre - Bom Jardim/RJ
Prazo:	180 dias

MEDIAS

ITEM	CODIGO ENOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1 - CANTIERO DE OBRAS			UNITARIO	TOTAL	
1.1.1	02.002.000-5-0	TAPUME DEVEDADO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRANDIMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	88,00	R\$ 25,00
1.1.2	02.004.0001-0	BARBACAO DE OBRA COM FRADELOS E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,F INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITO 2 VEZES.	M2	12,00	#####
1.1.3	0-2.220.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,25	#####
TOTAL DO ITEM			1.1 - CANTIERO DE OBRAS		
1.2	TRANSPORTES				
1.2.1	04.0-20.01-22-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECCAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DESPERA DO CAMINHACAO(VE ITEM 04.0210010)	M2 X KM	1567,80	R\$ 0,15
1.2.2	04.0-21.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROECCAO VERTICAL	M2	104,52	R\$ 0,69
TOTAL DO ITEM 1.2 - TRANSPORTES			R\$ 307,29		
1.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.3.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1", CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS SUPORTE E MOVIMENTACAO(VE ITEM 05.008.0008)	M2	21,60	R\$ 4,58
1.3.2	05.006.0001-1	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FINAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROECCAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PEO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2/M3	257,40	R\$ 9,42
1.3.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	85,80	R\$ 5,46
1.3.4	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	42,90	R\$ 0,46
1.3.5	05.001.0147-0	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCA E PORTOS	M2	232,40	R\$ 13,30
1.3.6	05.001.0072-0	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES	M	124,60	R\$ 2,74
1.3.7	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CALHILLOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS	UN	10,00	R\$ 19,34
1.3.8	05.001.00.40-0	REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO, EXCLUSIVE SUPORTE, ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	50,00	R\$ 6,50
1.3.9	05.550.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSÕES DE 0,40X0,60M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 417,07
1.3.10	05.001.0023-0	DEMOICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TITULOS RUJADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL, DENTRO DO CANTIERO DE SERVICO	M3	0,12	R\$ 76,00
TOTAL DO ITEM 1.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 7.316,00		
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 14.542,82		
2.0 - REFORMA GERAL					
2.1 - BASES E PAVIMENTOS					
2.1.1	08.0-20.0008-0	PAVIMENTACAO INTERNAVAJA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COM NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME NBR 15533, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	52,40	R\$ 61,00
2.1.2	08.0-220.0030-0	ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHOAO DE PO-DE- PEDRA, AREA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REFINATAMENTO	M2	52,40	R\$ 51,00
TOTAL DO ITEM 2.1 - BASES E PAVIMENTOS			R\$ 5.868,80		
2.2 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS					
2.2.1	09.015.003-2-0	ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO RIO Nº12, MALHA LOSANGO DE 7,5CM, COM ALTURA DE 4,00M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A 45º, ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS ACO GALVANIZADO DE 1,1/4", OS VERTICAIS A CADA 2,00M, INCL. PORTOES E FERRAGENS, EXCL. PINTURA, FORN. E COLOCACAO	M2	147,20	R\$ 150,00
2.2.2	09.015.0030-0	ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO RIO Nº12, MALHA LOSANGO DE 7,5CM, COM ALTURA DE 2,00M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A 45º, ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS ACO GALVANIZADO DE 1,1/4", OS VERTICAIS A CADA 2,00M, INCLUSIVE PORTOES E FERRAGENS, EXCL. PINTURA, FORN. E COLOC.	M2	85,20	R\$ 150,00
TOTAL DO ITEM 2.2 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			R\$ 34.860,00		

2.3.1	14.004.0130-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU PAINÉIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	3,34	R\$ 358,00	R\$ 1.195,72	R\$ 0,00	3,34	R\$ 1.195,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ -
2.3.2	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINÉIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE QUADRO PARA PROTEÇÃO DE JANELA OU ARAJES DE 18 CONDIÇÃO, FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8" - CHUMBAÇOS NA ALVENARIA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 113,72	R\$ 568,60	R\$ 0,00	5	R\$ 568,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ -
2.3.3	14.002.0227-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOGADA, DE 80X100CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	6,22	R\$ 390,00	R\$ 2.425,80	R\$ 0,00	6,22	R\$ 2.425,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ -
2.3.4	14.006.0097-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALZARES DE 5X20CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 638,12	R\$ 1.884,36	R\$ 1.884,36	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.884,36	0	R\$ 0,00	R\$ -
2.3.5	14.006.0014-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, DE - FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CILINDRO, DE LATÃO, DE ACABAMENTO CROMADO - 3 DOBRADIÇAS 3"x1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EROLAS DE LATÃO	UN	6,00	R\$ 210,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.260,00	0	R\$ 0,00	R\$ -
TOTAL DO ITEM 2.3 - ESCUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIBRAÇAS E FERRAGENS					R\$ 5.832,44	R\$ 4.642,32	R\$ 4.190,12							
0 DE PAREDES, TETOS E PRISOS														
2.4.1	13.001.0015-0	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESURA, INCLUSIVE TOTAL DO ITEM 2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PRISOS	M2	100,00	R\$ 20,50	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	100	R\$ 2.050,00	100	R\$ 2.050,00	0	R\$ -	
2.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS														
2.5.1	15.007.0400-0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO MAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE SOBRECOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASES, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 4 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 84,70	R\$ 84,70	R\$ 84,70	1	R\$ 84,70	1	R\$ 84,70	0	R\$ -	
2.5.2	15.020.0200-0	LAMPADA LED, BULBO, A60, 2W, 100/200V, BASE E 27° FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 7,65	R\$ 76,50	R\$ 76,50	10	R\$ 76,50	10	R\$ 76,50	0	R\$ -	
2.5.3	15.028.0010-0	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCEMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SIMILANTE COM 100L, INCLUSIVE PEÇAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGAÇÃO HIDRÁULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO	UN	1,00	R\$ 523,14	R\$ 523,14	R\$ 523,14	1	R\$ 523,14	1	R\$ 523,14	0	R\$ -	
2.5.4	15.008.0205-0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E EMPACOTAMENTO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM², 90/10V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	150,00	R\$ 3,08	R\$ 462,00	R\$ 462,00	150	R\$ 462,00	150	R\$ 462,00	0	R\$ -	
2.5.5	15.020.0215-0	LAMPADA LED, BULBO, A60, 25W, 100/240V, BASE E 27° FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 34,48	R\$ 344,80	R\$ 344,80	10	R\$ 344,80	10	R\$ 344,80	0	R\$ -	
2.6 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 1.491,14	R\$ 1.491,14	R\$ 1.491,14							
2.6.1	16.005.0015-0	CAIXA DE GALVALUME, 030MM, EM CHAPA DE PRESSÃO APROXIMADA DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	55,60	R\$ 71,00	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60	55,6	R\$ 3.947,60	55,6	R\$ 3.947,60	0	R\$ -	
2.6.2	16.004.0055-0	CONJUNTOS CIRCULARES PARA CAIXA DE BERAL DE PVC, DN 85, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	69,00	R\$ 49,90	R\$ 3.443,10	R\$ 3.443,10	69	R\$ 3.443,10	69	R\$ 3.443,10	0	R\$ -	
2.6.3	16.005.0001-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBRECARGO LATERAL DE LUNA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, PLACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMÍNIO, 5/16"X250MM COM ROCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	50,00	R\$ 95,26	R\$ 2.783,00	R\$ 2.783,00	50	R\$ 2.783,00	50	R\$ 2.783,00	0	R\$ -	
TOTAL DO ITEM 2.6 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 10.150,70	R\$ 10.151,70	R\$ 10.151,70							
2.7 - PINTURAS														
2.7.1	17.018.0044-0	REPINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA, CONFORME A BNT NBR 15079, PARA INTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	377,40	R\$ 7,30	R\$ 2.755,02	R\$ 2.755,02	377,4	R\$ 2.755,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
2.7.2	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, LAMA DEMAIO DE TINTA ANTOXEO E LAMA DEMAIO DE ACABAMENTO	M2	114,09	R\$ 14,50	R\$ 1.654,31	R\$ 1.654,31	114,09	R\$ 1.654,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
2.7.3	17.040.0022-0	REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCAÇÃO EXISTENTE CONFORME O ITEM 17.040.0021	M2	21,04	R\$ 28,00	R\$ 589,12	R\$ 589,12	21,04	R\$ 589,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
2.7.4	17.040.0024-0	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACÚLICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRÊS DEMAIO DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLÔ DE 1/4, DILUIÇÃO EM ÁGUA A 20%	M2	456,54	R\$ 9,90	R\$ 4.519,75	R\$ 4.519,75	456,54	R\$ 4.519,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
TOTAL DO ITEM 2.7 - PINTURAS					R\$ 9.518,19	R\$ 1.654,31	R\$ 7.863,89							
2.8 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS														
2.8.1	18.027.0130-0	PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DE QUADROS DE ESPORTE, PATIOS OU FACHADAS, EM ALUMÍNIO, REPUXADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO (DIÂMETRO = 300MM) PARA LAMPADA LED 25W OU MISTA DE 250W, EXCLUSIVE LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 232,00	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00	10	R\$ 2.320,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
2.8.2	18.260.0065-0	SUPOORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 3,59	R\$ 35,90	R\$ 35,90	10	R\$ 35,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
2.8.3	18.007.0049-0	CHUVEIRO ELÉTRICO, EM PLÁSTICO, DE 110/220V, FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 29,80	R\$ 89,40	R\$ 89,40	3	R\$ 89,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
2.8.4	18.021.0005-0	RESERVATÓRIO APOIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL, OU PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIÉSTERO, COM CAPEDÃO DE 100L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 15527, 12217 E 8220, FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 248,94	R\$ 248,94	R\$ 248,94	1	R\$ 248,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
TOTAL DO ITEM 2.8 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS					R\$ 2.694,24	R\$ 2.694,24	R\$ 2.694,24							
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL														
						TOTAL:	R\$ 77.386,51	R\$ 32.624,72						
						B.D.I	R\$ 21.188,67	R\$ 18.216,31						
						TOTAL GERAL:	R\$ 111.200,00	R\$ 95.609,42	Total da medição					



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

Relatório Fotográfico

Contrato

071/2023

Local: Barra Alegre - Bom Jardim RJ

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

Remoção de alambrado

Repintura com tinta latex das partes internas e externas do vestiário



Preparação do Piso da quadra para pintura com lixamento com calafetação de Fisuras



Marcação da quadra com tinta Latex





Aplicação da primeira de mão de tinta Latex sobre o piso da quadra





Aplicação da terceira de mão da tinta latex sobre o piso da quadra






Pintura interna do piso do vestiário com tinta Piso Premium



Pinturas da grade da janela com tinta esmalte brilhante

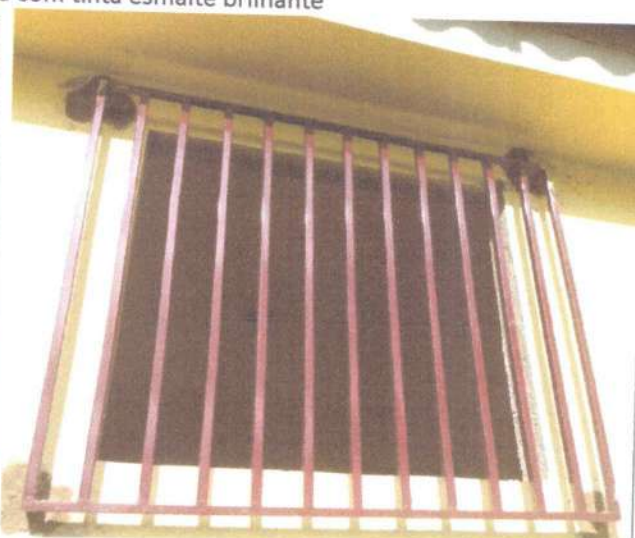

Fabricação e Instalação do Portão ao Lado do Vestiário



Aplicação de pintura com tinta acrílica na cor amarelo



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

02/12/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

Nome	Função
Jorge Henrique	Gestor de obra
Carlos André	Pedreiro
Maicon José	Ajudante
João Pedro	Ajudante
Carlos Rodrigo	Ajudante
Leandro Nunes	Eletricista

SERVIÇOS INICIADOS:

Pintura do piso interno do vestiário com tinta piso premium.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

02/12/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

03/12/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

Jorge Henrique

Gestor de obra

Carlos André

Pedreiro

Maicon José

Ajudante

João Pedro

Ajudante

Carlos Rodrigo

Ajudante

Leandro Nunes

Eletricista

Continuação Pintura do piso interno do vestiário com tinta piso premium.

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

03/12/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

04/12/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

Jorge Henrique

Gestor de obra

Carlos André

Pedreiro

Maicon José

Ajudante

João Pedro

Ajudante

Carlos Rodrigo

Ajudante

Pintura de grades das janelas com tinta esmalte brilhante

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

04/12/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

05/12/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

Jorge Henrique

Gestor de obra

Continuação Pintura de grades das janelas com tinta esmalte brilhante

Carlos André

Pedreiro

Fabricação e instalação portão ao lado do vestiário

Maicon José

Ajudante

João Pedro

Ajudante

Carlos Rodrigo

Ajudante

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

Continuação Pintura de grades das janelas com tinta esmalte brilhante

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

05/12/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

27/11/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Jorge Henrique Gestor de obra

Carlos André Pedreiro

Maicon José Ajudante

João Pedro Ajudante

Carlos Rodrigo Ajudante

Leandro Nunes Eletricista

Continuação Aplicação de terceira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

27/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 28/11/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Aplicação de terceira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
Leandro Nunes	Eletricista	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	28/11/23	28/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA			
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 29/11/2023	
Contrato: 071/2023		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:	
Nome	Função	Continuação Aplicação de terceira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.	
Jorge Henrique	Gestor de obra		
Carlos André	Pedreiro		
Maicon José	Ajudante		
João Pedro	Ajudante		
Carlos Rodrigo	Ajudante		
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO			
TOTAL			
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS			
Nenhuma			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA
Ass:		____/____/____	Ass: 
			DATA 29/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

30/11/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Continuação Aplicação de terceira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.

Jorge Henrique Gestor de obra

Carlos André Pedreiro

Maicon José Ajudante

João Pedro Ajudante

Carlos Rodrigo Ajudante

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

__/__/__

CONTRATADA

DATA

Ass:

30/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA			
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA	01/12/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:	
Nome	Função	Continuação Aplicação de terceira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.	
Jorge Henrique	Gestor de obra		
Carlos André	Pedreiro		
Maicon José	Ajudante		
João Pedro	Ajudante		
Carlos Rodrigo	Ajudante		
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:	
		Continuação Aplicação de terceira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO			
TOTAL			
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS			
Nenhuma			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA
Ass:		Ass:	Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 20/11/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Jorge Henrique	Gestor de obra	Continuação Aplicação de primeira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.
Carlos André	Pedreiro	
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

Continuação Aplicação de primeira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:


20/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 21/11/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Aplicação de segunda demão de tinta látex sobre o piso da quadra.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	__/__/__	 21/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000


DIÁRIO DE OBRA			
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA	22/11/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:	
Nome	Função	Continuação Aplicação de segunda demão de tinta látex sobre o piso da quadra.	
Jorge Henrique	Gestor de obra		
Carlos André	Pedreiro		
Maicon José	Ajudante		
João Pedro	Ajudante		
Carlos Rodrigo	Ajudante		
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO			
TOTAL			
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS			
Nenhuma			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA
Ass:		Ass: 	DATA 22/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA			
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA	23/11/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:	
Nome	Função	Continuação Aplicação de segunda demão de tinta látex sobre o piso da quadra.	
Jorge Henrique	Gestor de obra		
Carlos André	Pedreiro		
Maicon José	Ajudante		
João Pedro	Ajudante		
Carlos Rodrigo	Ajudante		
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO			
TOTAL			
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS			
Nenhuma			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA
Ass:		Ass: 	DATA 23/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 24/11/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

Jorge Henrique

Gestor de obra

Aplicação de terceira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.

Carlos André

Pedreiro

Maicon José

Ajudante

João Pedro

Ajudante

Carlos Rodrigo

Ajudante

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

24/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

13/11/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome Função

Jorge Henrique Gestor de obra

Carlos André Pedreiro

Maicon José Ajudante

João Pedro Ajudante

Carlos Rodrigo Ajudante

Preparação de piso da quadra para pintura com lixamento de toda a área e calafetação de fissuras.

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:

13/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 14/11/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Preparação de piso da quadra para pintura com lixamento de toda a área e calafetação de fissuras.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:
		Continuação Preparação de piso da quadra para pintura com lixamento de toda a área e calafetação de fissuras.
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		
		CONTRATADA
		Ass:
		DATA 14/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA			
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 15/11/2023	
Contrato: 071/2023		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:	
Nome	Função	Marcação de quadra com tinta látex.	
Jorge Henrique	Gestor de obra		
Carlos André	Pedreiro		
Maicon José	Ajudante		
João Pedro	Ajudante		
Carlos Rodrigo	Ajudante		
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:	
		Marcação de quadra com tinta látex.	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO			
TOTAL			
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS			
Nenhuma			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA
Ass:		11/11/2023	Ass: [assinatura]



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA

17/11/2023

Contrato: 071/2023

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

Jorge Henrique

Gestor de obra

Continuação Aplicação de primeira demão de tinta látex sobre o piso da quadra.

Carlos André

Pedreiro

Maicon José

Ajudante

João Pedro

Ajudante

Carlos Rodrigo

Ajudante

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

____/____/____

CONTRATADA

DATA

Ass:

17/11/23



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 06/11/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO
FISCAL:		RESTANTE
		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Repintura com tinta latex das partes interna e externa do vestiário
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	__/__/__	Ass: 06/11/23

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 09/11/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO
FISCAL:		RESTANTE
		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Repintura com tinta latex das partes interna e externa do vestiário.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		Ass: 09/11/23

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE

DATA 01/11/2023

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

Contrato: 071/2023

ISCAL:

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função
George Henrique	Gestor de obra
Carlos André	Pedreiro
Vlaicon José	Ajudante
João Pedro	Ajudante
Carlos Rodrigo	Ajudante

Fabricação e instalação de grades de proteção para janelas.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass: 

01/11/23

Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA ALEGRE		DATA 02/11/2023
Contrato: 071/2023		DECORRIDO
FISCAL:		RESTANTE
		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	Continuação Fabricação e instalação de grades de proteção para janelas.
Jorge Henrique	Gestor de obra	
Carlos André	Pedreiro	
Maicon José	Ajudante	
João Pedro	Ajudante	
Carlos Rodrigo	Ajudante	
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	__/__/__	02/11/23

Rua Osvaldir Vicente Siqueira, 252, loja 09, Papucaia, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:
28.695-000
