

A empresa SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.836.428/0001-95, na presente data vem protocolar na Prefeitura Municipal de Bom Jardim/RJ os seguintes documentos referentes a 2ª medição do contrato proveniente da Tomada de Preços n.º 001/2021:

- Certidões;
- Planilha de medição;
- Relatório com a descrição diária dos serviços;
- Relatório de fotos;
- Nota Fiscal;

Bom Jardim/RJ, 01 de setembro de 2021.

Valteci Evangelista de Carvalho
Diretor Comercial
CPF 787 984 697-20

CNPJ: 11.836.428/0001-95
I.E.: 87.170.136
SERD SERV SERVIÇOS
E COMÉRCIO EIRELI
Av. Walter Vendas Rodrigues, nº 18
Novo Mundo - CEP: 28660-000
BOM JARDIM - RJ

PROT. Nº	6753
NUMERO	6753
ENT 01 DE	09 DE 2021
PROTOCOLISTA	

Av. Walter Vendas Rodrigues, nº 18, Novo Mundo, Bom Jardim/RJ - CEP: 28.660-000.

Tel.: (22) 2566-2390 - E-mail: contato@serdserv.com.br - Site: www.serdserv.com.br

End: Av. Walter Vendas Rodrigues, nº 18, Bairro: Novo Mundo, Mun. Bom Jardim/RJ.
Tel: (22) 2566-2390
E-mail: contato@serdserv.com.br

CNPJ: 11.836.428/0001-95 - INSC. ESTADUAL: 87.17.01.36

Obra: E. Mz. CESA



E. M. CÉSAR MONTEIRO, E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS e E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS - Bom Jardim/RJ

2ª Medição

Date: 24/08/2021

DATA DE INICIO: 07/06/2021

PLANILHA DE SEGUNDA MEDIÇÃO

		ESCOLA ARMANDO JORGE									ELEMENTOS DA MEDIÇÃO	
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITARIO	CUSTO TOTAL	QUANTIDADES					
							MEDIÇÕES ANTERIORES	SERVIÇOS MEDIDOS	CUSTOS DA MEDIÇÃO			
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS												
1.2.1	01.050.0050-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPOA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	898,10	2,65	2.379,96	0,00	788,16	2.088,62			
1.2.2	01.050.0114-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	898,10	8,10	7.274,61	0,00	0,00	0,00			
1.2.3	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	260,27	260,27	1,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS									2.088,62			
1.3 - TRANSPORTES												
1.3.1	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	0,09	1.009,80	2.805,00	5.610,00	504,90			
1.3.2	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	374,00	0,50	187,00	93,50	187,00	93,50			
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES									598,40			
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.4.1	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1F,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	2,19	120,45	13,75	27,50	60,22			
1.4.2	05.006.0001-B	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XME\$	748,00	4,68	3.500,64	187,00	374,00	1.750,32			
1.4.3	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	4,33	1.619,42	93,50	187,00	809,71			
1.4.4	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	0,35	130,90	93,50	187,00	65,45			
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									2.685,70			
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									5.372,72			
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL												
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
2.4.1	05.001.0055-A	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	448,05	7,58	3.403,79	448,05	0,00	0,00			
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									0,00			
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
2.6.1	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	2,00	1.537,47	3.074,94	0,00	0,00	0,00			
2.6.2	12.003.0095-A	ALVENARIA DE TUIOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TUIOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M	M2	17,55	60,64	1.064,23	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									0,00			
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS												
2.7.1	13.001.0015-A	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3	M2	592,32	19,97	11.828,63	197,44	197,44	3.942,87			
2.7.2	13.030.0290-0	Revestimento de paredes com cerâmica, com medidas em torno de (32x57)cm, assente conforme item 13.025.0016	M2	103,80	77,57	8.051,76	47,60	56,20	4.359,43			
2.7.3	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR	M2	898,10	31,00	27.841,10	224,53	0,00	0,00			
2.7.4	13.365.0170-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	16,80	15,77	264,93	8,40	8,40	132,46			
									8.434,36			

2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS												
2.9.1	16.004.0050-A	Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	72,28	50,20	3.628,45	0,00		0,00		0,00	
2.9.2	16.004.0055-A	Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	72,28	23,39	1.690,62	12,00		0,00		0,00	
2.9.3	15.004.0061-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	2,00	214,94	429,88	0,00		1,00		214,94	
2.9.4	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBTUIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	8,00	205,01	1.640,08	6,00		0,00		0,00	
2.9.5	15.015.0035-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBTUIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	25,00	390,48	9.762,00	8,00		10,00		3.904,80	
2.9.6	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTUIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	25,00	201,61	5.040,25	8,00		10,00		2.016,10	
2.9.7	15.015.0280-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBTUIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	20,00	221,09	4.421,80	7,00		7,00		1.547,63	
2.9.8	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	4,83	338,10	18,00		33,00		159,39	
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS											7.842,86	
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES												
2.10.1	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	130,80	60,48	7.910,78	40,00		20,00		1.209,60	
2.10.2	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIALEXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	130,80	90,51	11.838,70	40,00		0,00		0,00	
2.10.3	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	15,00	18,50	277,50	5,00		0,00		0,00	
2.10.4	16.011.0005-A	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, inclusive madeiramento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m2	15,00	229,87	3.448,05	0,00		0,00		0,00	
2.10.5	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	179,62	74,39	13.361,93	89,00		90,62		6.741,22	
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES											7.950,82	
2.11 - PINTURAS												
2.11.1	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	47,04	11,25	529,20	11,76				0,00	
2.11.2	17.017.0300-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAIO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	120,00	12,52	1.502,40	20,00		0,00		0,00	
2.11.3	17.018.0080-A	Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	M2	1974,42	9,80	19.349,31	493,61		0,00		0,00	
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS											0,00	
2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS												
2.12.1	18.016.0030-A	BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2.00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.769,70	1.769,70	0,00		0,00		0,00	
2.12.2	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	374,17	748,34	0,00		0,00		0,00	
2.12.3	15.020.0155-A	LAMPADA LED,BULBO,A60/DY.8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	7,00	350,00	25,00		25,00		175,00	
2.12.4	18.260.0065-A	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	2,71	135,50	25,00		25,00		67,75	
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS											242,75	
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL											24.471,19	
SUBTOTAL (ARMANDO):											29.843,91	

2.9.1	16.004.0050-A	Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	34,18	50,20	1.715,83	0,00	0,00	0,00
2.9.2	16.004.0055-A	Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	34,18	23,39	799,47	0,00	0,00	0,00
2.9.3	15.004.0061-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	1,00	214,94	214,94	0,00	0,00	0,00
2.9.4	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBTUIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	8,00	205,01	1.640,08	6,00	2,00	410,02
2.9.5	15.015.0280-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBTUIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	253,94	2.539,40	10,00	0,00	0,00
2.9.6	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"x4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	65,00	4,83	313,95	35,00	20,00	96,60
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS									506,62
2.11 - PINTURAS/PORTAS/JANELAS									
2.11.1	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	52,08	11,25	585,90	26,00	26,08	293,40
2.11.2	14.002.0105-A	Basculante de ferro de 0,50 x 0,30m em cantoneira de 3/4" x 1/8",com uma báscula em cantoneira de 5/8" x 1/8", com alavanca de comando com punho cromado. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	324,52	649,04	2,00	0,00	0,00
2.11.3	14.002.0113-0	Janela com 4 módulos de basculantes de ferro, dispostos horizontalmente, enquadrados em estrutura de madeira de lei, sendo os módulos formados por elementos de 75 x 150cm, com 8 básculas, em caixilhos de cantoneira de 7/8" x 1/8", básculas de 3/4" x 1/2" e fixados em quadros de madeira de lei com 5 x 10cm de seção, exclusive peitoril. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	646,68	1.293,36	0,00	0,00	0,00
2.11.4	17.017.0300-8	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAOS DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	120,00	12,52	1.502,40	0,00	0,00	0,00
2.11.5	17.018.0080-0	Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	M2	3012,96	10,47	31.545,69	1.004,32	1.004,32	10.515,23
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS/PORTAS/JANELAS									10.808,63
2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS									
2.12.1	18.002.0090-A	Vaso sanitário de louça branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO	UN	2,00	339,37	678,74	0,00	0,00	0,00
2.12.2	15.004.0105-A	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões	UN	2,00	233,32	466,64	0,00	0,00	0,00
2.12.3	15.004.0063-A	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm e conexões	UN	2,00	118,18	236,36	0,00	0,00	0,00
2.12.4	18.002.0014-A	Idem item 18.002.0013, inclusive sifão em PVC flexível, válvula de escoamento cromada, rabicho em PVC, torneira de fechamento automático de parede, antivandalismo, de 85mm, para lavatório e acessórios de fixação	UN	2,00	341,26	682,52	0,00	0,00	0,00
2.12.5	18.016.0030-A	BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2.00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"x1.1/2", SOBRE APOIOSDE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.769,63	1.769,63	0,00	0,00	0,00
2.12.6	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"x1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	416,29	832,58	0,00	0,00	0,00
2.12.7	15.020.0155-A	LAMPADA LED,BULBO,A60,DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	7,00	350,00	50,00	0,00	0,00
2.12.8	18.260.0065-A	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	2,71	135,50	50,00	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS									0,00
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL									15.326,42
SUBTOTAL									20.465,52
ESCOLA CESAR MONTEIRO									
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					UNITARIO				TOTAL
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS									
1.2.1	01.050.0050-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.209,90	2,65	3.206,23	0,00	1.000,00	2.650,00
1.2.2	01.050.0114-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.209,90	8,10	9.800,19	0,00	0,00	0,00
1.2.3	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	260,27	260,27	1,00	0,00	0,00
									2.650,00
1.3 - TRANSPORTES									
1.3.1	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	0,09	1.009,80	2.805,00	8.415,00	757,35

1.3.2	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	374,00	0,50	187,00	93,50	280,50	140,25
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES									897,60
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.4.1	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1º, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPOORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	2,19	120,45	13,75	41,25	90,33
1.4.2	05.006.0001-B	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	748,00	4,68	3.500,64	187,00	561,00	2.625,48
1.4.3	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	4,33	1.619,42	93,50	280,50	1.214,17
1.4.4	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	0,35	130,90	93,50	280,50	98,17
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									4.028,54
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									7.576,14
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PRECIO PRINCIPAL									
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									
2.7.1	13.001.0015-A	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3	M2	534,61	19,97	10.676,16	133,65	400,96	8.007,12
2.7.2	17.040.0022-0	Repintura de quadra sobre demarcação existente conforme o item 17.040.0021	M2	360,00	23,82	8.575,20	0,00	360,00	8.575,20
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									16.582,32
2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS									
2.9.1	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	205,01	2.050,10	0,00	10,00	2.050,10
2.9.2	15.015.0035-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	390,48	3.904,80	0,00	10,00	3.904,80
2.9.3	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	201,61	2.016,10	0,00	10,00	2.016,10
2.9.4	15.015.0280-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	221,09	2.210,90	0,00	0,00	0,00
2.9.5	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	4,83	193,20	0,00	40,00	193,20
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS									8.164,20
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES									
2.10.1	16.011.0050-A	Cobertura translúcida, cristal, branca leitosa ou cores básicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, com aditivo estabilizante contra degradação dos raios U.V., estruturada com véu interno de poliéster, espessura de 1,5mm, para uso onde se requer iluminação natural controlada e privilegia-se a resistência à luz difratada, larguras úteis entre 990mm e 1020mm, comprimento até 6,00m, inclusive os acessórios para fixação. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCACAO	M2	130,17	65,83	8.569,09	130,17	0,00	0,00
2.10.2	16.007.0023-A	Cumeeira em chapas de aço galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCACAO	M	30,00	41,10	1.233,00	30,00	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES									0,00
2.11 - PINTURAS									
2.11.1	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRES DEMAOES DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0300, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	47,04	11,25	529,20	23,52	23,52	264,60
2.11.2	17.017.0300-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOES DE ACABAMENTO	M2	120,00	12,52	1.502,40	90,00	30,00	375,60
2.11.3	17.018.0080-0	Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	M2	2673,06	10,68	28.548,28	1.300,00	1.373,06	14.664,28
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS									15.304,48
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PRECIO PRINCIPAL									40.051,00
SUBTOTAL (CESAR):									47.627,14
TOTAL:									97.936,54

B.D.I	20,73%			20.302,25
TOTAL GERAL:				118.238,82

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO			
	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO
REFORMA DAS ESCOLAS	R\$ 118.704,68	R\$ 97.936,57	R\$ 137.012,29
BDI 20,73%	R\$ 24.607,48	R\$ 20.302,25	R\$ 28.402,65
TOTAL	R\$ 143.312,16	R\$ 118.238,82	R\$ 165.414,94
TOTAL ACUMULADO	R\$ 143.312,16	R\$ 261.550,98	

BOLETIM DIÁRIO DE OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/RJ
CNPJ N.º: 28.561.041/0001-95

Obra: Serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de REFORMA DOS PRÉDIOS, E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS, situada na Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo, 1º Distrito- BJ, E. Mz. CÉSAR MONTEIRO, situada na Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim e E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS, situada na Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo, 1º Distrito de Bom Jardim.

Processo administrativo nº 0738/2021.

Tomada de Preços nº 001/2021, 26 de abril de 2021.

Contrato nº 051/2021, 27 de maio de 2021.

Unidade orçamentária:

Cód. Despesa: 4490.51.00

Programa de Trabalho n.º 0602.1236010501.014

Valor do contrato: R\$ 426.965,92 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Prazo inicial: 120 (cento e vinte) dias

Data de início: 07 de junho de 2021.

Data da conclusão: 07 de outubro de 2021

Fiscalização: Engenheiro civil Hudson Rodrigues de Souza – Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada: **SERD SERV SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

Endereço: Av. Walter Vendas Rodrigues, n.º 18, Nova Mundo, Bom jardim/RJ
– CEP: 28660-000.

CNPJ: 11.836.428/0001-95

Responsável técnico: VERGILIO LOPES DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA n.º: 1996120879

ART nº: 2020210110794

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 22 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

22/07/2021	Continuação da pintura das salas;
	Finalização do banheiro;
	Relocação de andaime.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 23 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
23/07/2021	Relocação de andaime;
	Pintura das paredes externas da unidade escolar;

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 26 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
26/07/2021	Continuação da pintura das salas;
	Pintura das portas;
	Pintura de corredor.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 27 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
27/07/2021	Pintura do refeitório;
	Continuação da pintura das salas;
	Continuação da pintura do corredor.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável Fiscal/Matricula	Contratada - Profissional Técnico Responsável
Hudson Rodrigues de Souza Engenheiro civil Mat. 10/6265 - SMPE	VERGILIO LOPES DE CARVALHO Engenheiro civil CREA n. °: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 28 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munc	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

28/07/2021

Continuação da pintura da parede do corredor;

Continuação da pintura de salas;

Pintura das paredes da cozinha.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
29/07/2021	Continuação da pintura das paredes do corredor;
	Pintura das colunas;
	Emboço das paredes;
	Colocação de massa branca nas paredes;
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 30 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
30/07/2021	Continuação do emboço das paredes;
	Pintura do teto;
	Pintura das paredes externas;
	Colocação de piso no banheiro do 2º pavimento;
	Continuação da colocação de massa branca nas paredes.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
02/08/2021	Continuação do emboço das paredes;
	Continuação da pintura das salas;
	Colocação de massa branca nas paredes.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 03 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

03/08/2021

Continuação do emboço das paredes;
Continuação da pintura das salas;
Colocação de massa branca nas paredes.

Continuação/Versão SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 04 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
04/08/2021	Pintura das janelas;
	Continuação da pintura das salas;
	Acabamento do refeitório.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 05 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

05/08/2021	Continuação da pintura das janelas;
	Continuação Pintura de sala;
	Pintura de porta.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 06 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
06/08/2021	Continuação da pintura das salas;
	Pintura de Portão;
	Continuação de pintura das janelas;
	Pintura das paredes da área externa.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 09 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
09/08/2021	Continuação da pintura das paredes da área externa;
	Deslocamento de andaime;
	Continuação de pintura das janelas.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 10 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
10/08/2021	Deslocamento de andaime;
	Continuação da pintura das paredes da área externa;
	Continuação de pintura das janelas.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 11 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
11/08/2021	Deslocamento de andaime;
	Continuação de pintura das janelas.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
12/08/2021	Deslocamento de andaime;
	Continuação de pintura das paredes da área externa;
	Continuação de pintura das janelas.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 13 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
13/08/2021	Continuação da pintura das paredes da área externa;
	Continuação de pintura das janelas.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 16 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
16/08/2021	Continuação da pintura das paredes da área externa;
	Continuação de pintura das janelas.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º. 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 17 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

17/08/2021	Continuação da pintura das paredes da área externa;
	Continuação de pintura das janelas.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 18 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munc	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
18/08/2021	Continuação da pintura das paredes da área externa;
	Continuação de pintura das janelas;
	Relocação de andaime.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

19/08/2021

Continuação da pintura das paredes da área externa;
Continuação de pintura das janelas.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 20 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
20/08/2021	Continuação da pintura das paredes da área externa;
	Continuação de pintura das janelas;
	Pintura de porta;
	Construção de rampa.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

23/08/2021

Continuação da pintura das janelas;
Colocação de portas;
Limpeza do corredor;
Limpeza do telhado;
Colocação de massa fina no refeitório.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

Local: Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo - 1º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 24 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	1	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Guincho	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:

Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

24/08/2021

Limpeza do corredor;
 Pintura das paredes externas do refeitório;
 Pintura da estrutura de ferro da varanda;
 Colocação de alisar.

Continuação/Verso

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

BOLETIM DIÁRIO DE OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/RJ
CNPJ N.º: 28.561.041/0001-95

Obra: Serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de REFORMA DOS PRÉDIOS, E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS, situada na Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo, 1º Distrito- BJ, E. Mz. CÉSAR MONTEIRO, e E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS, situada na Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo, 1º Distrito de Bom Jardim.

Processo administrativo nº 0738/2021.

Tomada de Preços nº 001/2021, 26 de abril de 2021.

Contrato nº 051/2021, 27 de maio de 2021.

Unidade orçamentária:

Cód. Despesa: 4490.51.00

Programa de Trabalho n.º 0602.1236010501.014

Valor do contrato: R\$ 426.965,92 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Prazo inicial: 120 (cento e vinte) dias

Data de início: 07 de junho de 2021.

Data da conclusão: 07 de outubro de 2021

Fiscalização: Engenheiro civil Hudson Rodrigues de Souza – Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada: **SERD SERV SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

Endereço: Av. Walter Vendas Rodrigues, n.º 18, Nova Mundo, Bom jardim/RJ
– CEP: 28660-000.

CNPJ: 11.836.428/0001-95

Responsável técnico: VERGILIO LOPES DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA n.º: 1996120879

ART nº: 2020210110794

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 22 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

22/07/2021

Continuação da pintura da área externa da escola;
Continuação da limpeza da quadra esportiva para pintura;
Continuação da pintura dos mastros do pátio;
Limpeza da tela de alambrado da quadra esportiva.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGÍLIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 23 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
23/07/2021	Continuação da pintura da área externa da escola;
	Continuação da limpeza da quadra esportiva para pintura;
	Limpeza da rampa de acesso ao 2º pavimento;
	Continuação da limpeza da tela de alambrado da quadra esportiva.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável Fiscal/Matrícula	Contratada - Profissional Técnico Responsável
Hudson Rodrigues de Souza Engenheiro civil Mat. 10/6265 – SMPE	VERGILIO LOPES DE CARVALHO Engenheiro civil CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 26 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
26/07/2021	Acabamento da pintura próximo ao telhado e da rampa de acesso ao 2º pavimento;
	Continuação da limpeza da quadra esportiva para pintura;
	Pintura da rampa de acesso ao 2º pavimento;
	Limpeza das arquibancadas da quadra esportiva para pintura.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 27 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

27/07/2021

Colocação de pingadeira solta e troca de telha no telhado;

Limpeza do muro da frente da escola para pintura;

Continuação da colocação de manta acrílica na calha;

Finalização da limpeza das arquibancadas da quadra esportiva para pintura.

Continuação/Verso

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 28 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
28/07/2021	Início da pintura do chão da quadra esportiva;		
	Pintura do refeitório;		
	Pintura da trave da quadra esportiva;		
	Continuação da limpeza do muro da frente da escola para pintura.		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
29/07/2021	Finalização da limpeza do muro da frente da escola para pintura.		
	Limpeza do toldo;		
	Início da pintura do muro da frente da escola (parte externa);		
	Lixamento e pintura da arquibancada da quadra esportiva.		
Continuação/Verso		SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º. 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 30 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:

Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

30/07/2021

Continuação da pintura do muro da frente da escola (parte externa);

Limpeza da travessia de água da escada do pátio.

Continuação/Verso

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 03 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

03/08/2021

Continuação da pintura do muro da frente da escola (parte interna);

Continuação da pintura da arquibancada da quadra esportiva.

Remoção das plantas que estavam impedindo a pintura do muro.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 04 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
04/08/2021	Reparo das partes danificadas da coluna;		
	Reparo das áreas danificadas da quadra de esporte;		
	Continuação da pintura da quadra de esporte;		
	Continuação da pintura do muro;		
	Limpeza da tela de alambrado.		
		Continuação/Verso	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 05 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

05/08/2021

Continuação de limpeza e roçada da área verde;

1ª demão de pintura nas portas.

Continuação/Verso

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 06 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

06/08/2021

Continuação de limpeza e roçada da área verde;

Pintura com resina da passarela de acesso ao 2º pavimento.

Continuação/Verso

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 09 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:

Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

09/08/2021

Lixamento das portas;

Pintura das portas.

Continuação/Verso

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 10 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

10/08/2021

Colocação das portas;

Continuação da pintura da quadra esportiva.

Continuação/Verso

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 11 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
11/08/2021	Continuação da colocação das portas e ferragens;		
	Continuação da pintura da quadra esportiva.		
	Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
12/08/2021	Continuação da colocação das portas e ferragens;		
	Pintura das calçadas ao redor da escola;		
	Continuação da pintura da quadra esportiva.		
		Continuação/Verso	SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 13 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

13/08/2021

Continuação da colocação das portas e ferragens;

Pintura das calçadas ao redor da escola;

Continuação da pintura da quadra esportiva.

Continuação da
pintura da quadra
esportiva.

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 16 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
16/08/2021	Continuação da colocação das portas e ferragens;		
	Pintura das calçadas ao redor da escola;		
	Continuação da pintura da quadra esportiva.		
	Continuação da pintura da quadra esportiva.	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 17 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:

Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

17/08/2021

Lixamento e pintura das portas novas;

Reparo elétrico do 1º pavimento (instalação de pontos de luz);

Marcação da quadra esportiva.

Continuação da
pintura da quadra
esportiva.

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 18 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

18/08/2021

Continuação do lixamento e pintura das portas novas;

Continuação do reparo elétrico do 1º pavimento (instalação de tomadas);

Continuação da marcação da quadra esportiva.

Continuação da
pintura da quadra
esportiva.

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

19/08/2021

Continuação do lixamento e pintura das portas novas;

Continuação do reparo elétrico do 1º pavimento (instalação de tomadas);

Continuação da marcação da quadra esportiva.

Continuação da
pintura da quadra
esportiva.

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 20 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

20/08/2021

Finalização do lixamento e pintura das portas novas;

Reparo elétrico e instalação de 2 refletores na quadra esportiva;

Finalização da marcação da quadra esportiva.

Continuação da
pintura da quadra
esportiva.

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo Bom Chuvisco Impróprio Observações a previsão do tempo na semana:

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

23/08/2021

Pintura de marcação no pátio para distanciamento social, conforme orientação do Ministério da saúde.

Continuação da
pintura da quadra
esportiva.

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

Local: Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim.

DATA: 24 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	1
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	0	Meio-Oficial	1
Armador	0	Servente	2
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	1	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	0

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
24/08/2021	Limpeza e remoção dos entulhos provenientes da reforma.		
		Continuação da pintura da quadra esportiva.	SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

BOLETIM DIÁRIO DE OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/RJ
CNPJ N.º: 28.561.041/0001-95

Obra: Serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de REFORMA DOS PRÉDIOS, E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS, situada na Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo, 1º Distrito- BJ, E. Mz. CÉSAR MONTEIRO, situada na Rua Crésio Coelho Caetano, s/n, Alto de São José, 2º Distrito de Bom Jardim e E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS, situada na Av. Walter Vendas Rodrigues, 18 - Bairro Novo Mundo, 1º Distrito de Bom Jardim.

Processo administrativo nº 0738/2021.

Tomada de Preços nº 001/2021, 26 de abril de 2021.

Contrato nº 051/2021, 27 de maio de 2021.

Unidade orçamentária:

Cód. Despesa: 4490.51.00

Programa de Trabalho n.º 0602.1236010501.014

Valor do contrato: R\$ 426.965,92 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Prazo inicial: 120 (cento e vinte) dias

Data de início: 07 de junho de 2021.

Data da conclusão: 07 de outubro de 2021

Fiscalização: Engenheiro civil Hudson Rodrigues de Souza – Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada: **SERD SERV SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

Endereço: Av. Walter Vendas Rodrigues, n.º 18, Nova Mundo, Bom jardim/RJ
– CEP: 28660-000.

CNPJ: 11.836.428/0001-95

Responsável técnico: VERGILIO LOPES DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA n.º: 1996120879

ART n.º: 2020210110794

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 22 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
22/07/2021	Continuação do emboço nas paredes;
	Continuação da pintura das salas.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 23 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
23/07/2021	Lixamento e reboco das salas;
	Pintura de portal e portas.
Continuação/Verso	
SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n. °: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 26 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
26/07/2021	Continuação do lixamento e reboco das salas;		
	Continuação da pintura de portal e portas.		
		Continuação/Verso	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 27 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

27/07/2021

Continuação do lixamento e reboco das salas;

Corte de parede da sala da diretoria para instalação de caixas de tomada e dutos para passagem dos fios;

Continuação da pintura de portal e portas.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo – 1º Distrito- BJ.

DATA: 28 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
28/07/2021	Continuação do lixamento e reboco das salas;
	Finalização da pintura de portal e portas;
	Corte de parede da sala da 1ª sala do 1º pavimento para instalação de caixas de tomada e dutos para passagem dos fios.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável Fiscal/Matricula	Contratada - Profissional Técnico Responsável
Hudson Rodrigues de Souza Engenheiro civil Mat. 10/6265 – SMPE	VERGILIO LOPES DE CARVALHO Engenheiro civil CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 29 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	0	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

29/07/2021

Continuação do lixamento e reboco das salas;

Retirada de revestimento da cozinha;

Retirada de reboco da cozinha.

Continuação/Verso

SIM

NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 30 DE JULHO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

30/07/2021

Finalização do lixamento e reboco da parte interna das salas;
Início de instalação de suporte para lâmpadas no 1º pavimento;
Instalação elétrica das tomadas da cozinha.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

02/08/2021	Acabamento com massa corrida nas salas de aula no 1º pavimento;
	Instalação de lâmpadas no 1º pavimento;
	Início de reparo elétrico no 1º pavimento.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 03 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão MuncK	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
03/08/2021	Continuação do acabamento com massa corrida nas salas;			
	Continuação da instalação de lâmpadas no 1º pavimento;			
	Continuação de reparo elétrico no 1º pavimento.			
		Continuação/Verso	SIM	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 04 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
04/08/2021	Continuação do acabamento de pintura das salas.			
	Início do lixamento e preparo das portas do 1º pavimento.			
<table border="1"><tr><td>Continuação/Verso</td><td>SIM</td><td>NÃO</td></tr></table>		Continuação/Verso	SIM	NÃO
Continuação/Verso	SIM	NÃO		

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 05 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo Bom Chuvoso Impróprio Observações a previsão do tempo na semana:

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

05/08/2021	Colocação de soleira nas portas;
	Continuação do acabamento de pintura das salas;
	Continuação do lixamento e preparo das portas do 1º pavimento.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 06 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

06/08/2021	Finalização da colocação de soleira nas portas;
	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Substituição de portas do 1º pavimento.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 09 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:		
09/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;		
	Retirada de revestimento da dispensa;		
	Montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento.		
		Continuação/Verso	NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 10 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
10/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Retirada de entulho proveniente da demolição do revestimento da dispensa;
	Corte de parede para passagem de tubulação elétrica para instalação de tomadas.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- B.J.

DATA: 11 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
-------	---

11/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Emboço da dispensa;
	Instalação das caixas de tomada

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879



DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

12/08/2021

Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;

Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;

Continuação do emboço da dispensa.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 13 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

13/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Preparo das paredes da dispensa com aplicação de selador.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 16 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

16/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Preparo com massa corrida da dispensa.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 17 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:			
17/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;			
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;			
	Continuação do preparo com massa corrida da dispensa.			
<table border="1"><tr><td>Continuação/Verso</td><td>SIM</td><td>NÃO</td></tr></table>		Continuação/Verso	SIM	NÃO
Continuação/Verso	SIM	NÃO		

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 16 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
16/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Lixamento das paredes da dispensa.
Continuação/Verso SIM NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matrícula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 17 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

17/08/2021

Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;

Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;

Pintura das paredes da dispensa.

Continuação/Verso SIM NÃO

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 18 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

18/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Continuação da pintura das paredes da dispensa.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
19/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Emboço da sala da diretoria.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n - Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 20 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
20/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Continuação do emboço da sala da diretoria.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/Matricula

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 - SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munk	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data:	Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:
23/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Preparo das paredes da sala da diretoria com seladora.
Continuação/Verso	
SIM	
NÃO	

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatriculaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879

DESENVOLVIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Página:

Obra: Serviços de engenharia para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e execução da obra, de reforma do prédio da E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

Local: Rua Professor Romildo Cariello s/n – Bem-te-vi Amarelo - 1º Distrito- BJ.

DATA: 24 DE AGOSTO DE 2021

REGISTROS DA CONTRATADA

OCORRÊNCIAS

Tempo	Bom	Chuvoso	Impróprio	Observações a previsão do tempo na semana:
-------	-----	---------	-----------	--

Manhã	X			Nenhuma observação
Tarde	X			
Noite	X			

Visita Técnica da Contratante	0	Falhas de serviços de terceiros	0
Consulta à Fiscalização	0	Acidentes ocorridos	0
Resposta à Fiscalização	0	Outros:	

EQUIPE DISPONÍVEL (Quantidade)

Engenheiro	1	Serralheiro/Soldador	0
Mestre de obra/Encarregado	1	Motoristas	0
Pedreiro	1	Meio-Oficial	0
Armador	0	Servente	3
Carpinteiro	0	Auxiliar Técnico/Apontador	0
Pintor	0	Bombeiro	0
Eletricista	1	Vigia/Outros:	

EQUIPAMENTO APROPRIADO (Quantidade)

Caminhão basculante	0	Caminhão Munck	0
Caminhão carroceria fixa	0	Betoneira	0
Caminhonete	1	Serra circular/Vibrador	0
Veículo transp. Funcionário	0	Compactador de solo	0
Veículo apoio	0	Máquina de solda/Gerador	0
Retroescavadeira	0	Outros:	

Data: Anotações do desenvolvimento da obra/serviço - Descrição das ocorrências:

24/08/2021	Continuação da pintura das salas do 1º pavimento;
	Continuação da montagem e movimentação de andaime para pintura dos tetos do 1º pavimento;
	Aplicação de massa corrida para acabamento da sala de diretoria.

Continuação/Verso	SIM	NÃO
-------------------	-----	-----

Contratante - Profissional Responsável
Fiscal/MatrículaHudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil
Mat. 10/6265 – SMPE

Contratada - Profissional Técnico Responsável

VERGILIO LOPES DE CARVALHO
Engenheiro civil
CREA n.º: 1996120879



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

04 DE AGOSTO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

05 DE AGOSTO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

06 DE AGOSTO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

09 DE AGOSTO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

12 DE AGOSTO DE 2021.

95
LM





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

13 DE AGOSTO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

20 DE AGOSTO DE 2021.



59
M





FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

19 DE AGOSTO DE 2021.

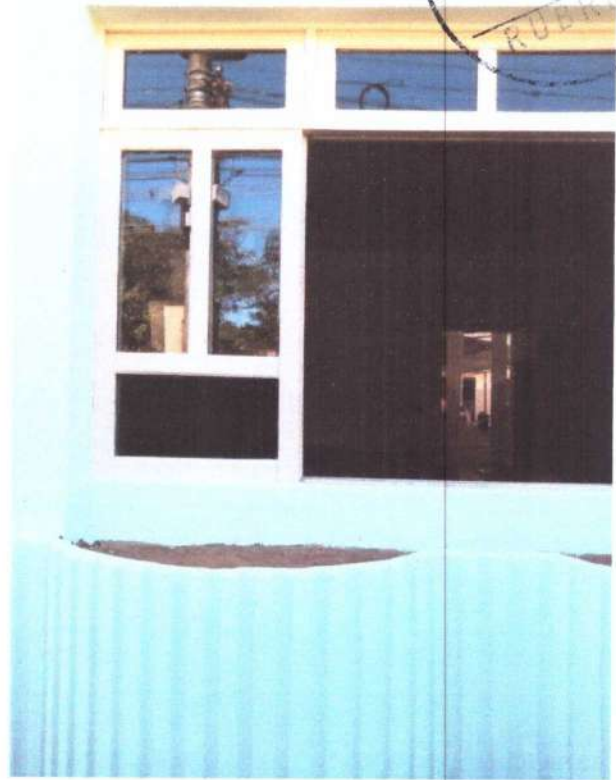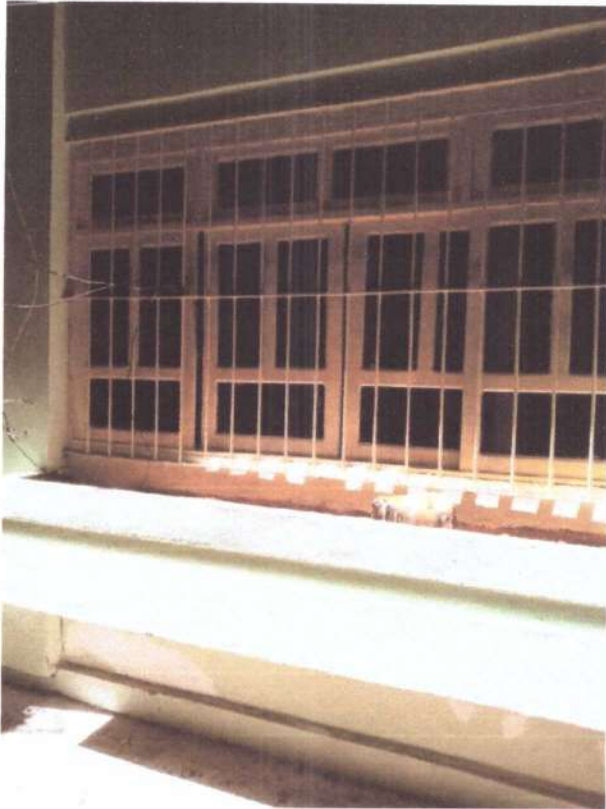

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

17 DE AGOSTO DE 2021.

Serd Serv

Prestação de Serviços

103
FIS. 10
ROBERTO







**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

18 DE AGOSTO DE 2021.

205
W



106
M

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

16 DE AGOSTO DE 2021.




108
M

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

11 DE AGOSTO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

10 DE AGOSTO DE 2021.

M
O



M2
at

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

02 DE AGOSTO DE 2021.

113
11



my
m

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

03 DE AGOSTO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

30 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

29 DE JULHO DE 2021.



120
M

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. IRACY MONNERAT DE LEMOS.

28 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

27 DE JULHO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

26 DE JULHO DE 2021.

125
RUBRICA



126
04

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

24 DE AGOSTO DE 2021.

127
LH





128
M






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

23 DE AGOSTO DE 2021.

Serd Serv

Prestação de Serviços


130
M
LUBRICAÇÃO

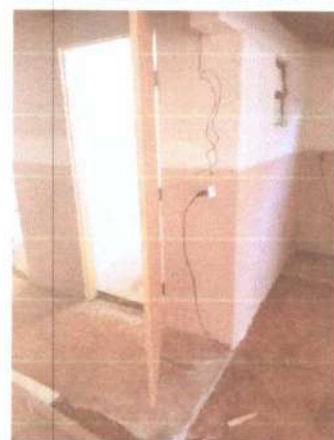



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

23 DE JULHO DE 2021.






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. IRACY
MONNERAT DE LEMOS.**

22 DE JULHO DE 2021.

136
at

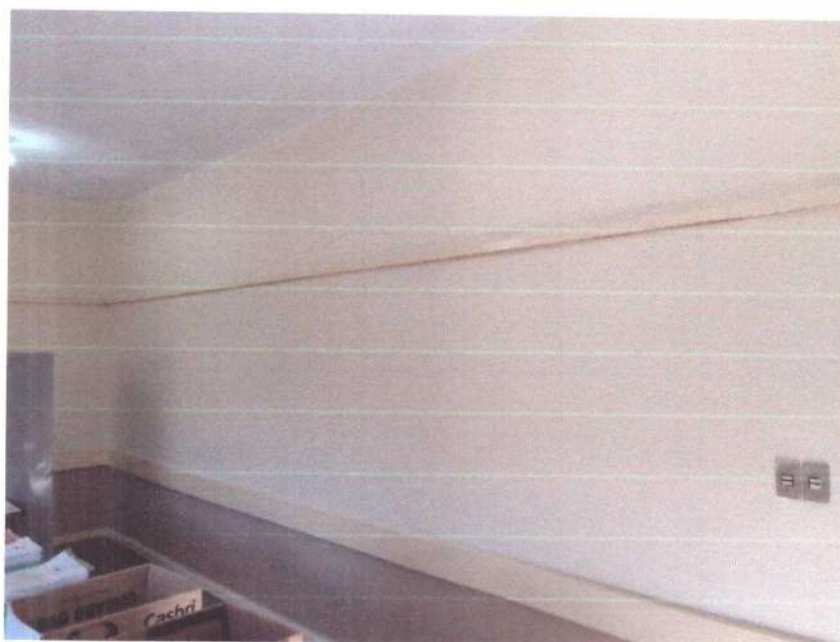

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

30 DE JULHO DE 2021.





FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.


23 DE AGOSTO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

24 DE AGOSTO DE 2021.

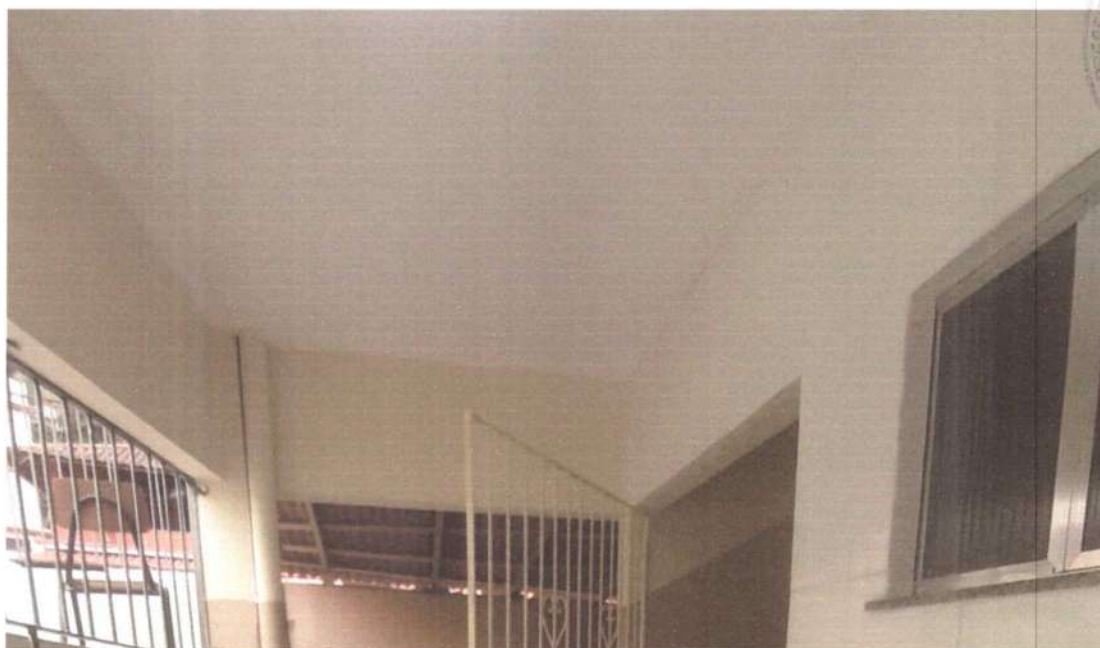

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

26 DE JULHO DE 2021.



143
21

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**


27 DE JULHO DE 2021.

144
LM



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**


28 DE JULHO DE 2021.

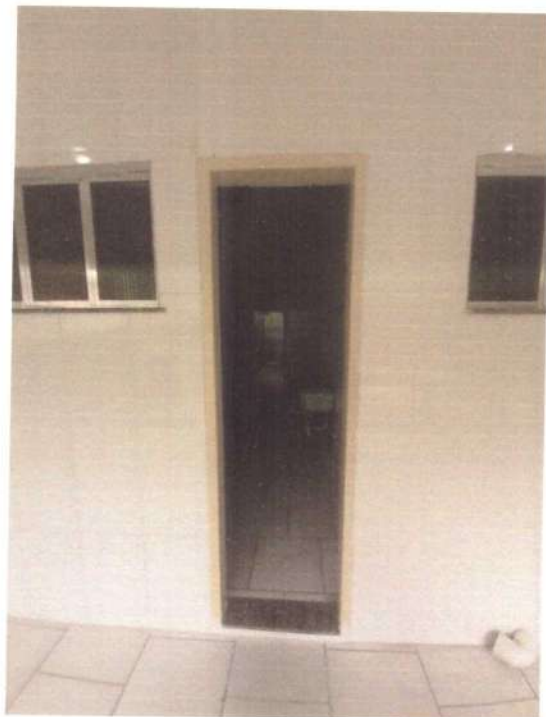



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

02 DE AGOSTO DE 2021.

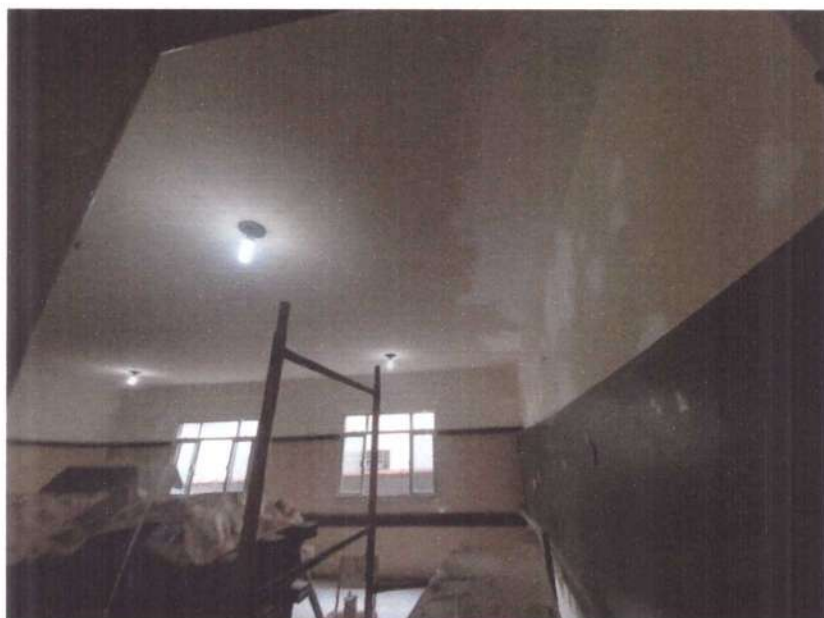

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

03 DE AGOSTO DE 2021.

159



157
27

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

04 DE AGOSTO DE 2021.

153
dy





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

05 DE AGOSTO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

06 DE AGOSTO DE 2021.



FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.


09 DE AGOSTO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

10 DE AGOSTO DE 2021.

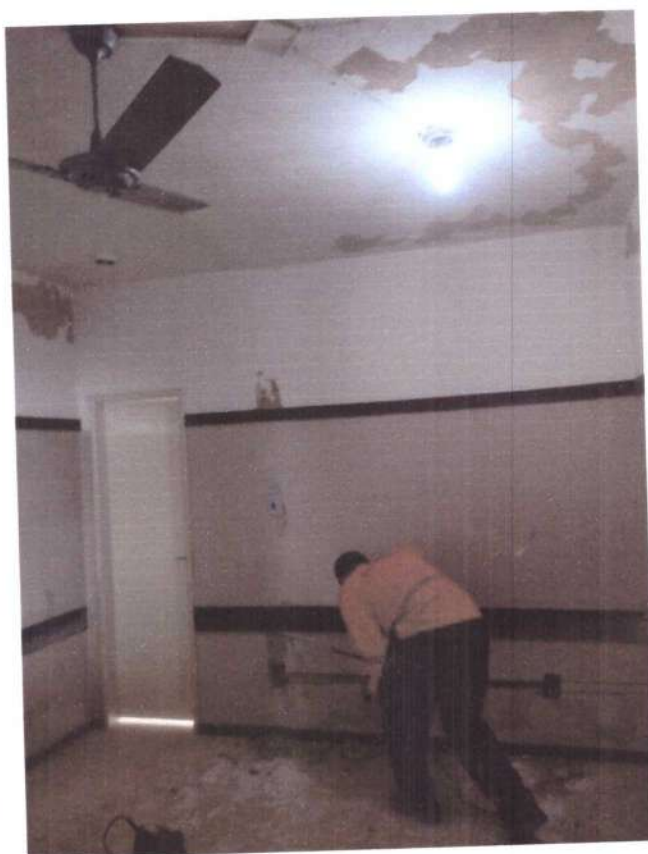



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

11 DE AGOSTO DE 2021.

162
M






**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

12 DE AGOSTO DE 2021.

16/4
Rodrigo

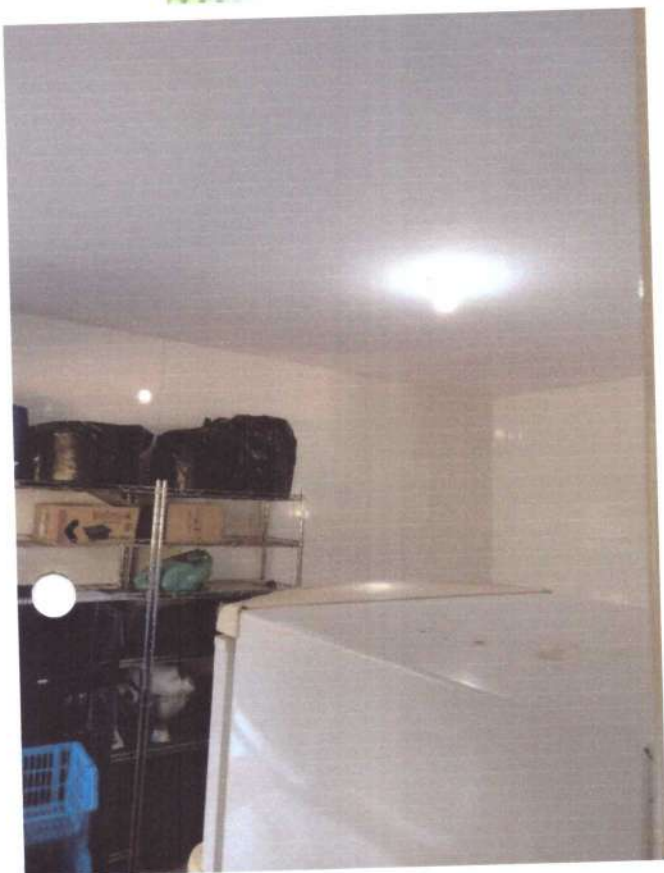

465
by

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.


13 DE AGOSTO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

16 DE AGOSTO DE 2021.

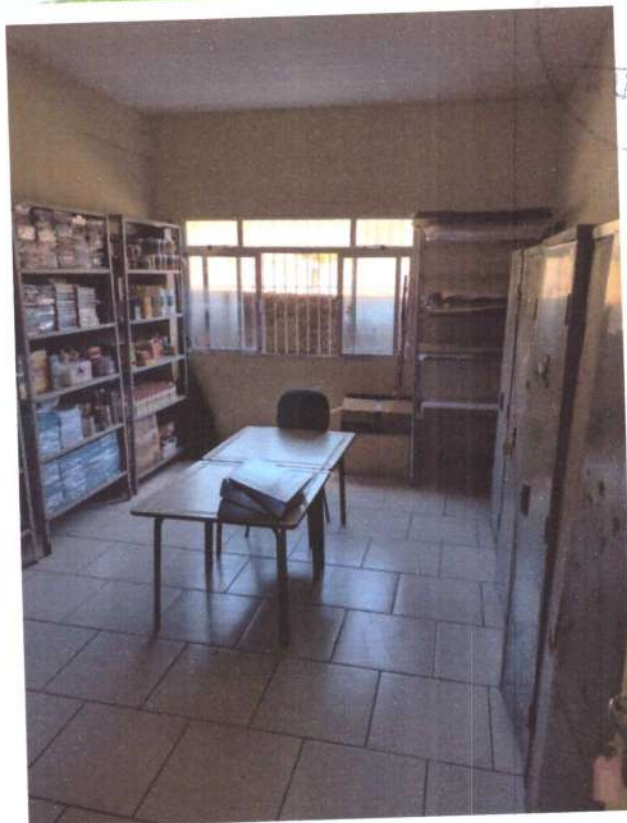


Av. Walter Vendas Rodrigues, Nº18, Novo Mundo, Bom Jardim/RJ - CEP: 28.660-000
Tel.: (22) 2566-2390 - E-mail: contato@serdserv.com.br - Site: www.serdserv.com.br

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.


17 DE AGOSTO DE 2021.

170
M

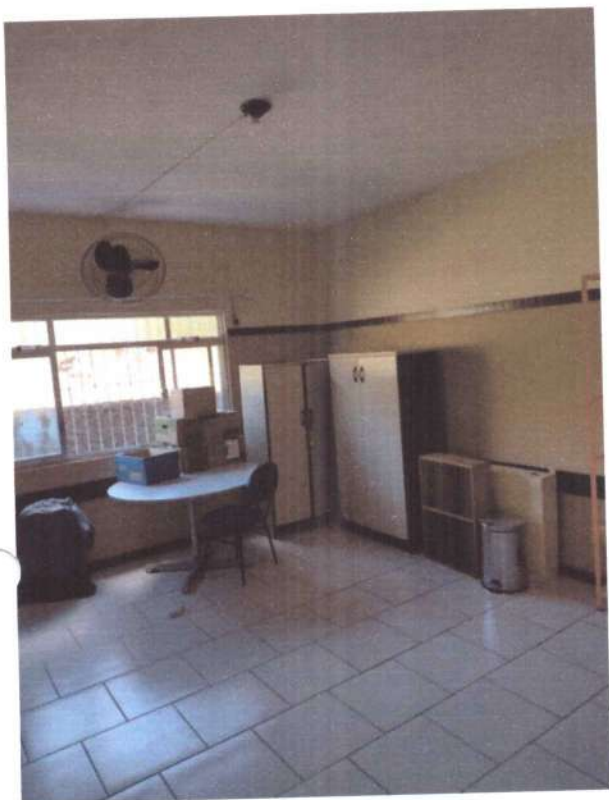

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

18 DE AGOSTO DE 2021.

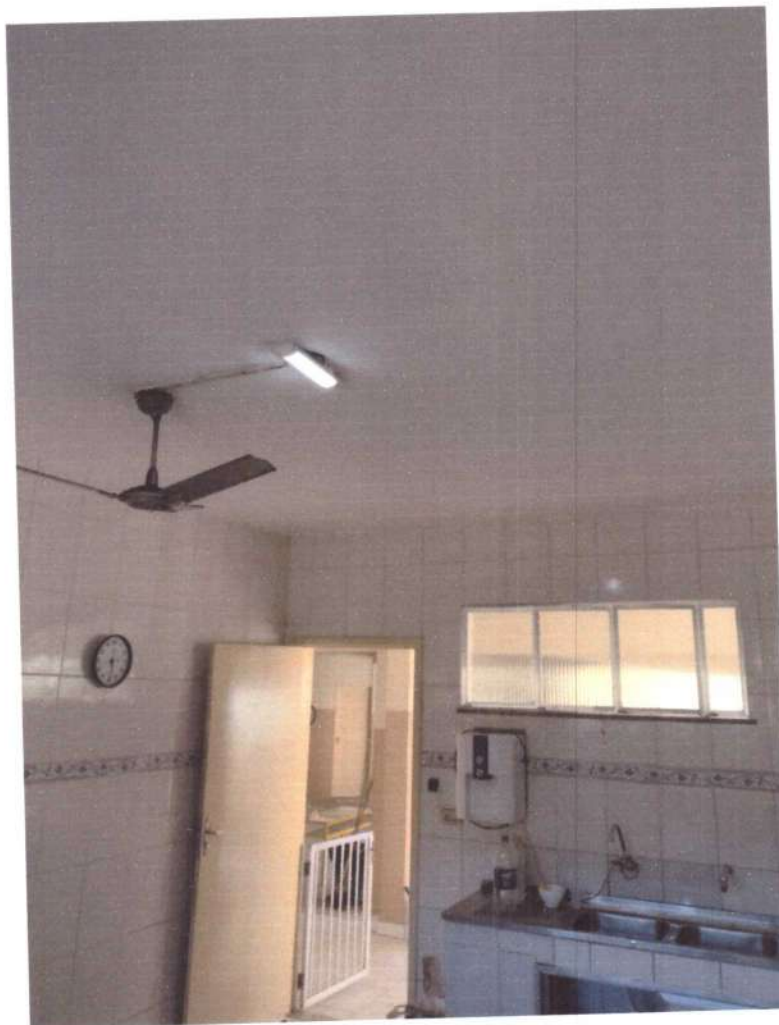




**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**


19 DE AGOSTO DE 2021.

174
04

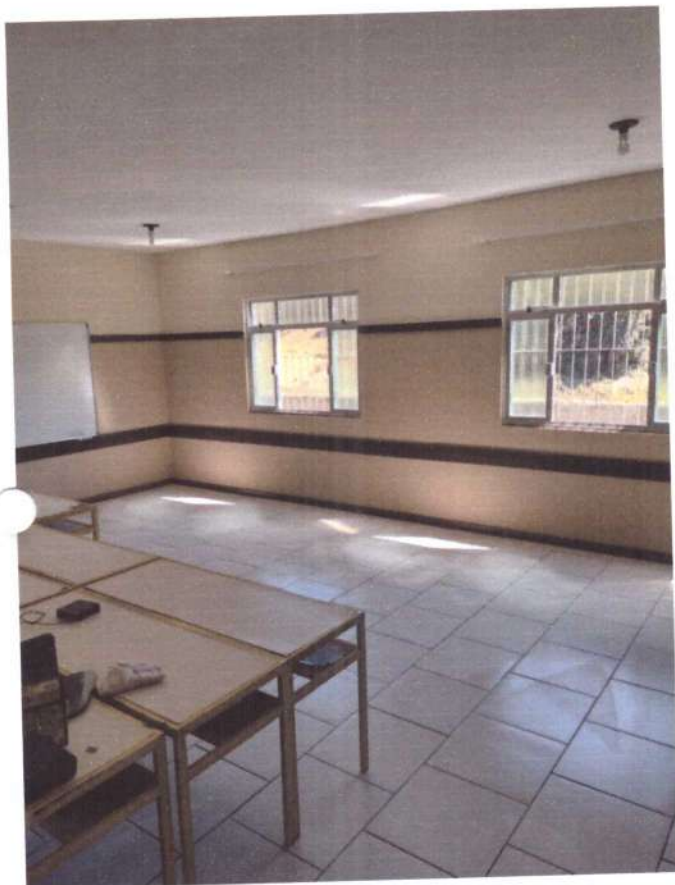

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO JORGE PEREIRA DE LEMOS.

20 DE AGOSTO DE 2021.

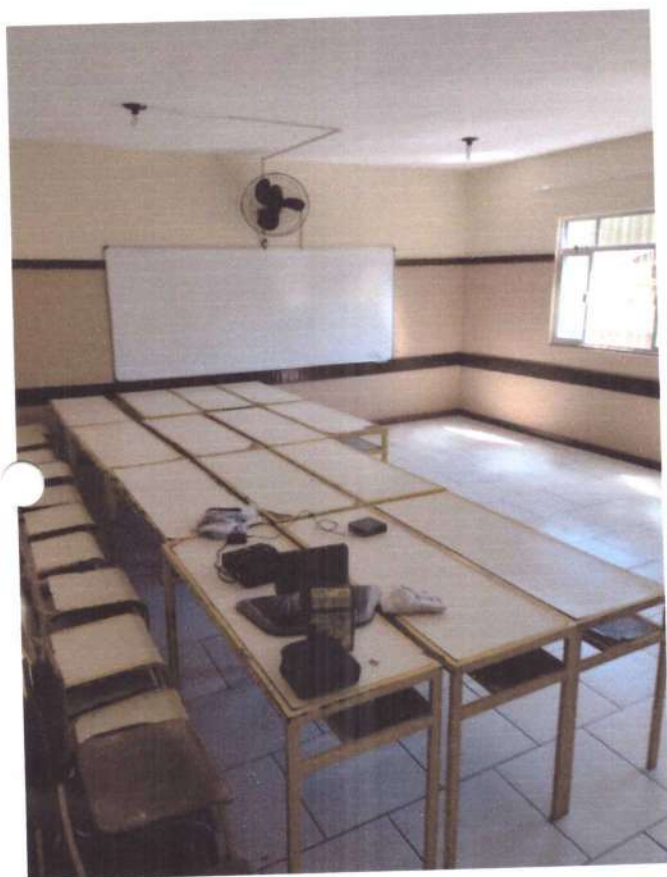



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

22 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**


23 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. M. ARMANDO
JORGE PEREIRA DE LEMOS.**

29 DE JULHO DE 2021.

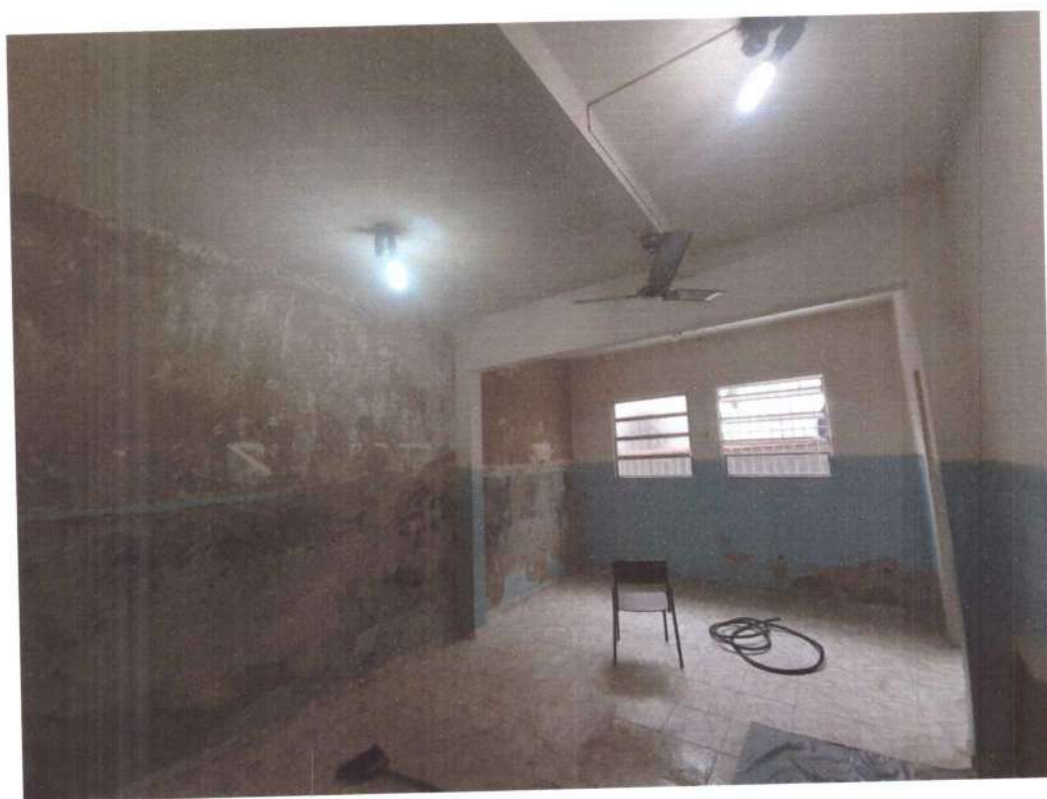




FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

30 DE JULHO DE 2021.

184
w

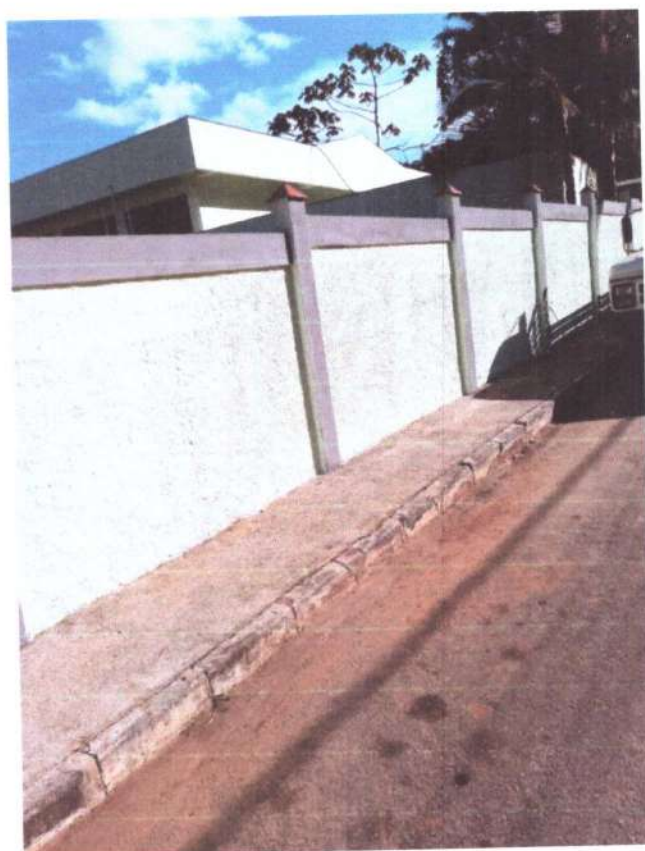

185
M

**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

29 DE JULHO DE 2021.

Serd Serv

Prestação de Serviços

186
W
LUBRIFICANTE





FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

28 DE JULHO DE 2021.





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

27 DE JULHO DE 2021.




191
M
TRUFECA

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

26 DE JULHO DE 2021.

Serd Serv

Prestação de Serviços

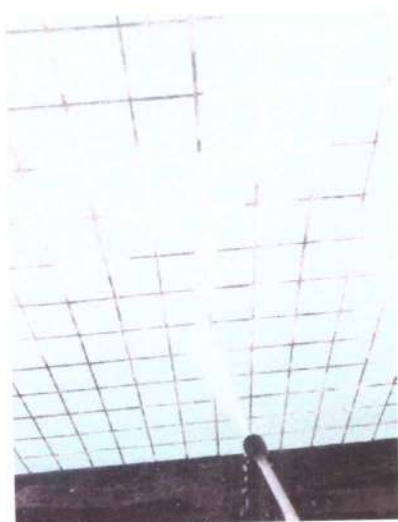



FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.


24 DE AGOSTO DE 2021.

194
LM




FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

23 DE AGOSTO DE 2021.

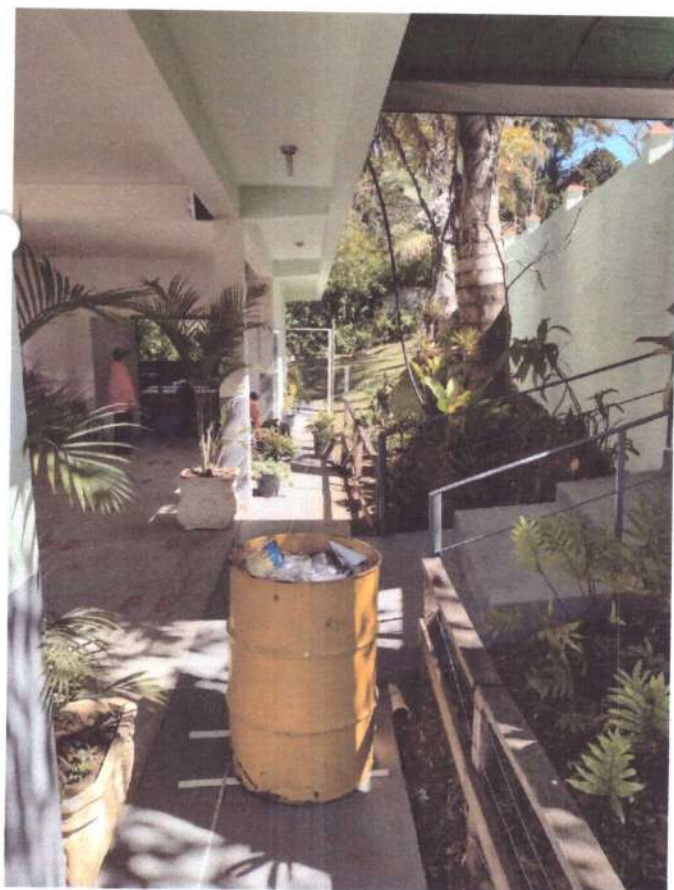

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

23 DE JULHO DE 2021.

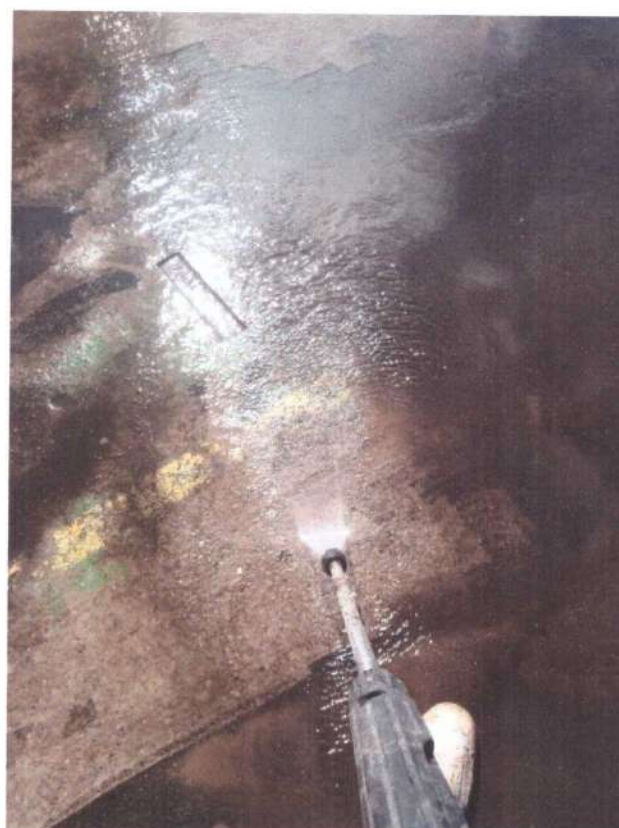

1999
Out



300
h

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

22 DE JULHO DE 2021.

201
af





FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

20 DE AGOSTO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

19 DE AGOSTO DE 2021.






FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

18 DE AGOSTO DE 2021.

208
04

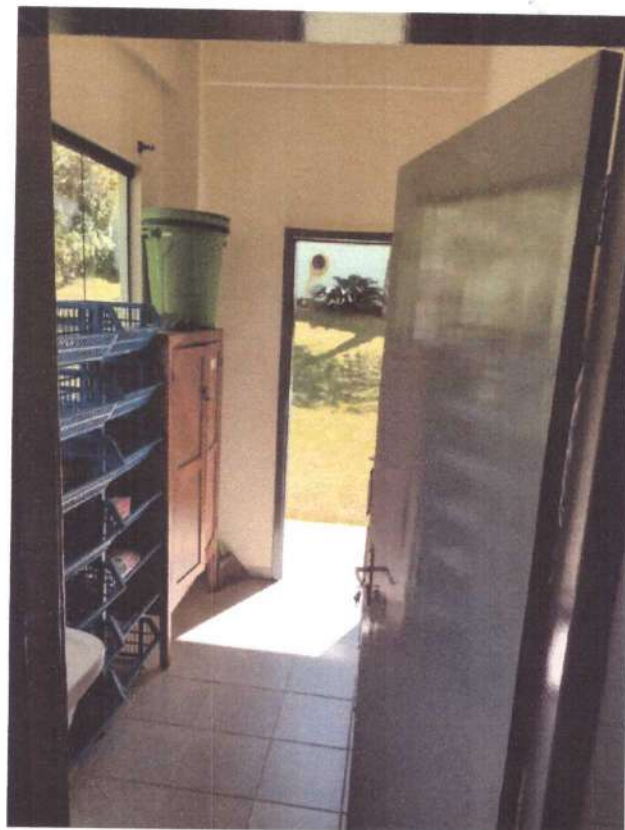

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

17 DE AGOSTO DE 2021.



FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

16 DE AGOSTO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

13 DE AGOSTO DE 2021.



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

12 DE AGOSTO DE 2021.





217
Al
SERRA

FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

11 DE AGOSTO DE 2021.

Serd Serv

Prestação de Serviços





**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

10 DE AGOSTO DE 2021.

Serd Serv


Prestação de Serviços



**FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA
DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR
MONTEIRO.**

09 DE AGOSTO DE 2021.

222
M

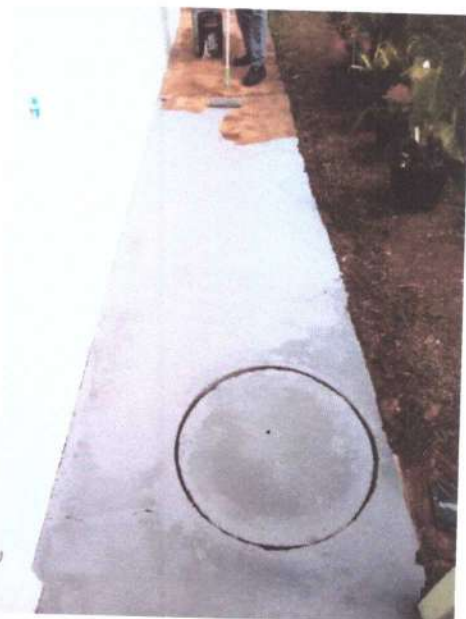

223
M


FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

06 DE AGOSTO DE 2021.

Serd Serv

Prestação de Serviços

224
2024



Av. Walter Vendas Rodrigues, Nº18, Novo Mundo, Bom Jardim/RJ - CEP: 28.660-000
Tel.: (22) 2566-2390 - E-mail: contato@serdserv.com.br - Site: www.serdserv.com.br



FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

05 DE AGOSTO DE 2021.





FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

04 DE AGOSTO DE 2021.






FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

03 DE AGOSTO DE 2021.

Serd Serv

Prestação de Serviços

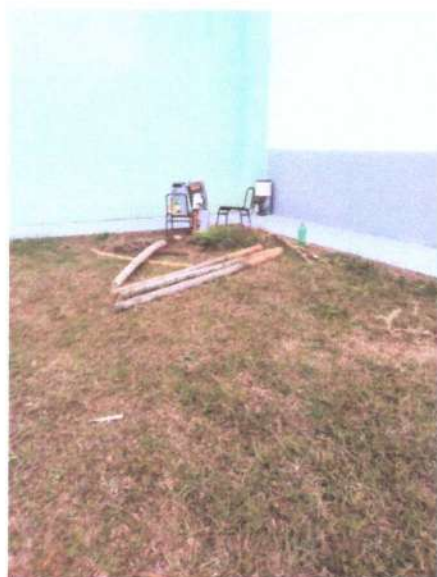



FOTOS DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E. Mz. CÉSAR MONTEIRO.

02 DE AGOSTO DE 2021.

