

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO - 01/11 A 13/11/23

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO,
SÃO MIGUEL, BOM JARDIM-RJ.

Contrato n.º 30/2023 Processo n.º 4335/2022



Reboco e telhado



Pintura do banheiro



Instalação elétrica



Instalação de postes com luminárias de led



Instalação de postes com luminárias de led



Instalação doquinho


Danilo Tiberto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102844




Instalação do parquinho



Instalação do parquinho (PCD)



Meio-fio e intertravado

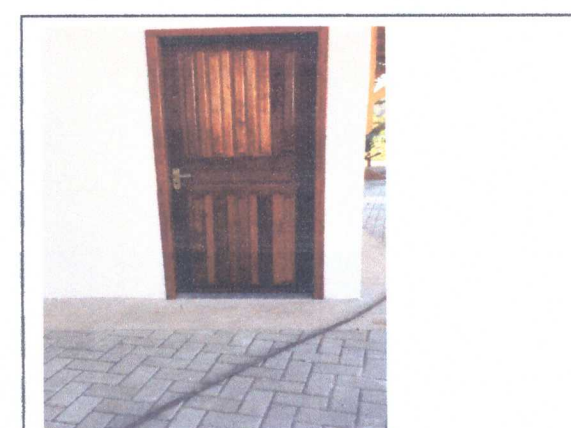

Colocação e envernizamento de porta



Assento de madeira no entorno do canteiro



Instalação de vaso sanitário e lavatório



Assentamento de intertravado



Instalação e pintura de guarda corpo



Assento de madeira no entorno do canteiro



Colocação de grama sintética



Assento de madeira no entorno do canteiro



Placa de obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	07	FOLHA:	08
CONTRATO n.º: 30/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 10/08/2023			
DIA DA SEMANA				
Quinta-Feira	01/06/2023	A	Sexta-Feira	02/06/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO BANHEIRO

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Danillo Tiberto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102846



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ				
		DIAS DE OBRA:	08	FOLHA:	09
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023			TEMPO: BOM X
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 10/08/2023			
DIA DA SEMANA					NUBLADO CHUVOSO
Segunda-Feira	05/06/2023	A	Sexta-Feira	09/06/2023	

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO BANHEIRO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Danilo Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102848



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	09	FOLHA:	10
CONTRATO n.º: 30/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 10/08/2023			
DIA DA SEMANA				
Segunda-Feira	12/06/2023	A	Sexta-Feira	16/06/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CIRCULAR

CONCRETAGEM DA AREA DO PARQUINHO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Danilo Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102848



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ				
		DIAS DE OBRA:	10	FOLHA:	11
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023			TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 10/08/2023			
DIA DA SEMANA					
Segunda-Feira	19/06/2023	A	Sexta-Feira	23/06/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

EXECUÇÃO DA COBERTURA DO BANHEIRO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Danilo Tiberto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102848



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ				
		DIAS DE OBRA: 11		FOLHA: 12	
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023			TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 10/08/2023			
DIA DA SEMANA					
Segunda-Feira	26/06/2023	A	Sexta-Feira	30/06/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA

EXECUÇÃO DA COBERTURA DO BANHEIRO

PASSAGEM DOS CONDUITES PARA INSTALAÇÃO ELETRICA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Danilo Tiberto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102848



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ					
		DIAS DE OBRA:		12	FOLHA: 13	
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:			10/04/2023	TEMPO: BOM X
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO:			10/08/2023	
DIA DA SEMANA						NUBLADO CHUVOSO
Segunda-Feira	03/07/2023	A	Sexta-Feira	07/07/2023		

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	0

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NA CALÇADA

ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA CALÇADA

PLANTIO DE PLANTAS E MUDAS DIVERSAS

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Danilo Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil
CPF RJ 2029102848



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ				
		DIAS DE OBRA: 13		FOLHA: 14	
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023			TEMPO: BOM X
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 10/08/2023			
DIA DA SEMANA					NUBLADO CHUVOSO
Segunda-Feira	10/07/2023	A	Sexta-Feira	14/07/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	0

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DO CONTRAPISO DO PARQUINHO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Barbosa Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102346



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ				
		DIAS DE OBRA: 14		FOLHA: 15	
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023			TEMPO: BOM X
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 10/08/2023			
DIA DA SEMANA					NUBLADO CHUVOSO
Segunda-Feira	17/07/2023	A	Sexta-Feira	21/07/2023	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	0

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Daniel Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil

CREA-RJ 2020102848



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ				
		DIAS DE OBRA: 15		FOLHA: 16	
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023			TEMPO: BOM X
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 10/08/2023			
DIA DA SEMANA					NUBLADO CHUVOSO
Segunda-Feira	24/07/2023	A	Sexta-Feira	28/07/2023	

MÃO DE OBRA	
<u>Função</u>	<u>Quant.</u>
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	0

EQUIPAMENTO	
<u>Descrição</u>	<u>Quant.</u>
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Danilo Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102348



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	16	FOLHA:	17
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 10/08/2023		
DIA DA SEMANA				
Segunda-Feira 31/07/2023				

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1
Servente	0

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PO DE PEDRA

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Dr. Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102348



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	17	FOLHA:	18
CONTRATO n.º: 30/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/11/2023			
DIA DA SEMANA				
Terça-Feira	01/08/2023	A	Sexta-Feira	04/08/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial (Pedreiro)	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Genildo Tibério da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2025102348



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	18	FOLHA:	19
CONTRATO	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO:		10/04/2023	
n.º: 30/2023	TÉRMINO P/ EXECUTIVO:		30/11/2023	
DIA DA SEMANA			TEMPO:	
Segunda-Feira	07/08/2023	A	Sexta-Feira	11/08/2023
			BOM X	
			NUBLADO	
			CHUVOSO	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Registo T32810 da Cunha
Registo T32810 da Cunha
GAE - RJ 2023102348



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	19	FOLHA:	20
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/11/2023		
DIA DA SEMANA				
Segunda-Feira	14/08/2023	A	Sexta-Feira	18/08/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Dezildo Tibério da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2025102248



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	20	FOLHA:	21
CONTRATO n.º: 30/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/11/2023			
DIA DA SEMANA				
Segunda-Feira	21/08/2023	A	Sexta-Feira	25/08/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Dr. Tiberio da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 202102248



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	21	FOLHA:	22
CONTRATO	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO:	
n.º: 30/2023	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/11/2023			
DIA DA SEMANA			BOM X	
Segunda-Feira	28/08/2023	A	Quinta-Feira	31/08/2023
			NUBLADO	
			CHUVOSO	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.
PLACA VIBRATORIA	1

Serviços realizados:

ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Carla Tibério de Souza
Engenheira Civil
CREA-RJ 202102348



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	22	FOLHA:	23
CONTRATO n.º: 30/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/11/2023			
DIA DA SEMANA Sexta-Feira 01/09/2023				

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial	1
Eletricista	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

INSTALAÇÃO DE ASSENTO DE MADEIRA E ENVERNIZAMENTO
INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINARIAS DE LED
INSTALAÇÃO SPOTS NO JARDIM
INSTALAÇÃO ELETRICA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Danilo Tibério de Castro
Engenheiro Civil
CREA-RJ 225102048

Fiscal da Obra



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	23	FOLHA:	24
CONTRATO n.º: 30/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/11/2023			
DIA DA SEMANA				
Segunda-Feira	04/09/2023	A	Sexta-Feira	08/09/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial	1
Eletricista	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

INSTALAÇÃO DE ASSENTO DE MADEIRA E ENVERNIZAMENTO

INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINARIAS DE LED

INSTALAÇÃO SPOTS NO JARDIM

INSTALAÇÃO ELETRICA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

CONSERVIT - TITULO 11 - OBRAS
BOM JARDIM - RJ
08/09/2023



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda
DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	24	FOLHA:	25
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/11/2023		
DIA DA SEMANA				
Segunda-Feira	11/09/2023	A	Sexta-Feira	15/09/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PARQUINHO (BALANÇO, GANGORRA E ESCORREGA

INSTALAÇÃO DO BALANÇO PCD

COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

PINTURA DO BANHEIRO E NO ENTORNO DO CANTEIRO CIRCULAR

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Emp. de Eng. de Constr.
Emp. de Eng. de Constr.
CNPJ nº 08.271.023/0001-90



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	25	FOLHA:	26
CONTRATO n.º: 30/2023		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
		TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/11/2023		
DIA DA SEMANA				
Segunda-Feira	18/09/2023	A	Sexta-Feira	22/09/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PARQUINHO (BALANÇO, GANGORRA E ESCORREGA)
INSTALAÇÃO DO BALANÇO PCD
COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA
PINTURA DO BANHEIRO E NO ENTORNO DO CANTEIRO CIRCULAR

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Danilo Tibério da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 108740224



CONSERVIT Construção e Conservação Ltda

DIÁRIO DE OBRA SEMANAL

OBRA:	Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ			
	DIAS DE OBRA:	26	FOLHA:	27
CONTRATO n.º: 30/2023	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 10/04/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO	
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 30/11/2023			
DIA DA SEMANA				
Segunda-Feira	25/09/2023	A	Sexta-Feira	29/09/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	1
Pedreiro	1
Servente	1
Meio-Oficial	1

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA
LIMPEZA GERAL DE OBRA

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Danilo Tibério da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 102102348



Bom Jardim-RJ, 02 de outubro de 2023.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário de Obras, confeccionado em meio digital, impresso em 2 vias, que terá a finalidade de registrar todo o desenvolvimento da obra de " Construção de Praça na Rua João Jacinto de Carvalho, São Miguel, Bom Jardim - RJ, Conforme Contrato n.º 30/2023 , Tomada de preço n.º 001/2023; entre a Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ e a Conservit Construção e Conservação LTDA.

10/04/2023 a 30/11/2023

Constou nos registros o efetivo da obra, quantidade de equipamento, serviços realizados e qualquer fato que se fizeram necessários para descrição dos eventos ocorridos durante a execução dos serviços.

Conservit Construção e Conservação LTDA

Danilo Tibério da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 1385102348

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ.
Fiscal da Obra - carimbo e matrícula



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO, SÃO MIGUEL, BOM JARDIM - RJ

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/11/2023 a 13/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		3,00	3º	REALIZADO		A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL			NO PERÍODO	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1 - PROJETOS E CANTIEIRO DE OBRA												
1.1.1	02.004.0006-A	BARRACAO OBRA CIVIL/SAO INTERNA, PESQUITORIO E ALUGUEIRO PISO TABUAS MADO 2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTACOLEAMENTO DE ALGUA 10MM MADO 3,7X4 1/2" PAREDES CHAPIS MADO COMPENSADO 10MM ALGUA 10MM ESP COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCEMENTO PINT E LUBACOSES PROVISORIAS REAPROVEITADO 5 VEZES ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MANTENIMENTO	M2	6,00	290,00	R\$ 1.740,00	0,00	0,00	6,00	1.740,00	0,00	0,00
1.1.2	02.020.0003-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA, PUBLICA TIPO BANHEIRO/OTTER CONSTITUIDA POR LOVA E IMPRESSAO DIGITAL EXCLUSIVE SUPORTE DEMADERA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	100,00	R\$ 100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
1.1.4	02.002.0005-A	TRAVESE DE VERGACAO OU PROTECCAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESURA DE 0,9MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRAPAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO ZVETES E PINTURA ESMALTE SINT NA FACE EXT	M2	90,00	30,00	R\$ 2.700,00	0,00	0,00	90,00	2.700,00	0,00	0,00
1.1.5	01.018.0001-A	MARCAÇÃO DE OBRA, SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO CONSIDERADA A P ROLECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	M	795,94	2,60	R\$ 2.089,44	795,94	2.089,44	795,94	2.089,44	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.609,44		R\$ 2.089,44		R\$ 6.609,44		R\$ 0,00
						R\$ 6.609,44		R\$ 2.089,44		R\$ 6.609,44		R\$ 0,00
2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL												
2.1 - ALVENARIA												
2.1.1	13.026.0011-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO	M2	40,80	50,00	R\$ 2.040,00	40,80	2.040,00	40,80	2.040,00	0,00	0,00
2.1.2	13.301.0125-B	BRANCO EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO CONTRAPISO BASE OU CAMADA REGULANIZADORA, EXECUTADA CARGO DE CIM E AREIA 1:4, ESP. DE 3CM	M2	93,00	25,00	R\$ 2.325,00	78,00	1.950,00	93,00	2.325,00	0,00	0,00
2.1.3	12.003.0006-A	ALVENARIA DE TUDOS CERCANOS PARADOS LIGANDOS CONCRETO COM 20% DE TUDOS DE 100X20X30MM/ASSENTOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SABRO MO DE TRACO 1:8EM PAREDES DE 20CM (20X20X20) DE SUPERFICIE CORRIDA/ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA BRUTA	M2	40,90	65,00	R\$ 2.658,50	-40,70	-2.645,50	40,90	2.658,50	0,00	0,00
						R\$ 7.023,50		R\$ 1.344,50		R\$ 7.023,50		R\$ 0,00
2.2 - ESTRUTURA												
2.2.1	11.003.0001-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,48	390,00	R\$ 4.477,20	0,00	0,00	11,48	4.477,20	0,00	0,00
2.2.2	11.013.0130-A	CONCRETO ARMADO FCK-50MPa, INCLUINDO MATERIAS PARA 1,00MM DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, ADENSADO E COLOCADO, 12,00MM DE AREIA MOIDA, 10MM DE CORTES, 0 ITEM 11.004.00.22.60MG DE ACCHO-50, INCL. MADO DE OBRA 195A, CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COL. DAS FORMAS EXCL. ESCORAMENTO	M3	4,59	1.700,00	R\$ 7.803,00	0,00	0,00	4,59	7.803,00	0,00	0,00
						R\$ 12.280,20		R\$ 0,00		R\$ 12.280,20		R\$ 0,00
2.3 - REVESTIMENTO												
2.3.1	13.002.0011-B	REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SABRO MACIO E AREIA FINA NO TRACO 1:3:3 COM ESP. DE 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM ESP. DE 6MM	M2	81,60	23,00	R\$ 1.876,80	0,00	0,00	81,60	1.876,80	0,00	0,00
						R\$ 1.876,80		R\$ 0,00		R\$ 1.876,80		R\$ 0,00

Danilo Tibério da Cunha
Engenheiro CREA
CREA-RJ 2020102848



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS



BOLETIM DE MEDIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO, SÃO MIGUEL, BOM JARDIM - RJ

ETAPA Nº: 3,00

MEDIÇÃO Nº: 3ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/11/2023 a 13/11/2023

REALIZADO

A REALIZAR

ITEM	CODIGO EMP	DESCRIÇÃO	UNIDARIO	TOTAL								
2.4 - PAVIMENTAÇÃO												
2.4.1	08.020.0008-A	PAVIMENTAÇÃO LAJOTAS CONCRETO ALTAMENTE VIBRADO INTERTRAVADO, COMBUSTIVEL, PRE-FABRICADOS, COR-NATURAL, ESP 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSÃO 30MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDEIRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, QUANTAS TOMADAS CARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 ECOL, C/REDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/FORMA DE TODOS OS MNT., SEM COMO A COLOCAC.	M2	675,06	72,00	R\$ 48.604,32	255,06	18.364,32	675,06	48.604,32	0,00	0,00
2.4.2	08.027.0042-A	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SAPES, FCK-10MPA, PREPARADO TIPO DER, RUMEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,15M, REFINAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ESCAVACAO E REBENTERO	M	73,70	50,00	R\$ 3.685,00	0,00	0,00	73,70	3.685,00	0,00	0,00
				Sub Total		R\$ 52.289,32		R\$ 18.364,32		R\$ 52.289,32		R\$ 0,00
2.5 - ESQUADRIAS												
2.5.1	14.002.0208-A	GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO COM MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL, PLAVETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	52,50	330,00	R\$ 17.325,00	52,50	17.325,00	52,50	17.325,00	0,00	0,00
2.5.2	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA DA NMS 2, FACES ADJELIA DE 130CM E ALIZARES DE 6X2CM EXCLUSIV E FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	2,00	546,36	R\$ 1.092,72	2,00	1.092,72	2,00	1.092,72	0,00	0,00
2.5.3	14.007.0036-A	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA DE 1 FOLHA DE ABRIR EXTERNA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SICOLOCACAO DE FERRAGENS EXTERNAS, INCLUSIVE O CABIMENTO CROMADO ACETINADO, MACANETA TIPO BOLA, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, ROSETA CIRCULAR EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, 3 DOBRADOS 7/32 EM LATÃO CROMADO COM PINOS BOLA E ANEIS DE LATÃO	UND	2,00	150,14	R\$ 300,28	2,00	300,28	2,00	300,28	0,00	0,00
2.5.4	14.003.0016-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER DUAS FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEL BASCUL ANTES EM PERFIS SERIE 28 FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,72	429,22	R\$ 309,04	0,72	309,04	0,72	309,04	0,00	0,00
2.5.5	13.348.0050-A	PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, SENDO COM LATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO SABRO E AREIA NO TRACO 1:3,3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	1,20	65,95	R\$ 79,14	1,20	79,14	1,20	79,14	0,00	0,00
2.5.6	13.348.0070-A	SOLERA EM GRANTO CINZA ANDORINHA ESPESSURA DE 2CM COM 2 PO LUMENTOS, LARGURA DE 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO SABRO E AREIA, NO TRACO 1:2,2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	1,60	49,74	R\$ 79,58	1,60	79,58	1,60	79,58	0,00	0,00
				Sub Total		R\$ 19.185,76		R\$ 19.185,76		R\$ 19.185,76		R\$ 0,00
2.6 - PINTURA												
2.6.1	17.017.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA CAMADA DE SELADOR ACRILICO, UMA CAMADA DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL	M2	81,60	16,00	R\$ 1.305,60	0,00	0,00	81,60	1.305,60	0,00	0,00

Engenheiro Civil

CR23-RJ 2023102848



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS



BOLETIM DE MEDIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO, SÃO MIGUEL, BOM JARDIM - RJ

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/11/2023 a 13/11/2023

ITEM	CODIGO EIMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ETAPA Nº:	MEDIÇÃO Nº:	PERÍODO DE REFERÊNCIA:					
					UNITARIO	TOTAL			De: 01/11/2023 a 13/11/2023					
2.6.2	17.018.0185-A	PINTURA COM TINTA ACRILICA, TEXTURIZADA, NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO PARA INTERIORES E EXTERIORES, EM DUAS DEMAS SOBRE CONCRETO ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CIMENTO SEM AMANTO OU REVESTIMENTO	M2	40,80	25,00	R\$ 1.020,00	3,00	3ª	40,80	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3	17.017.0380-A	PINTURA INTERNA, OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRANTE EM DUAS DEMAS APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA E UMA DEMAS DE TRINTANTOXIDO	M2	72,00	15,00	R\$ 1.080,00			72,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sub Total	R\$ 3.405,80			R\$ 2.100,00				R\$ 3.405,80	R\$ 0,00
2.7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS														
2.7.1	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10 A 30AX250V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	10,00	R\$ 30,00			0,00	0,00	3,00	30,00	0,00	0,00
2.7.2	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A 50AX250V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	35,00	R\$ 70,00			0,00	0,00	2,00	70,00	0,00	0,00
2.7.3	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 60 A 100AX250V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	120,00	R\$ 120,00			0,00	0,00	1,00	120,00	0,00	0,00
2.7.4	15.019.0065-A	TOmada ELÉTRICA 3P+1 20X250V PADRÃO BRASILEIRO DE EMBURUT COM PLACA 47X7 INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E 2 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE 10 A 30A, FORN. E COLOCAÇÃO	UN	1,00	70,00	R\$ 70,00			1,00	70,00	1,00	70,00	0,00	0,00
2.7.5	15.020.0080-A	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400W-110/220V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	50,00	R\$ 100,00			2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
2.7.6	15.020.0075-A	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 180W-110/220V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	14,00	35,00	R\$ 490,00			14,00	490,00	14,00	490,00	0,00	0,00
2.7.7	15.036.0070-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUELAVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	7,50	R\$ 750,00			0,00	0,00	100,00	750,00	0,00	0,00
2.7.8	15.036.0071-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUELAVEL DE 1" INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	30,00	10,00	R\$ 300,00			0,00	0,00	30,00	300,00	0,00	0,00
2.7.9	15.007.0208-A	FASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE DE 6X718MM, COM 1,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	70,00	R\$ 70,00			0,00	0,00	1,00	70,00	0,00	0,00
2.7.10	15.007.0405-A	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES, TERMOMAGNETICOS, BIPOLARES DE SOBREPOR COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	100,00	R\$ 100,00			0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.7.11	15.008.0065-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPRESSIVO, PREPARO, CORTE E ENFIAÇO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2 450/750V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	300,00	3,00	R\$ 900,00			0,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00
2.7.12	15.008.0090-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPRESSIVO, PREPARO, CORTE E ENFIAÇO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2 450/750V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	100,00	4,00	R\$ 400,00			0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00
2.7.13	15.008.0095-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPRESSIVO, PREPARO, CORTE E ENFIAÇO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 6MM2 450/750V FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	50,00	5,00	R\$ 250,00			0,00	0,00	50,00	250,00	0,00	0,00
2.7.14	18.027.0434-A	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL PARA LAMPADA INCANDESCENTE EXCLUSIVE ESTAB. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	9,00	45,00	R\$ 405,00			9,00	405,00	9,00	405,00	0,00	0,00
2.7.15	18.027.0143-A	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, PARQUES, PRAÇAS E LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO DE REFEITÓRIO, ESTAB. DE CHAPA DE ALUMINIO, REFRATÓRIO, PLÁSTICO EM VIDRO BORO SILICATO PARA LAMPADA MISTA VAPOR DE MERCÚRIO, VAPOR DE SÓDIO OU VAPOR METÁLICO ATÉ 250W, EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	360,00	R\$ 3.600,00			10,00	3.600,00	10,00	3.600,00	0,00	0,00
2.7.16	15.017.0315-A	TERMINAL MECÂNICO A COMPRESSÃO, FABRICADO EM COBRE PARA CABO DE 300MM2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	60,00	R\$ 480,00			8,00	480,00	8,00	480,00	0,00	0,00

Engenheiro Civil
02/01/2023 10:08:48



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS



BOLETIM DE MEDIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOÃO JACINTO DE CARVALHO, SÃO MIGUEL, BOM JARDIM - RJ

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/11/2023 a 13/11/2023

ITEM	CODIGO ENOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ETAPA Nº:	MEDIÇÃO Nº:	REALIZADO			
					UNITARIO	TOTAL			3,00		3ª	
2.8.6	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 510MMOS CULTURA DE 1,31M MADEIRA APARELHADA, ETIQUETAS DE FERRO GALVANIZADO E INTERMEDIATE 3/4" E 2" ESPESSURA DE 1/4" E 1/2" COM PINTURA DE BASE GALVATE E 2" DEMOS DE ACABAMENTO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	3.500,00	R\$ 3.500,00	1,00	3.500,00	1,00	3.500,00	0,00	0,00
2.8.7	09.015.0330-A	GANCHOS DE 510MMOS C/2 PRANCHAS MADEIRA APARELHADA, ESTAFIADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E INTERMEDIATE DE 2 1/2" E 2" ESPESSURA DE PAREDE DE 1/4" COM PINTURA DE BASE GALVATE E 2" DEMOS DE ACABAMENTO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.500,00	R\$ 2.500,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00
2.8.8	09.014.0015-A	MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS TUBO DE MADEIRA EM MADEIRITE ARMADO NA COR NATURAL, TENDO NO CENTRO O BASTILHO DE MADEIRITE EM MADEIRITE NAS CORES BRANCA E PRETA/FAZENDA E BANCOS DE CONCRETO ARMADO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.200,00	R\$ 2.400,00	2,00	2.400,00	2,00	2.400,00	0,00	0,00
2.8.9	16.001.0056-A	MADERAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS ABUSOS EM TELHAS CERAMICAS CONSTITUIDO DE CAMEIRA, TENCAS, RINCOS E ESPALHOS DE 3/4" 1/2" CABROS DE 3/4" 1/2" RIPAS DE 1/2" 1/2" TUDO EM MADEIRITE APARELHADA, SEM TESSURA OU CONTRATELHE, MEDIO TELA AREA REAL DO MADERAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,00	120,00	R\$ 1.800,00	15,00	1.800,00	15,00	1.800,00	0,00	0,00
2.8.10	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUIVE CAMEIRA E MADERAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,00	110,00	R\$ 1.650,00	15,00	1.650,00	15,00	1.650,00	0,00	0,00
2.8.11	16.002.0015-A	CAMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCISAS, COLONIAIS ROMANOU PORTUGUESA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4,00	20,00	R\$ 80,00	4,00	80,00	4,00	80,00	0,00	0,00
2.8.12	06.001.0100-A	GRAMA SINTETICA EUROPEIA EM ROLLOS COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO NA COR VERDE INCLUISE O LANTERNO DE OBRAS ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FIOS DE GRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO REGULAR ZACAO COM AREA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCA L DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	78,00	83,05	R\$ 6.477,90	78,00	6.477,90	78,00	6.477,90	0,00	0,00
2.8.13	14.006.0445-A	DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA COM ASSOALHO MEDIO APROX 14MM, MADEIRITE ESPECIALIZADA LONGITUDINAL DE 70X15CM TRANSVERSA IS DE 10X15CM GUARDA CORPO COMPOSTO DE PEÇAS DE 15X15CM E 20 X25CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,86	553,52	R\$ 2.136,56	3,86	2.136,56	3,86	2.136,56	0,00	0,00
TOTAL DOTITEM 2.8 - CONSTRUÇÃO GERAL					Sub Total	R\$ 37.429,84		R\$ 37.429,84		R\$ 37.429,84		R\$ 0,00
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL	R\$ 161.304,89		R\$ 161.304,89		R\$ 161.304,89		R\$ 0,00
BDI 20,73%						R\$ 33.416,50		R\$ 33.416,50		R\$ 33.416,50		R\$ 0,00
TOTAL GERAL:						R\$ 194.723,39		R\$ 194.723,39		R\$ 194.723,39		R\$ 0,00

David Thiago da Cunha
Engenheiro CIVIL
CREA-RJ 2020162848
