

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
 LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:

De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1 - PROJETO												
1.1.2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES	M2	263,40	13,00	3.424,20	0,00	0,00	0,00%	263,40	3.424,20	100,00%
1.1.3	01.050.0091-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES	M2	263,40	20,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00%	263,40	5.268,00	100,00%
1.1.4	01.050.0102-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	263,40	20,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00%	263,40	5.268,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO						13.960,20		0,00			13.960,20	
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS												
1.2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	265,65	32,00	8.500,80	265,65	8.500,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	01.006.0010-0	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	263,40	1,60	421,44	263,40	421,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	263,40	15,00	3.951,00	263,40	3.951,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,00	440,00	1.760,00	4,00	1.760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS						14.633,24		14.633,24			0,00	
1.3 - TRANSPORTES												
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11.220,00	0,15	1.683,00	0,00	0,00	0,00%	11.220,00	1.683,00	100,00%
1.3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	374,00	0,70	261,80	0,00	0,00	0,00%	374,00	261,80	100,00%
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES						1.944,80		0,00			1.944,80	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:

De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							REALIZADO			A REALIZAR		
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	5,00	275,00	0,00	0,00	0,00%	55,00	275,00	100,00%
1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	1.122,00	10,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00%	1.122,00	11.220,00	100,00%
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	6,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00%	374,00	2.244,00	100,00%
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	0,50	187,00	0,00	0,00	0,00%	374,00	187,00	100,00%
1.4.5	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRIÇÃO EM PLOTTER COM AS DIMENSÕES DE 0,40X0,60M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	475,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.401,00		0,00			14.401,00	
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						44.939,24		14.633,24			30.306,00	
2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL							REALIZADO			A REALIZAR		
2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO							REALIZADO			A REALIZAR		
2.1.1	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSÃO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO, DIÂMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO	M	60,00	120,00	7.200,00	60,00	7.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	01.008.0050-0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAAGEM E PERFURAÇÃO A PERCUSSÃO, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	1,00	7.000,00	7.000,00	1,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	01.018.0002-0	LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR	M	82,80	20,00	1.656,00	82,80	1.656,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO						15.856,00		15.856,00			0,00	
2.2 - MOVIMENTO DE TERRA							REALIZADO			A REALIZAR		
2.2.1	03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	291,39	53,00	15.443,67	150,00	7.950,00	51,48%	141,39	7.493,67	48,52%
TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA						15.443,67		7.950,00			7.493,67	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
 LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.3 - TRANSPORTES												
2.3.1	04.005.0123-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	8.741,40	1,40	12.237,96	1.456,90	2.039,66	16,67%	7.284,50	10.198,30	83,33%
TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES						12.237,96	2.039,66			10.198,30		
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
2.4.2	16.034.0003-0	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS,MACICOS,SEM A PRESENÇA DE CAL,COM ABSORCAO DE UMIDADE DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE),EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS,CONSUMO DE 2KG/M2,QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO,COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO	M2	78,63	115,00	9.042,45	0,00	0,00	0,00%	78,63	9.042,45	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						9.042,45	0,00			9.042,45		
2.5 - PAVIMENTAÇÃO												
2.5.1	09.001.0002-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATAAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA R	M2	301,78	20,00	6.035,60	0,00	0,00	0,00%	301,78	6.035,60	100,00%
2.5.3	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,95	500,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00%	9,95	4.975,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAÇÃO						11.010,60	0,00			11.010,60		
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
2.6.1	11.013.0130-0	CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	27,84	2.200,00	61.248,00	10,00	22.000,00	35,92%	17,84	39.248,00	64,08%
2.6.3	11.030.0020-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 EVAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURANEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=20MPA	M2	263,40	R\$ 158,00	41.617,20	0,00	0,00	0,00%	263,40	41.617,20	100,00%
2.6.5	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,73	2.000,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00%	0,73	1.460,00	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
 LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.6.8	12.005.0020-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	180,00	80,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00%	180,00	14.400,00	100,00%
2.6.9	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M	M2	886,50	88,00	78.012,00	0,00	0,00	0,00%	886,50	78.012,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						196.737,20		22.000,00			174.737,20	
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS												
2.7.1	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3	M2	1.773,00	29,00	51.417,00	0,00	0,00	0,00%	1.773,00	51.417,00	100,00%
2.7.2	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	222,43	49,50	11.010,28	0,00	0,00	0,00%	222,43	11.010,28	100,00%
2.7.4	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	315,88	28,00	8.844,64	0,00	0,00	0,00%	315,88	8.844,64	100,00%
2.7.5	13.301.0125-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	M2	263,40	28,00	7.375,20	0,00	0,00	0,00%	263,40	7.375,20	100,00%
2.7.6	13.380.0011-0	PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA	M2	222,43	70,00	15.570,10	0,00	0,00	0,00%	222,43	15.570,10	100,00%
2.7.7	13.036.0015-0	RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO EAREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	262,10	57,00	14.939,70	0,00	0,00	0,00%	262,10	14.939,70	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.7.8	13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	31,80	70,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00%	31,80	2.226,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						111.382,92		0,00			111.382,92	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:

De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS												
2.8.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,60	917,00	8.803,20	0,00	0,00	0,00%	9,60	8.803,20	100,00%
2.8.2	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00	620,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00%	25,00	15.500,00	100,00%
2.8.3	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,32	425,00	12.036,00	0,00	0,00	0,00%	28,32	12.036,00	100,00%
2.8.4	14.007.0338-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	134,00	100,00%
2.8.5	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO	UN	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	116,00	100,00%
2.8.6	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE SERVICIO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:- FECHADURADE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAO,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO	UN	24,00	230,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00%	24,00	5.520,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						42.109,20		0,00			42.109,20	
2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS												
2.9.1	15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTOJOS GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(1,00X0,50X1,80)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP	UN	1,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.150,00	100,00%
2.9.2	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	170,00	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.3	15.002.0096-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO	UN	1,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.100,00	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
 LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.4	15.002.0630-0	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	4.700,00	100,00%
2.9.5	15.002.0665-0	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	8.300,00	100,00%
2.9.6	15.004.0061-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	5,00	347,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	1.735,00	100,00%
2.9.7	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES	UN	13,00	155,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00%	13,00	2.015,00	100,00%
2.9.8	15.004.0133-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PORTE DE UM CONJ.DE DOISOU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	1.250,00	100,00%
2.9.9	15.004.0180-0	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	135,00	675,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	675,00	100,00%
2.9.10	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	73,00	146,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	146,00	100,00%
2.9.11	15.007.0214-0	SUORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	105,00	100,00%
2.9.12	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	36,00	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.13	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,00	455,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	1.820,00	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:

De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.14	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	11,00	77,00	0,00	0,00	0,00%	7,00	77,00	100,00%
2.9.15	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	31,00	310,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	310,00	100,00%
2.9.16	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	115,00	100,00%
2.9.17	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	5,60	840,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	840,00	100,00%
2.9.18	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	8,20	820,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	820,00	100,00%
2.9.19	15.008.0105-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	11,00	550,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	550,00	100,00%
2.9.20	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	600,00	100,00%
2.9.21	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	15,00	300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	15,00	4.500,00	100,00%
2.9.22	15.015.0035-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	578,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00%	7,00	4.046,00	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.23	15.015.0050-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	738,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	3.690,00	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
 LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.24	15.015.0171-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES	UN	7,00	385,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00%	7,00	2.695,00	100,00%
2.9.25	15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	34,00	290,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00%	34,00	9.860,00	100,00%
2.9.26	15.015.0280-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	40,00	315,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	12.600,00	100,00%
2.9.27	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EM MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00	595,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.190,00	100,00%
2.9.28	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	450,00	100,00%
2.9.29	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	77,00	616,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	616,00	100,00%
2.9.30	15.029.0014-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	115,00	690,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	690,00	100,00%
2.9.31	15.036.0031-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	20,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	2.000,00	100,00%
2.9.32	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00	9,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00%	120,00	1.080,00	100,00%
2.9.33	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	75,00	14,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00%	75,00	1.050,00	100,00%
2.9.34	15.036.0045-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	80,00	12,00	960,00	0,00	0,00	0,00%	80,00	960,00	100,00%
2.9.35	15.036.0048-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00	25,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	1.500,00	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.36	15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	50,00	18,00	900,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	900,00	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
 LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.37	15.007.0204-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	100,00	100,00%
2.9.38	21.028.0015-0	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA ATERRAMENTO,CONDUTORES DE 6 - 35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	23,00	92,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	92,00	100,00%
2.9.39	21.003.0057-0	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM SAPATA.FORNECIMENTO	UN	1,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.400,00	100,00%
2.9.40	15.011.0015-0	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,10KVA E 24KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DUSJUNTOR POLIFASICO (ATE 100A) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECESSARIOS,EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES	M	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	380,00	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						81.313,00		0,00			81.313,00	
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES												
2.10.1	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	263,40	114,00	30.027,60	0,00	0,00	0,00%	263,40	30.027,60	
2.10.2	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIOS/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	263,40	63,00	16.594,20	0,00	0,00	0,00%	263,40	16.594,20	
2.10.3	16.005.0008-0	CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	40,00	64,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	2.560,00	
2.10.4	16.007.0025-0	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	103,46	74,00	7.656,04	0,00	0,00	0,00%	103,46	7.656,04	
2.10.5	16.004.0055-A	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	103,46	59,00	6.104,14	0,00	0,00	0,00%	103,46	6.104,14	
2.10.6	16.011.0005-0	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL,COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,76	420,00	3.259,20	0,00	0,00	0,00%	7,76	3.259,20	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.10.7	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	81,80	116,00	9.488,80	0,00	0,00	0,00%	81,80	9.488,80	
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						75.689,98		0,00			75.689,98	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:

De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.11 - PINTURAS												
2.11.1	17.017.0370-0	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHOOU ACETINADO,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE MADEIRAS EMETAIS,AREAS INTERNAS OU EXTERNAS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR	M2	58,95	39,00	2.299,05	0,00	0,00	0,00%	58,95	2.299,05	100,00%
2.11.2	17.018.0265-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USOHOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSAACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB	M2	1777,47	37,00	65.766,39	0,00	0,00	0,00%	1.777,47	65.766,39	100,00%
2.11.3	17.025.0010-A	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS	M2	263,40	4,90	1.290,66	0,00	0,00	0,00%	263,40	1.290,66	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS						69.356,10		0,00			69.356,10	
2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS												
2.12.1	18.002.0030-A	TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO	UN	8,00	418,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	3.344,00	
2.12.2	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	5,00	539,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	2.695,00	
2.12.3	18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	33,00	561,00	0,00	0,00	0,00%	17,00	561,00	
2.12.4	18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	33,00	561,00	0,00	0,00	0,00%	17,00	561,00	
2.12.5	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPARADE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXACAO.FORNECIMENTO	UN	5,00	777,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	3.885,00	
2.12.6	18.006.0050-0	PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	120,00	
2.12.7	18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	134,00	
2.12.8	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	5,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	150,00	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
 LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 De: 05/06/2023 a 30/11/2023

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.12.9	18.016.0035-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	2.370,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	11.850,00	
2.12.10	18.016.0110-A	BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO 60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	270,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	5.400,00	
2.12.11	15.020.0155-0	LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00	7,80	546,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	546,00	
2.12.12	18.260.0065-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	70,00	4,00	280,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	280,00	
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						29.526,00		0,00			29.526,00	
TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL						669.705,08		47.845,66			621.859,42	
TOTAL:						714.644,32		62.478,90			652.165,42	
B.D.I						22,41%	160.151,79	14.001,52			146.150,27	
TOTAL GERAL:						874.796,11		76.480,42			798.315,69	



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO - 05/06/23 A 30/11/23



PLACA DE OBRA



LOCAÇÃO DA OBRA



DEPOSITO DE MATERIAL



GABARITO



ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS



ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO - 05/06/23 A 30/11/23



CONCRETAGEM DAS SAPATAS



CONCRETAGEM DAS SAPATAS

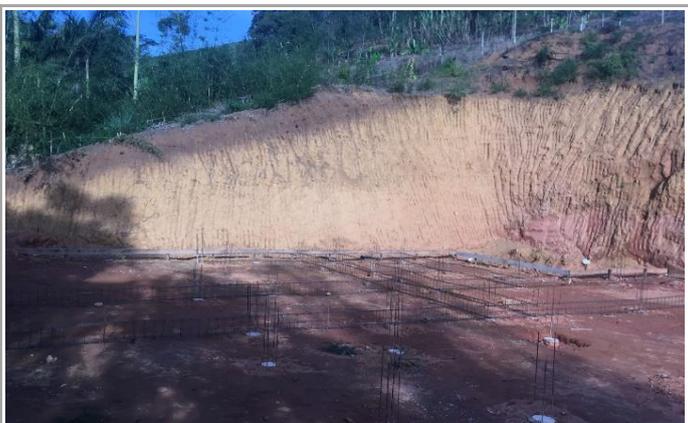

VIGA BALDRAME



VIGA BALDRAME ISOLADA



MONTAGEM DE FORMA DA VIGA BALDRAME



CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME
