





CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTAL –
FAZENDA FORTALEZA – BOM JARDIM- RJ, LOCALIDADE RURAL
DENOMINADA PINDUCA – 4º DISTRITO DE BOM JARDIM

MEDIÇÃO 02

Período: 01/03/23 a 31/03/23

PLANILHA DE MEDIÇÃO	GFIP/SEFIP
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	GUIA E COMPROVANTE INSS
DIÁRIO DE OBRAS	GUIA E COMPROVANTE FGTS
CND TRIBUTOS FEDERAIS E INSS	CONTRACHEQUES
CND ESTADUAL	DECLARAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO
CND DIVIDA ATIVA	PROJETO INCENDIO E ART
CND MUNICIPAL	PROJETO ELETRICA ASSIN. REF 1ª MED
CND TRABALHISTA	NOTA FISCAL (AGUARDANDO)
CND FGTS	





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INDICE EMOP - NOVEMBRO/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/03/2023 a 31/03/2023

ETAPA Nº: 2,00

MEDIÇÃO Nº: 2ª

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	PREÇO		TOTAL	NO PERÍODO			REALIZADO			A REALIZAR	
									QUANT.	FINANCEIRO	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	SALDO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1	01.050.0049-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	349,50	5,45			1.904,77	349,50	1.904,77		349,50	1.904,77	0,00	0,00	
1.1.2	01.050.0113-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	349,50	10,94			3.823,53	0,00	0,00		349,50	3.823,53	0,00	0,00	
1.1.3	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1,00	366,82			366,82	0,00	0,00		1,00	366,82	0,00	0,00	
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									6.095,12			R\$ 1.904,77			R\$ 6.095,12	

2.0 - CONSTRUÇÃO DE MURO, REFORMA DA ÁREA EXTERNA E COZINHA


2.1 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	2,50	41,07			102,67	0,00	0,00		2,50	102,67	0,00	0,00	
TOTAL DO ITEM 2.0 - MOVIMENTO DE TERRA									102,67			R\$ 0,00			R\$ 102,67	

2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIAS

2.2.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	3,47	2.027,03			7.033,79	0,00	0,00		3,47	7.033,79	0,00	0,00	
2.2.2	05.001.0023-0	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	0,60	61,88			37,13	0,00	0,00		0,60	37,13	0,00	0,00	

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA
FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM
JARDIM - RJ

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021


BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ETAPA Nº:		MEDIÇÃO Nº:		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/03/2023 a 31/03/2023			
										2,00		2ª					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR						
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO					
2.2.3	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM;COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM;ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO.NO TRACO 1:8.EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA.ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	30,00	68,50	2.055,00	0,00	0,00	30,00	2.055,00	0,00	0,00					
2.2.4	12.009.0006-0	PARADE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM;COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA.NO TRACO 1:3:5	M2	5,40	429,66	2.320,16	5,40	2.320,16	5,40	2.320,16	0,00	0,00					
2.2.5	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM;ASSENTES COMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.NO TRACO 1:8.EM PAREDES DE0,10M DEESPESURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DEALTURA E MEDIDA	M2	98,00	41,02	4.019,96	0,00	0,00	98,00	4.019,96	0,00	0,00					
TOTAL DO ITEM 2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIA						15.466,04		R\$ 2.320,16		R\$ 15.466,04		R\$ 0,00					
2.3 - CHAPISCO/EMBOÇO																	
2.3.1	13.001.0015-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.NO TRACO 1:1,5CM 1,5CM DE ESPESURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA.NO TRACO 1:3	M2	467,50	21,93	10.252,27	116,88	2.563,17	350,63	7.689,30	116,87	2.562,97					
TOTAL DO ITEM 2.3 - CHAPISCO						10.252,27		R\$ 2.563,17		R\$ 7.689,30		R\$ 2.562,97					

Shirley Oliveira da Silva
Engenheira Civil
CRBIA-RJ 2020.102845

Shirley

204

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM										 GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021										PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/03/2023 a 31/03/2023									
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ETAPA Nº:		MEDIÇÃO Nº:		REALIZADO		A REALIZAR			
JARDIM - RJ										2,00		2ª		ACUMULADO		SALDO			
										QUANT.		NO PERÍODO		QUANTIDADE		QUANTIDADE			
												FINANCEIRO		FINANCEIRO		FINANCEIRO			
DESCRIÇÃO										UNID		QUANT		UNIT.		TOTAL			
ITEM	CÓDIGO											UNID	QUANT	UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
2.4 - DIVERSOS																			
2.4.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16. EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO										M2	8,00	830,77	6.646,16	0,00	0,00	8,00	6.646,16
2.4.2	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM. ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO. ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO										M2	150,00	50,24	7.536,00	0,00	0,00	150,00	7.536,00
2.4.3	14.006.0030-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210X3,5CM ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO										UN	5,00	635,49	3.177,45	2,00	1.270,98	3,00	1.906,47
2.4.4	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES										UN	5,00	139,21	696,05	0,00	0,00	5,00	696,05
2.4.5	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO,SIFAO 1680 DE 1"x1 1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600,RABICHO EM PVC,FORNECIMENTO										UN	5,00	158,76	793,80	0,00	0,00	5,00	793,80



Silvio Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2020102845



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTAL - FAZENDA
FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM
JARDIM - RJ


ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ														
ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021														
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº:	MEDIÇÃO Nº:	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/03/2023 a 31/03/2023					
					UNIT.	TOTAL			NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR	
									QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
2.4.6	18.002.0070-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM, COM SAIDA DE 1/2" BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO FORNECIMENTO	UN	3,00	302,71	908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	908,13	
2.4.7	14.006.0290-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM, EM 2 FOLHAS, PARA VIDRO, COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.572,91	3.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.145,82	
2.4.8	14.006.0305-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI BASCULANTE DE 100X140X3CM, COM 3 FOLHAS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	891,45	1.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.782,90	
2.4.9	14.007.0039-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, PIVOTANTE, DE 1 FOLHA, EXTERNA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS) DE: FECHADURA COM TRINCO, ROLETE EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, PUXADOR VERTICAL EM ACO INOX, DOBRADICA PIVOTANTE (PIVO INFERIOR E SUPERIOR) EM ACO INOX	UN	5,00	219,27	1.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.096,35	
2.4.10	14.007.0140-0	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, DE ABRIR, DE 2 FOLHAS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOC. DE: 1 CREMONA, CIVARA DE LATAO, 1/2" 50M ACABAMENTO CROMADO; 2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA; 6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO, DE 2.1/2"X3", COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	2,00	94,57	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	189,14	

Sérgio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CRB4-RJ 2020.102645

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM										 GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº: 2,00	MEDIÇÃO Nº: 2ª	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/03/2023 a 31/03/2023				
					UNIT.	TOTAL			REALIZADO		A REALIZAR		
									QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE
2.4.11	14.007.0135-0	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO,DE:-2 PARES DE GONZOS DE SOBREPOR,DELATAO, TIPO MACHO-FEMEA;- 1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHO DE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR	UN	2,00	29,13	58,26	0,00	0,00	0,00	2,00	58,26		
2.4.12	13.030.0255-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS (BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL, VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO	M2	147,60	80,60	11.896,56	0,00	0,00	0,00	147,60	11.896,56		
2.4.13	13.330.0050-0	REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.- V,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	174,00	63,43	11.036,82	0,00	0,00	0,00	174,00	11.036,82		
2.4.14	15.003.0510-0	CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO, TIPO PENDENTE, DN 15MM (1/2"), TEMPERATURA 68ºC (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	24,69	49,38	0,00	0,00	0,00	2,00	49,38		

Sílvia Oliveira da Silva
 Engenheira Civil
 CRB-RJ 2020.102845



ESTADO DO RIO DE JANEIRO												GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM														
BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº: 2,00	MEDIÇÃO Nº: 2ª	PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/03/2023 a 31/03/2023					
					UNIT.	TOTAL			NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR	
									QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	SALDO FINANCEIRO
2.4.15	15.003.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	19,62	39,24	0,00	0,00	0,00	2,00	39,24			
2.4.16	08.020.0008-0	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação	M2	126,00	64,35	8.108,10	0,00	0,00	0,00	126,00	8.108,10			
2.4.17	16.011.0005-0	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, inclusive madeiramento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M2	6,00	367,52	2.205,12	0,00	0,00	0,00	6,00	2.205,12			
2.4.18	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES EM DUAS DEMAOIS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOIS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	672,84	28,27	19.021,19	336,42	9.510,59	504,63	14.265,89	168,21	4.755,30		
2.4.19	17.018.0110-0	Pinura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	M2	197,50	11,97	2.364,08	98,75	1.182,04	98,75	1.182,04	98,75	1.182,04		
2.4.20	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	56,69	226,76	0,00	0,00	0,00	4,00	226,76			

Silvio Oliveira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2020102845

[Assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÍNDICE EIMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTAL - FAZENDA
FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM
JARDIM - RJ

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ												
INDICE EMOP - NOVENEMBRO/2021												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		ETAPA Nº: 2,00	MEDIÇÃO Nº: 2ª		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/03/2023 a 31/03/2023		
					UNIT.	TOTAL		QUANT.	NO PERÍODO FINANCEIRO	REALIZADO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
2.4.21	15.007.0214-0	SUORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO.COM 20CM DE COMPRIMENTO.COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	17,07	256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	256,05
2.4.22	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO.3/8"X600MM.FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA.INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00
2.4.23	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES.DE EMBUTIR.COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO.PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,00	373,04	373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	373,04
2.4.24	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR.DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	8,87	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	44,35
2.4.25	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO.BIPOLAR.DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	27,82	111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	111,28
2.4.26	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREENDENDO:PREPARO.CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	300,00	4,78	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.434,00
2.4.27	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREENDENDO:PREPARO.CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	6,98	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.396,00

Assinatura

Silvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102945



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA
FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM
JARDIM - RJ

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ										ETAPA Nº:		MEDIÇÃO Nº:		PERÍODO DE REFERÊNCIA: De: 01/03/2023 a 31/03/2023			
										2,00		2ª					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		NO PERÍODO		REALIZADO		A REALIZAR						
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO					
2.4.28	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2.5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	236,65	2.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.366,50					
2.4.29	15.015.0250-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2.5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	229,88	3.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.448,20					
2.4.30	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	37,39	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	149,56					
2.4.31	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	55,40	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	221,60					
2.4.32	15.029.0101-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	70,85	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	141,70					
2.4.33	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	72,00	7,90	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	568,80					
2.4.34	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	48,00	12,76	612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	612,48					

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CRBA-RJ 2020102845



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



GESTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL - FAZENDA FORTALEZA - BOM JARDIM - RJ, LOCALIDADE RURAL DENOMINADA PINDUCA - 4º DISTRITO DE BOM JARDIM - RJ

ÍNDICE EMOP - NOVEMBRO/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		2,00	2ª		REALIZADO		A REALIZAR	
					UNIT.	TOTAL		NO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
								QUANT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
2.4.35	15.036.0039-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM.SOLDAVEL.INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	60,00	17,46	1.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.047,60	
2.4.36	15.036.0052-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM.SOLDAVEL.INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	24,00	24,67	592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	592,08	
2.4.37	15.036.0053-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM.SOLDAVEL.INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00	50,48	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	908,64	
TOTAL DO ITEM 2.4 - DIVERSOS						94.724,19		R\$ 11.963,61		R\$ 16.718,91		R\$ 78.005,28	
Sub - Total						126.640,29		18.751,71		46.072,04		80.568,25	
B.D.I - 20,73%						26.252,53		3.887,23		9.550,73		16.701,80	
Total do Orçamento						152.892,82		R\$ 22.638,94		R\$ 55.622,77		R\$ 97.270,05	

Silvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 265.602/5
SOPH




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO - 01/04/2023

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal

Endereço: Fazenda Fortaleza – Bom Jardim – RJ, localidade rural denominada Pinduca – 4º Distrito de Bom Jardim

Contrato n.º 129/2022 Processo n.º 3139/2021

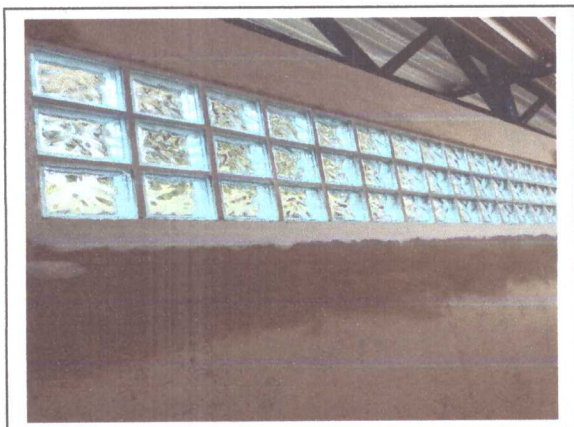


TIJOLO DE VIDRO




TIJOLO DE VIDRO




EMBOÇO

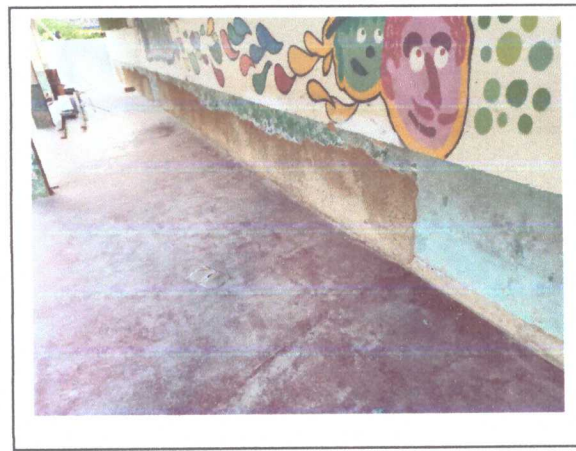

RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO

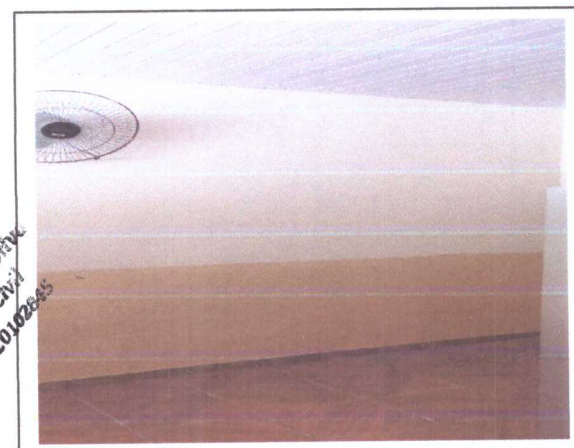

PINTURA INTERNA

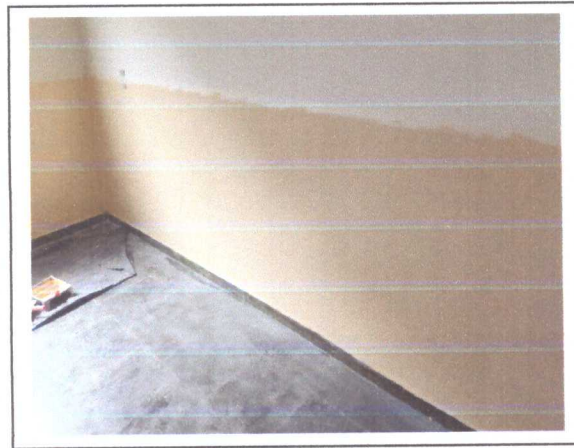

PINTURA INTERNA

Sélio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CRA-RJ 2020102845

Sélio



PINTURA MURO



PINTURA MURO

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Sávio



**CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.****DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	7	FOLHA: 08
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
DIA DA SEMANA			
Quarta-Feira	01/03/2023	A	Sexta-Feira 03/03/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO

ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE VIDRO

PINTURA INTERNA E EXTERNA

COLOCAÇÃO DE CAIXONETES E PORTAS

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Sérgio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Fiscal da Obra

15
19

		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	8	FOLHA: 09
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		TEMPO: BOM X
DIA DA SEMANA			NUBLADO
Segunda-Feira	06/03/2023	A	Sexta-Feira 10/03/2023 CHUVOSO

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO

ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE VIDRO

PINTURA INTERNA E EXTERNA


Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim			
		DIAS DE OBRA: 9	FOLHA: 10
CONTRATO n.º: 129/2022		INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023 TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023	
DIA DA SEMANA		TEMPO:	
Segunda-Feira 13/03/2023 A Sexta-Feira 17/03/2023		BOM X NUBLADO CHUVOSO	

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EMBOÇO E RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO

CONCRETAGEM DA RAMPA DE ACESSO A VARANDA (SERVIÇO EXTRA)

COMPLEMENTO DE CONCRETO DA CALÇADA (SERVIÇO EXTRA)

DEMOLIÇÃO DA PIA DA VARANDA (SERVIÇO EXTRA)

PREPARO E PINTURA INTERNA E EXTERNA INCLUSIVE MURO

Anotação do Fiscal da Obra:



Conservit

Fiscal da Obra

Sérgio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102945

17
E

		CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:	Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim		
	DIAS DE OBRA:	10	FOLHA: 11
CONTRATO n.º: 129/2022	INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023		TEMPO: BOM X NUBLADO CHUVOSO
	TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023		
DIA DA SEMANA			
Segunda-Feira	20/03/2023	A	Sexta-Feira 24/03/2023

MÃO DE OBRA	
Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO	
Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EMBOÇO E RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO

CONCRETAGEM DA RAMPA DE ACESSO A VARANDA (SERVIÇO EXTRA)

COMPLEMENTO DE CONCRETO DA CALÇADA (SERVIÇO EXTRA)

DEMOLIÇÃO DA PIA DA VARANDA (SERVIÇO EXTRA)

PREPARO E PINTURA INTERNA E EXTERNA INCLUSIVE MURO

Anotação do Fiscal da Obra:


Conservit

Fiscal da Obra

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



CONSERVIT Construção e Conservação EIRELI.
DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Reforma da Escola Municipalizada José Luiz Erthal - Fazenda Fortaleza - Bom Jardim - RJ, localidade rural denominada Pinduca - 4º Distrito de Bom Jardim

DIAS DE OBRA: 11 **FOLHA:** 12

CONTRATO
n.º: 129/2022

INÍCIO PRAZO EXECUTIVO: 23/01/2023
TÉRMINO P/ EXECUTIVO: 23/05/2023

TEMPO:
BOM X

DIA DA SEMANA

Segunda-Feira 27/03/2023 A Sexta-Feira 31/03/2023

NUBLADO
CHUVOSO

MÃO DE OBRA

Função	Quant.
Arquiteto / Engenheiro	1
Encarregado	-
Pedreiro	1
Servente	2

EQUIPAMENTO

Descrição	Quant.

Serviços realizados:

EMBOÇO E RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO

CONCRETAGEM DA RAMPA DE ACESSO A VARANDA (SERVIÇO EXTRA)

COMPLEMENTO DE CONCRETO DA CALÇADA (SERVIÇO EXTRA)

DEMOLIÇÃO DA PIA DA VARANDA (SERVIÇO EXTRA)

PREPARO E PINTURA INTERNA E EXTERNA INCLUSIVE MURO

DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO PAREDE FACHADA DO COLEGIO (SERVIÇO EXTRA)

Anotação do Fiscal da Obra:

Conservit

Fiscal da Obra

Sélio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102945
