



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À Prefeitura Municipal de Bom Jardim

A empresa RB Nunes Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 34.939.102/0001-99, vêm por meio do seu representante legal, o SR. Ronilson Benedito Nunes, portador do RG 12803712-4 IFP/RJ solicitar a 5ª medição da obra cujo o objeto é REFORMA BANHEIRO, ELETRICA PARQUE, SEDE GUARDA, PORTICO E PINTURA GRADES Conforme contrato Nº 063/2023, Tomada de preços 008/2023.

Período: 02/01/2024 à 02/02/2024


Bom Jardim, 06 de fevereiro de 2024

Ronilson Benedito Nunes

RG: 12803712-4

Diretor Executivo

34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCUÁ - CEP. 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ





Comércio & Serviços

CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comercio@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, 5/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

Obra: REFORMA BANHEIRO, ELÉTRICA PARQUE, SEDE GUARDA, PORTICO E PINTURA GRADES

Prazo: 300 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Período: 02/01/2024 a 02/02/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.	Preço Unitário	Quant.	Sal Medição Total	Quant.	Saldo Total
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									

1.1.1	01.050.0087-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA ATENTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	338,06	R\$ 5,55	0	R\$ 1.876,23	338,06	R\$ 1.876,23	0	R\$ -
1.1.2	01.050.0098-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA ATENTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	338,06	R\$ 9,55	0	R\$ 3.228,47	338,06	R\$ 3.228,47	0	R\$ -
1.1.3	01.050.0049-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO E SPOA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE ATÉ 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	311,27	R\$ 5,70	0	R\$ 1.774,24	R\$ -	R\$ -	311,27	R\$ 1.774,24
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO					R\$ 6.878,95			R\$ 5.104,71			R\$ 1.774,24

1.2.1	02.004.0003-0	BARRAÇÃO OBRA C/PAREDES MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'ÁGUA, 2,4X1,22M E 9MM ESP PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3I, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT. E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, INCL.INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ.Nº 2006/EMOP, ESCRITÓRIO, SANITÁRIO, DEPOSITOS E TORRE C/CANAL D'ÁGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	18,00	349,90	R\$ 6.298,20	R\$ -	18	R\$ 6.298,20	0,00	R\$ -
1.2.2	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2,25	367,29	R\$ 826,40	R\$ -	2,25	R\$ 826,40	0,00	R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTIERO DE OBRAS					R\$ 7.124,60			R\$ 7.124,60			R\$ -

1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11220,00	R\$ 0,14	R\$ 1.570,80	R\$ 2.244,00	R\$ 314,16	4488	R\$ 628,32	6732,00	R\$ 942,48
1.3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	374,00	R\$ 0,65	R\$ 243,10	R\$ 74,80	R\$ 48,62	149,6	R\$ 97,24	224,40	R\$ 145,86
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES					R\$ 1.813,90			R\$ 362,78		R\$ 725,56		R\$ 1.088,34

1.2 - SERVIÇO COMPLEMENTARES												
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 11, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	R\$ 4,30	R\$ 236,50		R\$ 0,00	55	R\$ 3.025,00	0,00	R\$ -
1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FECHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2/MES	1496,00	R\$ 8,87	R\$ 13.269,52	R\$ 299,20	R\$ 2.653,90	598,4	R\$ 5.307,81	897,60	R\$ 7.961,71
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	R\$ 5,14	R\$ 1.922,36	R\$ 74,80	R\$ 384,47	149,6	R\$ 768,94	224,40	R\$ 1.153,42
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	R\$ 0,43	R\$ 160,82	R\$ 74,80	R\$ 32,16	149,6	R\$ 64,33	224,40	R\$ 96,49
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 15.589,20						
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 31.406,65		R\$ 3.070,54		R\$ 9.166,08		R\$ 9.211,62

2.1.-SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO												
2.1.1	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRIÇÃO EM PLOTTER COM AS DIMENSÕES DE 0,40X0,60M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 302,98	R\$ 302,98		R\$ -	0	R\$ 0,00	1	R\$ 302,98
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO					1	R\$ 302,98		R\$ -				

2.2 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIBRAÇÕES E FERRAGENS												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10

2.2.1	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADEUJA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 500,50	R\$ 2.502,50	R\$ -	5	R\$	2.502,50	0,00	R\$ -
2.2.2	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU PAI	M2	13,61	R\$ 351,49	R\$ 4.783,78	R\$ -	13,61	R\$	4.783,78	0,00	R\$ -
2.2.3	14.006.0036-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 60X210X3CM, ADEUJA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	R\$ 619,81	R\$ 7.437,72	R\$ -	12	R\$	7.437,72	0,00	R\$ -
2.2.4	14.006.0037-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADA, DE 80X210CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00	R\$ 599,19	R\$ 7.711,47	R\$ -	13	R\$	7.711,47	0,00	R\$ -
2.2.5	14.006.0290-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM, EM 2 FOLHAS, PARA VIDRO, COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO, EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	10,00	R\$ 1.664,90	R\$ 16.649,00	R\$ -	10	R\$	16.649,00	0,00	R\$ -
2.2.6	14.007.0145-0	FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA, DE CORRER, EM 2 FOLHAS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO, DE:-4 RODÍZIOS DE LATÃO C/ROLAMENTO(56MM),17TRILHOS;-3,00M DE TRILHO DE ALUMÍNIO, TAMANHOS:0,00MX1,47;-2 CONCHAS SIMPLES LATÃO, FORMA RETANGULAR,S/FURO E PARTE CENTRAL EM BAIXO RELEVO, ACABAMENTO CROMADO	UN	10,00	R\$ 39,80	R\$ 398,00	R\$ -	10	R\$	398,00	0,00	R\$ -
2.2.7	14.002.0076-0	PORTA DE FERRO DE UVA OU DUAS FOLHAS, EM BARRAS VERTICAIS DE 2"x3/8", ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DO MESMO TIPO, CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE O GALVANIZADO N°16, DÚPLA, CONFORME PROJETO N°6002/TEMOP, EXCLUSIVE FECHADURA,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,72	R\$ 1.695,11	R\$ 9.696,03	R\$ -	0	R\$	-	5,72	R\$ 9.696,03
2.2.8	14.002.0078-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADA, DE 70X210CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 585,83	R\$ 2.343,32	R\$ -	4	R\$	2.343,32	0	R\$ -
2.2.9	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 25,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	0	R\$	-	6	R\$ 150,00
2.2.10	14.007.0347-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEMS/COLOCAÇÃO, DE:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATÃO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADIÇAS 3"x2,1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLUS DE LATÃO	UN	34,00	R\$ 188,99	R\$ 6.425,66	R\$ -	34	R\$	6.425,66	0	R\$ -
2.2.11	14.007.0185-0	FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXO LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO,ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	2,00	R\$ 741,86	R\$ 1.483,72	R\$ 1.483,72	0	R\$	-	2	R\$ 1.483,72
2.2.12	14.007.0190-0	MOLLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,FORNECIMENTENTO	UN	6,00	R\$ 205,92	R\$ 1.235,52	R\$ 1.235,52	0	R\$	-	6	R\$ 1.235,52
2.2.13	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINES FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO,ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO)	UN	12,00	R\$ 107,12	R\$ 1.285,44	R\$ 1.285,44	0	R\$	-	12	R\$ 1.285,44
2.2.14	12.035.0001-0	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	11,44	R\$ 347,10	R\$ 3.970,82	R\$ -	0	R\$	-	11,44	R\$ 3.970,82

2.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS

2.3.1	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVIETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4"	UN	5,00	R\$ 38,69	R\$ 193,45		R\$ 0,00	5	R\$	193,45	0,00		R\$ 0,00
2.3.2	15.036.0037-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	244,00	R\$ 7,88	R\$ 1.922,72		R\$ 0,00	244	R\$	1.922,72	0,00		R\$ 0,00
2.3.3	15.036.0030-0	TUBO DE PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAS C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	220,00	R\$ 14,84	R\$ 3.264,80		R\$ 0,00	220	R\$	3.264,80	0,00		R\$ 0,00
2.3.4	15.036.0022-0	TUBO DE PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAS C/DIAM. DE 100MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	126,00	R\$ 22,39	R\$ 2.821,14		R\$ 0,00	126	R\$	2.821,14	0,00		R\$ 0,00
2.3.5	06.270.0101-0	TE PVC-P84 (NBR 10351), 88B,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 50MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA,FORNECIMENTO	UN	29,00	R\$ 19,00	R\$ 551,00		R\$ 0,00	29	R\$	551,00	0,00		R\$ 0,00
2.3.6	06.270.0020-0	TUDO PVC, CLASSE 20NEB-183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA,FORNECIMENTO	M	294,00	R\$ 18,57	R\$ 5.459,58		R\$ 0,00	294	R\$	5.459,58	0,00		R\$ 0,00
2.3.7	06.270.0060-0	ADAPTADOR PVC-P84 (NBR 10351), PB, RQ X P84 COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA,FORNECIMENTO	UN	26,00	R\$ 16,16	R\$ 420,16		R\$ 0,00	26	R\$	420,16	0,00		R\$ 0,00
2.3.8	06.270.0067-0	CUBRA PVC-P84 (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA,FORNECIMENTO	UN	19,00	R\$ 28,08	R\$ 533,52		R\$ 0,00	19	R\$	533,52	0,00		R\$ 0,00
2.3.9	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 32MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO	M	148,00	R\$ 12,06	R\$ 1.784,88		R\$ 0,00	148	R\$	1.784,88	0,00		R\$ 0,00
2.3.10	18.009.0078-0	TORNEIRA PARA JARJOM, DE 3/4"x10CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	28,00	R\$ 16,97	R\$ 475,16	28	R\$ 475,16	0	R\$	0,00	28,00		R\$ 475,16
2.3.11	18.027.0089-0	LUMINARIA FECHADA, P/LUMINAÇÃO DE RUAS, C/LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO E REATOR DE PARTIDA RÁPIDA	UN	69,00	R\$ 378,85	R\$ 26.140,65	69	R\$ 26.140,65	0	R\$	0,00	69,00		R\$ 26.140,65

10

2.3.12	21.031.0015-0	RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, TIPO FAUL-OFF, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 105V E 305V, POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA, CORRENTE MÁXIMA DA CARGA 10A, COPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL ESTABILIZADO AO UV PINOS EM LATÃO ESTABILIZADO, DEVENDO ATENDER A ESPECIFICAÇÃO EM:RIOLUZ 66 E ANSI C136,10 E NBR 5.126,NO QUE COUBER. FORNECIMENTO	UN	30,00	R\$ 17,28	R\$ 518,40	30	R\$ 518,40	0	R\$ 0,00	30,00	R\$ 518,40
2.3.13	15.036.0062-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1", EXCL. CONEXÕES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	981,38	R\$ 7,61	R\$ 7.468,30		R\$ 0,00	731,38	R\$ 5.565,80	250,00	R\$ 1.902,50
2.3.14	15.008.0085-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 2,5MM2, 450 / 750V	M	1200,00	R\$ 2,58	R\$ 3.096,00		R\$ 0,00	1200,00	R\$ 3.096,00	0,00	R\$ 0,00
2.3.15	15.008.0090-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 4MM2, 450 / 750V	M	800,00	R\$ 3,58	R\$ 2.864,00		R\$ 0,00	800,00	R\$ 2.864,00	0,00	R\$ 0,00
2.3.16	15.020.0055-0	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W / 250V	UN	79,00	R\$ 46,19	R\$ 3.649,01	79	R\$ 3.649,01	0	R\$ 0,00	79,00	R\$ 3.649,01
2.3.17	15.015.0250-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+1, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	67,00	R\$ 241,52	R\$ 16.181,84		R\$ 0,00	67	R\$ 16.181,84	0,00	R\$ 0,00
2.3.18	15.036.0143-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 32MM,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	705,00	R\$ 3,43	R\$ 2.418,15		R\$ 0,00	220,00	R\$ 788,90	475,00	R\$ 1.629,25
2.3.19	18.027.0130-0	PROTEIDOR PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, PATIOS OU FACHADAS EM ALUMINIO REPUXADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO (DIAMETRO=300MM), PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W, EXCLUSIVE LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00	R\$ 240,90	R\$ 6.022,50	25	R\$ 6.022,50	0	R\$ 0,00	25,00	R\$ 6.022,50
2.3.20	15.008.0205-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTO, NA BITOLA DE 2,5MM2,600/1.000V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1739,00	R\$ 2,88	R\$ 5.008,32	1200	R\$ 3.456,00	0	R\$ 0,00	1739,00	R\$ 5.008,32
2.3.21	15.008.0210-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTO, NA BITOLA DE 4MM2,600/1.000V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1141,38	R\$ 3,88	R\$ 4.428,55	800	R\$ 3.104,00	0	R\$ 0,00	1141,38	R\$ 4.428,55
2.3.22	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTO, NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	2082,76	R\$ 5,04	R\$ 10.497,11	800	R\$ 4.032,00	100	R\$ 504,00	1982,76	R\$ 8.999,11
2.3.23	15.011.0016-0	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRÃO ENEL, MEDIÇÃO DIRETA, REDE AREA 24KVA E 38KVA, TRIFÁSICA, INCL. CAIXA POLIMERICA P/MEDIÇÃO DIRETA POLIFÁSICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFÁSICO(ATE 100A) INTERNA, POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPEÇÃO, HASTE E CONECTOR ATERAMENTO, MAT NECESSARIOS	UN	2,00	R\$ 394,76	R\$ 789,52		R\$ 0,00	2	R\$ 789,52	0,00	R\$ 0,00
2.3.24	21.013.0010-0	CHUMBADORES DE AÇO, PARA FIXAÇÃO DE POSTE RETO OU CURVO, DE AÇO, DE 7,00 ATÉ 9,00M, COM FLANGE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	19,00	R\$ 880,00	R\$ 16.720,00		R\$ 0,00	19	R\$ 16.720,00	0,00	R\$ 0,00
2.3.25	21.011.0080-0	FUNDAÇÃO PARA POSTE RETO, DE AÇO, DE 7,00 A 9,00M, EM TERRENO DE AREIA, ARGILA OU PICARRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTEÇÃO	UN	10,00	R\$ 768,55	R\$ 7.685,50		R\$ 0,00	10	R\$ 7.685,50	0,00	R\$ 0,00
2.3.26	21.011.0085-0	FUNDAÇÃO PARA POSTE RETO, DE AÇO, DE 10,00 A 15,00M, EM TERRENO DE AREIA, ARGILA OU PICARRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTEÇÃO	UN	9,00	R\$ 1.588,46	R\$ 14.296,14		R\$ 0,00	9	R\$ 14.296,14	0,00	R\$ 0,00
2.3.27	21.003.0085-0	POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO OU ESCALONADO, ALTURA DE 7,00M, SEM SAPATA,FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 1.597,00	R\$ 15.970,00		R\$ 0,00	10	R\$ 15.970,00	0,00	R\$ 0,00
2.3.28	21.003.0065-0	POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO OU ESCALONADO, ALTURA DE 15,00M, COM SAPATA,FORNECIMENTO	UN	9,00	R\$ 11.090,30	R\$ 99.812,70		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	9,00	R\$ 99.812,70
2.3.29	18.260.0040-0	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 25,4MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE, PROJEÇÃO HORIZONTAL 1000MM, PROJEÇÃO VERTICAL 370MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	48,00	R\$ 116,05	R\$ 5.570,40	R\$ 48,00	R\$ 5.570,40	0	R\$ 0,00	48,00	R\$ 5.570,40
2.3.30	15.007.0405-0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 91,00	R\$ 364,00		R\$ 0,00	4	R\$ 364,00	0,00	R\$ 0,00
2.3.31	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A/230V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$ 25,88	R\$ 155,28		R\$ 0,00	6	R\$ 155,28	0,00	R\$ 0,00



2.3.32	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	14,00	R\$ 9,40	R\$ 131,60		R\$ 0,00	14	R\$ 131,60	0,00	R\$ 0,00
2.3.33	15.007.0576-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN, TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 26,13	R\$ 104,52		R\$ 0,00	4	R\$ 104,52	0,00	R\$ 0,00
2.3.34	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A,250V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 94,45	R\$ 188,90		R\$ 0,00	2	R\$ 188,90	0,00	R\$ 0,00
2.3.35	15.015.0107-0	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 3 VAGAS DE ELTROTUDO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 20,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.O.L, INCLUSIVE ABERTURA E FEC	UN	18,00	R\$ 386,55	R\$ 6.957,90		R\$ 0,00	18	R\$ 6.957,90	0,00	R\$ 0,00
2.3.36	15.015.0260-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARGAS DE ELTROTUDO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+1, 10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO	UN	60,00	R\$ 190,12	R\$ 11.407,20		R\$ 0,00	50	R\$ 9.505,00	10,00	R\$ 1.901,20
2.3.37	15.015.0261-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, APARENTE EQUIVALENTE A 2 VARGAS DE ELTROTUDO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+1, 10A,COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	10,00	R\$ 168,71	R\$ 1.687,10		R\$ 0,00	10	R\$ 1.687,10	0,00	R\$ 0,00
2.3.38	18.002.0065-0	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X63X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGAÇÃO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 244,33	R\$ 4.153,61		R\$ 0,00	17,00	R\$ 4.153,61	0,00	R\$ 0,00
2.3.39	18.006.0009-0	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO MEIO LUXO, COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 209,18	R\$ 3.556,06	6	R\$ 1.255,08	6,00	R\$ 1.255,08	11,00	R\$ 2.300,98
2.3.40	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 24,01	R\$ 408,17	6	R\$ 144,06	6,00	R\$ 144,06	11,00	R\$ 264,11
2.3.41	18.013.0117-0	SIFÃO 1680,DE 1,1/2" X 1,1/2", EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 62,90	R\$ 1.069,30	6	R\$ 377,40	6,00	R\$ 377,40	11,00	R\$ 691,90
2.3.42	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM T, JEM TUBO DE 1,4"EM AÇO INOXIDAVEL, AISE 304,LIGA 18,8,MEDINDO 60X60CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	26,00	R\$ 218,73	R\$ 5.686,98	10	R\$ 2.187,30	0,00	R\$ 0,00	26,00	R\$ 5.686,98
2.3.43	15.020.0200-0	LAMPADA LED, BULBO, A60/DV, 12W, 100/240BASE E 27ºFORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	113,00	R\$ 7,00	R\$ 791,00	113	R\$ 791,00	0,00	R\$ 0,00	113,00	R\$ 791,00
2.3.44	18.020.0200-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	113,00	R\$ 3,90	R\$ 440,70	113	R\$ 440,70	0,00	R\$ 0,00	113,00	R\$ 440,70
2.3.45	15.004.0063-0	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LEVATORIO DE UMA TORNEIRAEINCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABISCHOS E CONEXÕES	UN	17,00	R\$ 144,18	R\$ 2.451,06	6	R\$ 665,08	6,00	R\$ 665,08	11,00	R\$ 1.585,98
2.3.46	15.004.0103-0	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE ESTES,PAYMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALAÇÃO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM, C/CONEXÕES, ATE A CAIXA ACOPLADA, LIGAÇÃO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC, 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	17,00	R\$ 250,00	R\$ 4.250,00		R\$ 0,00	17,00	R\$ 4.250,00	0,00	R\$ 0,00
2.3.47	15.007.0208-0	HASTE PARA A TERRAMENTO DE COBRE DE 5/8"(15MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$ 58,60	R\$ 351,60		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 351,60
2.3.48	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO PARA PARA-RAIO, COM 20CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 17,32	R\$ 173,20		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 173,20
2.3.49	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO,3/8"X600MM, FIXAÇÃO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE CAPTOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 29,91	R\$ 59,82		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 59,82
2.3.50	18.006.0028-0	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 218,16	R\$ 654,48		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 654,48
2.3.51	18.006.0040-0	SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	R\$ 28,85	R\$ 346,20	12	R\$ 346,20	0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 346,20
2.3.52	18.006.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	R\$ 19,00	R\$ 228,00	12	R\$ 228,00	0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 228,00
2.3.53	15.003.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUIVEIRO(INCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO), INCLUSIVE MATERIAS NECESSARIOS	UN	6,00	R\$ 24,30	R\$ 145,80	3	R\$ 72,90	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 145,80
2.3.54	18.007.0045-0	CHUIVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, DE 110/220V, FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 146,85	R\$ 881,10	3	R\$ 440,55	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 881,10
				TOTAL DO ITEM 2.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS		R\$ 313.207,08		R\$ 60.116,39		R\$ 131.559,48		R\$ 181.653,60
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
2.4.1	14.002.0205-0	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4", CHUMBADOS NO CONCRETO, CORRIMÃO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8", DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1,1/4"X3/8", SOLDADAS NOS MONTANTES, UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	16,75	R\$ 1.98,62	R\$ 11.701,89		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

2.4.2	14.002.0133-0	GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1,1/2"x3/8" A CADA 10CM, QUATRO BARRAS HORIZONTAIS DE 2"x3/8" CHUMBADAS NOVO SENDO DUAS DAS EXTREMIDADES E DUAS DIVIDINDO A GRADE 3 PARTES IGUAIS COM MONTANTES DE 1,1/2"x1,1/2" A CADA 2,00M CHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA DA GRADE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M/2	18,00	R\$ 638,36	R\$ 11.490,48	R\$ 0,00	12,4	R\$ 817,66	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.3	05.001.0023-0	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M/3	12,40	R\$ 65,94	R\$ 817,66	R\$ 0,00	12,4	R\$ 817,66	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAMILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	15,00	R\$ 17,90	R\$ 268,50	R\$ 0,00	15	R\$ 268,50	10	R\$ 179,00	R\$ 179,00
2.4.5	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	35,00	R\$ 5,70	R\$ 199,50	R\$ 153,90	8	R\$ 45,60	27	R\$ 153,90	R\$ 153,90
2.4.6	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	8,00	R\$ 19,90	R\$ 159,20	R\$ 0,00	8	R\$ 159,20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.7	05.055.0010-0	LETRA DE AÇO INOX N°22 COM 20CM DE ALTURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	40,00	R\$ 70,90	R\$ 2.836,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 27.473,22			R\$ 153,90		R\$ 1.290,96		R\$ 332,90	

2.5 - PAVIMENTAÇÃO												
2.5.3	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAS, TRANSPORTE, PREPARO COM BATONEIRA, LANÇAMENTO E ADEMSAMENTO	M/3	3,16	R\$ 382,56	R\$ 1.208,89	R\$ -	3,16	R\$ 1.208,89	0	R\$ -	
TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.208,89			R\$ -					

2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS												
2.6.1	11.013.0130-0	CONCRETO ARMADO,FC=20MPa,INCLUINDO MATERIAS PARA TORNAR O CONCRETOIMPORTADO DE USINA,ADENSADO E COLOCADO 12.00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME INTENS	M/3	1,50	R\$ 1.688,22	R\$ 2.532,33	R\$ 0,00	1,5	R\$ 2.532,33	0,00		R\$ 0,00
2.6.2	12.007.0020-0	PARDE DE BLOCOS VAZADOS(COBROGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 9,6KG, 39X39X7CM,ASSENTES COM EM 10.006.0010	M/2	38,15	R\$ 117,59	R\$ 4.486,06	R\$ 0,00	38,15	R\$ 4.486,06	0,00		R\$ 0,00
2.6.3	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE LUMA VEZ(0,20M)	M/2	325,31	R\$ 68,00	R\$ 22.121,08	R\$ 0,00	325,31	R\$ 22.121,08	0,00		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS				R\$ 29.139,47			R\$ 0,00		R\$ 29.139,47			R\$ 0,00

2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS												
2.7.1	13.001.0015-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3	M/2	1208,43	R\$ 30,10	R\$ 36.373,74	R\$ 0,00	1208,43	R\$ 36.373,74	0,00		R\$ 0,00
2.7.2	13.030.0262-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADILHOS CERÂMICO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (11,60X11,60X0,09)CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA, NO TRAÇO 1:3:5, JUNTAS REENTANTES DE 1CM DE LARGURA	M/2	354,55	R\$ 104,74	R\$ 37.135,57	R\$ 0,00	354,55	R\$ 37.135,57	0,00		R\$ 0,00
2.7.3	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS, DE 60 X 60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M/2	155,63	R\$ 40,95	R\$ 6.373,05	R\$ 0,00	155,63	R\$ 6.373,05	0,00		R\$ 0,00
2.7.4	13.330.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADILHO CERÂMICO, ANTIDERRAPANTE, 45X45CM, SUJEITO A TRAFÉGO INTENSO, RESISTENCIA A ABRASÃO F.E.I-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M/2	31,00	R\$ 28,20	R\$ 874,20	R\$ 0,00	31,00	R\$ 874,20	0,00		R\$ 0,00
2.7.5	13.348.0055-0	PEITOLIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	27,95	R\$ 81,54	R\$ 2.279,04	R\$ 0,00	27,95	R\$ 2.279,04	0,00		R\$ 0,00
2.7.6	13.365.0170-0	SOLEIRA EM GRANTO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	22,75	R\$ 45,15	R\$ 1.027,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00		R\$ 0,00
2.7.7	13.380.0011-0	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO ALASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4:8) CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA N°1 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDIÇÃO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA	M/2	259,36	R\$ 60,43	R\$ 15.673,12	R\$ 0,00	259,36	R\$ 15.673,12	0,00		R\$ 0,00
2.7.8	13.036.0015-0	RODAPE EM GRANTO CINZA CORUMBA, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRAÇO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	227,59	R\$ 47,46	R\$ 10.801,42	R\$ 0,00	227,59	R\$ 10.801,42	0,00		R\$ 0,00
2.7.9	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS, DE 60 X 60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M/2	44,19	R\$ 40,95	R\$ 1.809,58	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	44,19		R\$ 1.809,58
2.7.10	14.006.0440-0	DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, FORMADO POR PEGAS DE 2X10CM, COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRA SERRADAD/ 5CMX/ 5CM/ 3"x3" E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRA COM 25CM DE DIAMETRO TRATADO ALTURA UTIL MEDIA DE 1,50M ENTERRADO 1,00M DE	M/2	3,77	R\$ 1.702,44	R\$ 6.418,20	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3,77		R\$ 6.418,20
2.7.11	13.301.0125-1	CONTRAPISO BASE OU CAMADA REGULANIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM	M/2	23,00	R\$ 25,95	R\$ 596,85	R\$ 0,00	23	R\$ 596,85	0,00		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES,				R\$ 119.361,94			R\$ 0,00		R\$ 110.107,00			R\$ 8.227,78

2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES												
2.8.1	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M/2	129,73	R\$ 50,47	R\$ 6.547,47	R\$ -	129,73	R\$ 6.547,47	0,00		R\$ 0,00
2.8.2	16.003.0020-0	PLAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTACOM ARAME DE COBRE	M/2	518,95	R\$ 15,05	R\$ 7.810,20	R\$ -	518,95	R\$ 7.810,20	0,00		R\$ 0,00
2.8.3	16.003.0015-0	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	30,00	R\$ 11,20	R\$ 636,00	R\$ -	30,00	R\$ 636,00	0,00		R\$ 0,00

2.8.4	16.013.0001-0	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	548,95	R\$ 42,36	R\$ 23.253,52		R\$ -	548,95	R\$ 23.253,52	0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						R\$ 38.247,19		R\$ -		R\$ 38.247,19		R\$ 0,00
2.9.1	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	1590,95	R\$ 13,90	R\$ 22.114,21	100	R\$ 1.390,00	1472,00	R\$ 20.460,80	118,95	R\$ 1.653,41
2.9.2	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SELETOR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRIL	M2	2921,37	R\$ 28,50	R\$ 83.259,05	200	R\$ 5.700,00	2500,00	R\$ 71.250,00	421,37	R\$ 12.009,05
2.9.3	17.017.0161-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	528,78	R\$ 9,35	R\$ 4.944,09	100	R\$ 935,00	264,39	R\$ 2.472,05	264,39	R\$ 2.472,05
2.9.4	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRÊS DEMÃOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO	M2	45,40	R\$ 13,09	R\$ 594,29		R\$ 0,00	45,40	0	0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2.9 - PINTURAS						R\$ 110.911,63		R\$ 8.025,00		R\$ 94.182,85		R\$ 16.134,30
				TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL		R\$ 705.925,39						
				TOTAL:		R\$ 737.332,03		R\$ 15.883,29				
				B.O.I.		R\$ 173.567,96		R\$ 17.862,93				
				23,54%								
				TOTAL GERAL:		R\$ 910.900,00		R\$ 93.746,22				R\$ 196.648,97



34.939.102/0001-99
 RB RUISES COMÉRCIO E SERVIÇOS
 RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 262
 LOJA 9 - PÁRQUEA - CEF, 28.695-000
 CACHOEIRAS DE MACACU - PJ

15 | 01 | 24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irineí Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		Data 16/01/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
luiz otavio mota ferreira	encarregado	
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo elétrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
nenhuma etapa concluída na presente data		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	__/__/__	16/01/24

Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA 18/01/2024

DECORRIDO RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N.

servente

continuação de aplicação de textura sede da guarda

silvani silva martins

pedreiro

continuação de pintura galpão cultural

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo elétrico galpão cultural

fabiano de araujo alonso

pintor

João Luiz Alves fontes

pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J.

servente

leandro campos nunes

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

termino instalação fossa septica

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

18/01/2024



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA 19/01/2024

DECORRIDO RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

FISCAL:

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo eletrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	

João Luiz Alves fontes	pedreiro	serviços concluidos
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	

leandro campos nunes eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

Ass:

DATA

__/__/__

CONTRATADA

Ass:

DATA

19/01/24

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

08/01/2024

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. civil

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N.

servente

continuação de aplicação de textura sede da guarda

silvani silva martins

pedreiro

continuação de pintura galpão cultural

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo eletrico galpão cultural

fabiano de araujo alonso

pintor

SERVIÇOS CONCLUIDOS:

João Luiz Alves fontes

pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J.

servente

leandro

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

2 etapa concluídas

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

08/01/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

Data

09/01/2024

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

Nome	Função
luiz otavio mota ferreira	encarregado

SERVIÇOS INICIADOS:

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Antonio martins	pedreiro
-----------------	----------

continuação pintura galpão

Uelington martins N.	servente
----------------------	----------

continuação de aplicação de textura sede da guarda

silvani silva martins	pedreiro
-----------------------	----------

continuação de pintura galpão cultural

wagner machado pereira	pintor
------------------------	--------

continuação de reparo elétrico galpão cultural

fabiano de araujo alonso	pintor
--------------------------	--------

João Luiz Alves fontes	pedreiro
------------------------	----------

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Paulo Victor Geraldo de J.	servente
----------------------------	----------

leandro campos nunes	eletricista
----------------------	-------------

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

nenhuma etapa concluída na presente data

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

__/__/__

CONTRATADA

Ass:

DATA

09/01/24

Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

11/01/2024

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N.

servente

continuação de aplicação de textura sede da guarda

silvani silva martins

pedreiro

continuação de pintura galpão cultural

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo elétrico galpão cultural

fabiano de araujo alonso

pintor

João Luiz Alves fontes

pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J.

servente

leandro campos nunes

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

termino instalação fossa septica

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

Ass:

CONTRATADA

DATA

Ass:

11/01/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA
BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

12/01/2024

FISCAL:

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

Nome

Função

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. Civil

Antonio martins

pedreiro

Uelington martins N.

servente

silvani silva martins

pedreiro

wagner machado pereira

pintor

fabiano de araujo alonso

pintor

João Luiz Alves fontes

pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J.

servente

leandro campos nunes

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

Nenhuma

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

Ass:

DATA

__/__/__

CONTRATADA

Ass:

DATA

12/01/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 03/01/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	coninuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuaçãode reparo eletrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	serviços concluidos
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		
CONTRATADA		DATA
Ass:		03/01/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 04/01/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo elétrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
termino instalação fossa septica		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA ____/____/____	Ass:  DATA 04/01/24



Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA			
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 05/01/2024	
Contrato: 063/2023		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		(x) OPERAVEL	() NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:	
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil		
Antonio martins	pedreiro	coninuação pintura galpão	
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda	
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural	
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo eletrico galpão cultural	
fabiano de araujo alonso	pintor		
João Luiz Alves fontes	pedreiro	serviços concluidos	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente		
leandro campos nunes	eletricista		
PESSOAL DE OBRA INDIRETO			
TOTAL			
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS			
Nenhuma			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA	CONTRATADA DATA
Ass:		____/____/____	Ass:  05/01/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

22/01/2024

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. civil	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo elétrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
leandro	eletricista	

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:

22/01/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 24/01/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo elétrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	serviços concluídos
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass: _____	DATA _____	Ass: _____ DATA 24/01/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 25/01/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	coninuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuaçãode reparo eletrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
termino instalação fossa septica		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	___/___/___	25/01/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 26/01/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo elétrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças
João Luiz Alves fontes	pedreiro	serviços concluídos
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		CONTRATADA
Ass:	DATA	Ass: DATA
	26/01/24	26/01/24



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 01/02/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	
Antonio martins	pedreiro	continuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuação de reparo elétrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças
João Luiz Alves fontes	pedreiro	
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
Nenhuma		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
termino instalação fossa septica		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA DATA
Ass: _____	____/____/____	Ass: _____ 01/02/24



Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		DATA 31/01/2024
Contrato: 063/2023		DECORRIDO RESTANTE
FISCAL:		TEMPO
		(x) OPERAVEL () NÃO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA DIRETO		SERVIÇOS INICIADOS:
Nome	Função	
Luiz Otavio Mota Ferreira	eng. Civil	PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA
Antonio martins	pedreiro	coninuação pintura galpão
Uelington martins N.	servente	continuação de aplicação de textura sede da guarda
silvani silva martins	pedreiro	continuação de pintura galpão cultural
wagner machado pereira	pintor	continuaçãode reparo eletrico galpão cultural
fabiano de araujo alonso	pintor	instalação de louças
		reparo na grade superior do parque
João Luiz Alves fontes	pedreiro	reparo no meio fio do parquinho
Paulo Victor Geraldo de J.	servente	serviços concluidos
leandro campos nunes	eletricista	
PESSOAL DE OBRA INDIRETO		
TOTAL		
OCORRÊNCIAS DIÁRIAS		
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES		
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO		DATA
Ass:		
CONTRATADA		DATA
Ass:		31/01/24

Ass:



CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual: 11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep: 28.695-000

DIÁRIO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM

JARDIM

Contrato: 063/2023

DATA

29/01/2024

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

(x) OPERAVEL

() NÃO OPERAVEL

PESSOAL DE OBRA DIRETO

SERVIÇOS INICIADOS:

Nome

Função

PINTURA NAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA

Luiz Otavio Mota Ferreira

eng. civil

Antonio martins

pedreiro

continuação pintura galpão

Uelington martins N.

servente

continuação de aplicação de textura sede da guarda

silvani silva martins

pedreiro

continuação de pintura galpão cultural

wagner machado pereira

pintor

continuação de reparo elétrico galpão cultural

fabiano de araujo alonso

pintor

instalação de louças

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

João Luiz Alves fontes

pedreiro

Paulo Victor Geraldo de J.

servente

leandro

eletricista

PESSOAL DE OBRA INDIRETO

TOTAL

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

Ass:

Ass:

29/01/24

Relatório Fotográfico


Contrato

063/2023

Local: Bom Jardim RJ

EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM

Pintura do Galpão (Continuação)

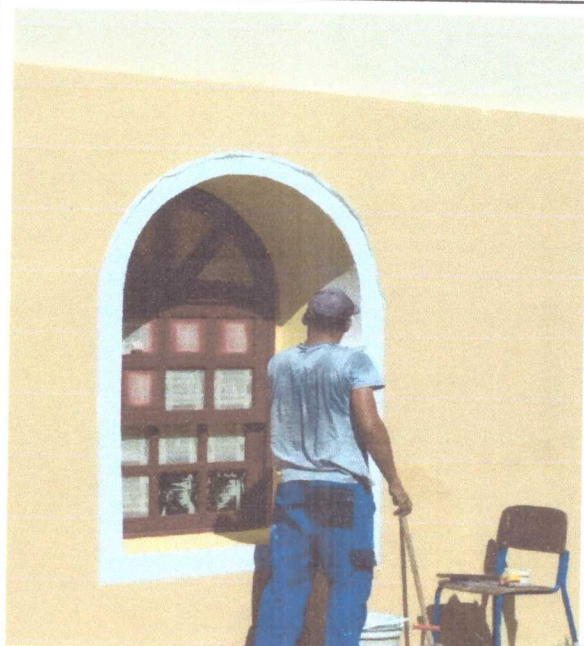



Handwritten signature



Instalação elétrica



Handwritten signature or initials in blue ink.

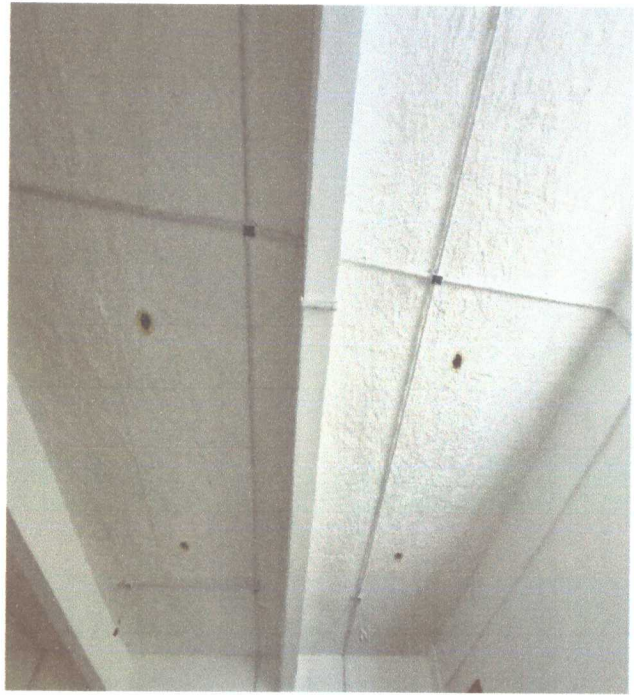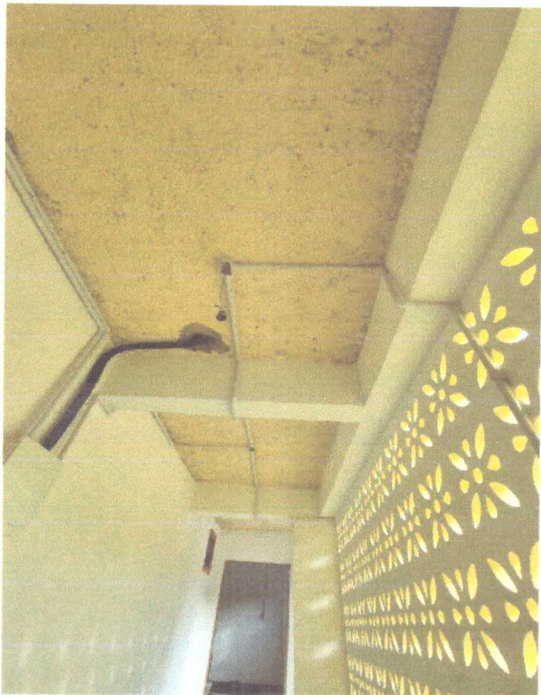

SP

Escavação de fundação e Concretagem



Alvenaria de tijolos cerâmicos



Instalação de Louças





34.939.102/0001-99

RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS

RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
