



À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Governador Roberto Silveira, 144 – Centro - Bom Jardim/RJ

CEP: 28.660-000

CNPJ nº: 11.867.889/0001-25

At.: Sr. Wueliton Pires.
Secretário de Saúde

Ref.: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na Rua Humberto
Neves, nº 10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ.

Tomada de Preços nº 005/2023

Contrato nº 054/2023

Processo Administrativo nº 0982/2023

Prezado Senhor,

A empresa **CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA**, com endereço
à Avenida Vicente Joi, s/nº, Volta da Ferradura, Macuco - RJ, CNPJ nº
09.594.456/0001-00, vem solicitar à **6ª medição**, dos serviços executados no período
de 01/08/2024 a 31/08/2024, referente ao contrato supracitado, de “CONSTRUÇÃO
DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, na Rua Humberto Neves, nº 10, Jardim Boa
Esperança – Bom Jardim / RJ”.

Macuco-RJ, 17/09/2024

Atenciosamente,

09.594.456/0001-00
CONSERVIT CONSTRUÇÃO
E CONSERVAÇÃO LTDA.
Avenida Vicente Joi, s/n
Volta da Ferradura
CEP 28.545-000
BOM JARDIM - RJ

Ademir Joi

Assinatura do representante legal

Nome: Ademir Joi

Cargo: Proprietário

CPF: 381.017.857-87

Documento de identidade: 81.212.303-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
NUMERO 6645	FLS
20	DE 09 DE 2024
<i>llly</i>	
PROTOCOLISTA	

CONSERVIT

CONSERVACAO E MANUTENCAO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA

LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM

EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

CNPJ: 09.594.456/0001-00

dez/22

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITARIO	TOTAL
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 - PROJETO						
1.1.2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES	M2	263,40	13,00	3.424,20
1.1.3	01.050.0091-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES	M2	263,40	20,00	5.268,00
1.1.4	01.050.0102-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	263,40	20,00	5.268,00
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO						13.960,20
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS						
1.2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	265,65	32,00	8.500,80
1.2.2	01.006.0010-0	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	263,40	1,60	421,44
1.2.3	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	263,40	15,00	3.951,00
1.2.4	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,00	440,00	1.760,00
TOTAL DO ITEM						14.633,24
1.3 - TRANSPORTES						
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2xKM	11.220,00	0,15	1.683,00
1.3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIECAO VERTICAL	M2	374,00	0,70	261,80
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES						1.944,80

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/08/2024 a 31/08/2024

De: 01/08/2024 a 31/08/2024												
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 18, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS UPPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	5,00	275,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOB SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2X MES	1.122,00	10,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	6,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	0,50	187,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.4.5	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	475,00	
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.401,00		0,00		475,00		
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						44.939,24		0,00		475,00		
2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL												
2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO												
2.1.1	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSAO EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO	M	60,00	120,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.1.2	01.008.0050-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	1,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.1.3	01.018.0002-0	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	82,80	20,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO						15.856,00		0,00		0,00		
2.2 - MOVIMENTO DE TERRA												
2.2.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A/AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	291,39	53,00	15.443,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA						15.443,67		0,00		0,00		

Sérvio Oliveira da S
Engenheiro Gvi.
CREA-RJ 20201026

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA CNPJ: 09.594.456/0001-00										dez/22									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
ITEM		CODIGO EMOP		DESCRIÇÃO		UNID.		QUANT.		PRECOS		TOTAL							
										UNITARIO		TOTAL							
2.3 - TRANSPORTES																			
2.3.1		04.005.0123-1		TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T		T X KM		8.741,40		1,40		12.237,96							
						TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES						12.237,96							
2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			
2.4.2		16.034.0003-0		IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TUIOLOS CERAMICOS, MACICOS, SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORCAO DE UMIDADE DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TUIOLO MACICO		M2		78,63		115,00		9.042,45							
						TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						9.042,45							
2.5 - PAVIMENTAÇÃO																			
2.5.1		09.001.0002-0		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO, PARA R		M2		301,78		20,00		6.035,60							
2.5.3		11.003.0001-1		CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		M3		9,95		500,00		4.975,00							
						TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAÇÃO						11.010,60							
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS																			
2.6.1		11.013.0130-0		CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022		M3		27,84		2.200,00		61.248,00							
2.6.3		11.030.0020-0		LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 EVAO DE 4,40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TUIOLOS E ARMADURANEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESURA, C/CONCRETO FCK=20MPA		M2		263,40		R\$ 158,00		41.617,20							
2.6.5		11.013.0003-1		VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES		M3		0,73		2.000,00		1.460,00							

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/08/2024 a 31/08/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO		QUANT.	A REALIZAR		%
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%		R\$	%	
2.6.8	12.005.0020-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL.	M2	180,00	80,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.9	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ 0,20M	M2	886,50	88,00	78.012,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						196.737,20	0,00				0,00		
2.7.1	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1.773,00	29,00	51.417,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.7.2	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	222,43	49,50	11.010,28	0,00	0,00	0,00%	222,43	11.010,28	100,00%	100,00%
2.7.4	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOES SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	315,88	28,00	8.844,64	0,00	0,00	0,00%	315,88	8.844,64	100,00%	100,00%
2.7.5	13.301.0125-B	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 3CM	M2	263,40	28,00	7.375,20	0,00	0,00	0,00%	263,40	7.375,20	100,00%	100,00%
2.7.6	13.380.0011-0	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO: A) LASTRO, COM 4CM DE ESPESURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4, 8) CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA	M2	222,43	70,00	15.570,10	0,00	0,00	0,00%	222,43	15.570,10	100,00%	100,00%
2.7.7	13.036.0015-0	RODAPE EM GRANITO CINZA, CORUMBA, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	262,10	57,00	14.939,70	0,00	0,00	0,00%	262,10	14.939,70	100,00%	100,00%
2.7.8	13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA, ANDORINHA, ESPESURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3,3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	31,80	70,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00%	31,80	2.226,00	100,00%	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						111.382,92	0,00				59.965,92		

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



6º MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:

dez/22

De: 01/08/2024 a 31/08/2024													
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR			
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	
2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS													
2.8.1	14.002.0087-0	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,60	917,00	8.803,20	0,00	0,00	0,00%	9,60	8.803,20	100,00%	
2.8.2	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00	620,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00%	25,00	15.500,00	100,00%	
2.8.3	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,32	425,00	12.036,00	0,00	0,00	0,00%	28,32	12.036,00	100,00%	
2.8.4	14.007.0338-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FORNECIMENTO	UN	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	134,00	100,00%	
2.8.5	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FORNECIMENTO	UN	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	116,00	100,00%	
2.8.6	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVICO, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:- FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO:- 3 DOBRADICAS 3"x2,1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLOS DE LATAO	UN	24,00	230,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00%	24,00	5.520,00	100,00%	
TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						42.109,20		0,00			42.109,20		
2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS													
2.9.1	15.001.0054-0	ABRIGO P/2 BOTTUDES GAS DE 45KG EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM.(1.00X0,50X1,80)M, ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4, CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP	UN	1,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.150,00	100,00%	
2.9.2	15.002.0062-0	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	170,00	100,00%	
2.9.3	15.002.0096-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), MEDINDO 1,50X2,20X0,90M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	UN	1,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.100,00	100,00%	

Stylio Oliveira da Si

Engenheiro Civil

CREA-R/ 20201026

10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/08/2024 a 31/08/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO			A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.4	15.002.0630-0	FOSSA SEPTICA DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2000X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.5	15.002.0665-0	FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2500X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.6	15.004.0061-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXÕES	UN	5,00	347,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	1.735,00	100,00%
2.9.7	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXÕES	UN	13,00	155,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00%	13,00	2.015,00	100,00%
2.9.8	15.004.0133-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCL. ESTE) EM PAVIMENTO TERREO, PARTE DE UM CONJ. DE DOIS OU MAIS VASOS, COMPREENDENDO: INST. HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM, COM CONEXÕES, ATÉ A CAIXA ACOPLADA, LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO, INCL. CONEXÕES, EXCL. TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	1.250,00	100,00%
2.9.9	15.004.0180-0	RAIO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	135,00	675,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	675,00	100,00%
2.9.10	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8" (16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	73,00	146,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	146,00	100,00%
2.9.11	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO, COM 20CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	105,00	100,00%
2.9.12	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO (CAPTOR 1 PONTA) EM LATAO MACICO 3/8" X 600MM, FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE CAPTOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	36,00	100,00%
2.9.13	15.007.0507-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES, TERMO MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA, TRIFASICO PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	4,00	455,00	1.820,00	2,00	910,00	50,00%	2,00	910,00	50,00%

Sávio Oliveira de
Engenheiro C
CREA-RJ 2020101

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTARIA

6ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/08/2024 a 31/08/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO		%	QUANT.	A REALIZAR		%
					UNITARIO	TOTAL		R\$				R\$		
2.9.14	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	11,00	77,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,00	77,00	100,00%	100,00%
2.9.15	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	31,00	310,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00	310,00	100,00%	100,00%
2.9.16	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	115,00	100,00%	100,00%
2.9.17	15.008.0095-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	5,60	840,00	150,00	840,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.9.18	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	8,20	820,00	100,00	820,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.9.19	15.008.0105-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	11,00	550,00	50,00	550,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.9.20	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	6,00	600,00	100,00	600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.9.21	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBITUDO NA LAJE,EQUVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	15,00	300,00	4.500,00	15,00	4.500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.9.22	15.015.0035-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBITUDO NA LAJE,EQUVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	578,00	4.046,00	7,00	4.046,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.9.23	15.015.0050-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBITUDO NA LAJE,EQUVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	738,00	3.690,00	5,00	3.690,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Sérvio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

SSM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/08/2024 a 31/08/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		REALIZADO			A REALIZAR		
					UNITARIO	TOTAL	Quant.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.24	15.015.0171-0	INSTALCAO DE PONTO DE FORÇA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM²,CAIXAS E CONEXÕES	UN	7,00	385,00	2.695,00	7,00	2.695,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.25	15.015.0250-0	INSTALCAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTUDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM²,CAIXAS,CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+1,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	34,00	290,00	9.860,00	34,00	9.860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.26	15.015.0280-0	INSTALCAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBTUDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM²,CAIXAS,CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+1,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	40,00	315,00	12.600,00	40,00	12.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.27	15.028.0010-0	COLOCAÇÃO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO DUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PEÇAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADERA SERRADA,E FLANGES DE LIGAÇÃO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00	595,00	1.190,00	2,00	1.190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.28	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4",FORNECIMENTO E COLOCAÇO	UN	10,00	45,00	450,00	10,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.29	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1",FORNECIMENTO E COLOCAÇO	UN	8,00	77,00	616,00	8,00	616,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.30	15.029.0014-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2",FORNECIMENTO E COLOCAÇO	UN	6,00	115,00	690,00	6,00	690,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.31	15.036.0031-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDÁVEL,EXCLUSIVE CONEXÕES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	20,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.32	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDÁVEL,INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00	9,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.33	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDÁVEL,INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	75,00	14,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.34	15.036.0045-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDÁVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXÕES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	80,00	12,00	960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.35	15.036.0048-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDÁVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXÕES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00	25,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.9.36	15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDÁVEL,INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	50,00	18,00	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Sávio Oliveira da Silva

Engenheiro Civil

CREA-RJ 2020102845

STCA 11.1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/08/2024 a 31/08/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	R\$ REALIZADO	%	QUANT.	A REALIZAR		%
					UNITARIO	TOTAL					R\$		
2.9.37	15.007.0204-0	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 3/4" (19MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.9.38	21.028.0015-0	CONECTOR PARA FUSO FENDIDO COM FABRICO EM BRONZE, PARA ATERRAMENTO, CONDUTORES DE 6 - 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	23,00	92,00	4,00	92,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.9.39	21.003.0057-0	POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 9,00M, COM SAPATA, FORNECIMENTO	UN	1,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.400,00	100,00%	100,00%
2.9.40	15.011.0015-0	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO ENEL, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, 10KV E 24KV, TRIFASICA, INCL. CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO (ATE 100A) INTERNA, POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPECAO, HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO, MAT. NECESSARIOS, EXCL. POSTE, DISJUNTOR, CONDUTORES ENTR., SAIDA, ATERRAMENTO E CONECTORES	M	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	380,00	100,00%	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						81.313,00		44.249,00			16.574,00		
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES													
2.10.1	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEIRA E TERÇAS DE 3"x4 1/2", CAIBROS DE 3"x1 1/2", RIPAS DE 1,54CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESSOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	263,40	114,00	30.027,60	0,00	0,00	0,00%	263,40	30.027,60	100,00%	100,00%
2.10.2	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMÍNIO/16"x250MM COM ROSCA EXCLUSIVAMENTE EM MADEIRA, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	263,40	63,00	16.594,20	0,00	0,00	0,00%	263,40	16.594,20	100,00%	100,00%
2.10.3	16.005.0008-0	CUMEIRA DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	40,00	64,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	2.560,00	100,00%	100,00%
2.10.4	16.007.0025-0	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	103,46	74,00	7.656,04	0,00	0,00	0,00%	103,46	7.656,04	100,00%	100,00%
2.10.5	16.004.0055-A	CONDUTOR PARA CAIXA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	103,46	59,00	6.104,14	0,00	0,00	0,00%	103,46	6.104,14	100,00%	100,00%
2.10.6	16.011.0005-0	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESURA, INCL. MADEIRAMENTO EM PEÇAS DE MADEIRAS PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, MEDIDO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	7,76	420,00	3.259,20	0,00	0,00	0,00%	7,76	3.259,20	100,00%	100,00%

Stênio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845

Stênio Oliveira da Silva

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/08/2024 a 31/08/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		Quant.	REALIZADO		QUANT.	A REALIZAR	
					UNITARIO	TOTAL		R\$	%		R\$	%
2.10.7	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,75X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	81,80	116,00	9.488,80	0,00	0,00	0,00%	81,80	9.488,80	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						75.689,98		0,00			75.689,98	
2.11 - PINTURAS												
2.11.1	17.017.0370-0	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA AUTO BRILHOU ACETINADO PARA USO HOSPITALAR SOBRE MADEIRAS EMETAIS AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR	M2	58,95	39,00	2.299,05	0,00	0,00	0,00%	58,95	2.299,05	100,00%
2.11.2	17.018.0265-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAO DE ACAB	M2	1.777,47	37,00	65.766,39	0,00	0,00	0,00%	1.777,47	65.766,39	100,00%
2.11.3	17.025.0010-A	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICAÇÃO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAO	M2	263,40	4,90	1.290,66	0,00	0,00	0,00%	263,40	1.290,66	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS						69.356,10		0,00			69.356,10	
2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS												
2.12.1	18.002.0030-A	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2". FORNECIMENTO	UN	8,00	418,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	3.344,00	100,00%
2.12.2	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOISA DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	5,00	539,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	2.695,00	100,00%
2.12.3	18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	17,00	33,00	561,00	0,00	0,00	0,00%	17,00	561,00	100,00%
2.12.4	18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	17,00	33,00	561,00	0,00	0,00	0,00%	17,00	561,00	100,00%
2.12.5	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PARADE, ANTI VANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	5,00	777,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	3.885,00	100,00%
2.12.6	18.006.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	120,00	100,00%
2.12.7	18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA EM BRONZE, DE PRESSÃO DE 1" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	134,00	100,00%
2.12.8	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSÃO, 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	5,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	150,00	100,00%

Sérgio Oliveira da Silva

Engenheiro Civil

CREA-MG 2420102845

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS - JARDIM BOA ESPERANÇA
LOCAL: JARDIM BOA ESPERANÇA - 1º DISTRITO - BOM JARDIM
EMPRESA: CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.594.456/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
De: 01/08/2024 a 31/08/2024

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PRECOS		Quant.	R\$	%	QUANT.	A REALIZAR		%
					UNITARIO	TOTAL					R\$	%	
2.12.9	18.016.0035-0	BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M, EM CHAPA 18.304, COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFÕES 1.680 1,1/2" X 1,1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	2.370,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	11.850,00	100,00%	
2.12.10	18.016.0110-A	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1,1/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI-304, LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	20,00	270,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	5.400,00	100,00%	
2.12.11	15.020.0155-0	LAMPADA LED, BULBO A60/DV.8W, 100/240V, BASE E-27, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	70,00	7,80	546,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	546,00	100,00%	
2.12.12	18.260.0065-0	SUORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	70,00	4,00	280,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	280,00	100,00%	
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						29.526,00		0,00			29.526,00		
TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUÇÃO GERAL						669.705,08		44.249,00			304.231,80		
TOTAL:						714.644,32		44.249,00			304.706,80		
B.D.I						22,41%		9.916,20			68.284,79		
TOTAL GERAL:						874.796,11		54.165,20			372.991,59		

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro CIVIL
CREA-RJ 2020102845



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO - 01/08/2024 A 31/08/2024



FORNECIMENTO E INST. CAIXA D'ÁGUA




INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA



INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA



INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

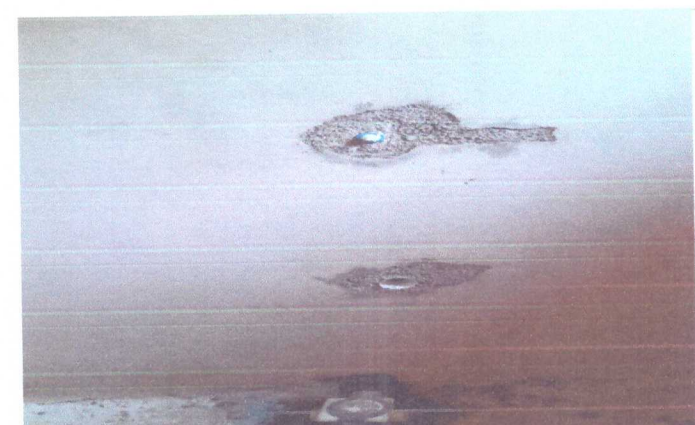

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA



INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: Rua Humberto Neves, nº10, Jardim Boa Esperança – Bom Jardim / RJ

Contrato n.º 054/2023 Processo n.º 0982/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO - 01/08/2024 A 31/08/2024




INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA



INSTALAÇÃO ELETRICA



INSTALAÇÃO ELETRICA

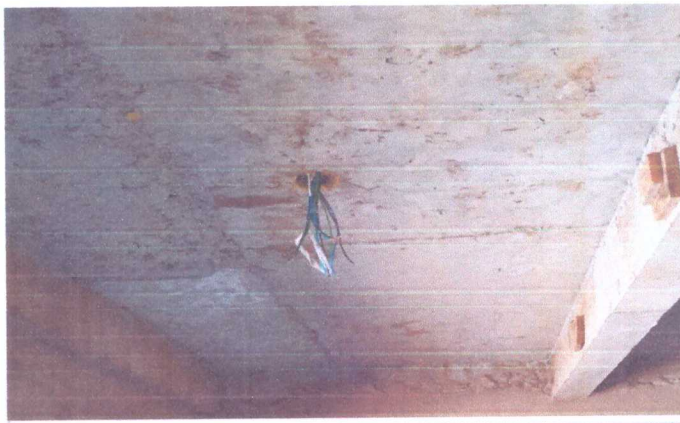

INSTALAÇÃO ELETRICA



INSTALAÇÃO ELETRICA



Sávio Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020102845
Sávio
