



À
Prefeitura Municipal de Bom jardim

Ref.: Processo Administrativo nº 1667/2021 - Edital de Tomada de Preços nº 002/2021, em 18/08/2021 - Contrato PMB nº 0118/2021, firmado em 26 de agosto de 2021. Obra: Reforma, adequação e ampliação da Escola Municipal Antônio Gomes de Azevedo, Bairro de Fátima, 2º Distrito de Bom Jardim, RJ.

Solicito a Prefeitura Municipal de Bom jardim, na pessoa de seu Secretário, que determine a **1ª MEDIÇÃO** das obras de reforma, adequação e ampliação da Escola Municipal Antônio Gomes de Azevedo, localizada no Bairro de Fátima, 2º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ, referente às obras executadas conforme planilhas em anexo.

Cordeiro, RJ, 27 de setembro de 2021.


ITAUBA CONSTRUTORA LTDA-ME.
José Carlos Gonçalves Guzzo
RG - 006.878.235-8 - DETRAN-RJ
CPF - 821.978.817-87
Sócio Administrador


07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Secretaria Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ

Prazo Inicial: 8 (oito) meses - Data de Início: 26/08/2021 - Data de Término: 25/04/2022
Prorrogações:

Processo Administrativo nº 1667/2021 - Edital de Tomada de Preços nº 002/2021 - 18/08/2021

Contratada: Itauba Construtora Ltda. ME
Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro, RJ, CEP 28.540-000. CNPJ: 07.569.949/0001-56

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE AZEVEDO
Local: BAIRRO DE FÁTIMA, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, RJ.

Serviços Executados - Período de Medição: 27/08/2021 à 26/09/2021

1ª Medição

DATA MEDIÇÃO: 27/09/2021

ELEMENTOS DA MEDIÇÃO

MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO (R\$)	Desvio (%)
121,36	121,36	R\$ 2.233,02	R\$ 2.233,02	100,00%
2,25	2,25	R\$ 528,75	R\$ 528,75	100,00%
		R\$ 2.761,77	R\$ 2.761,77	100,00%
		R\$ 2.761,77	R\$ 2.761,77	100,00%

ELEMENTOS RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITARIO	TOTAL
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 - CANTEIRO DE OBRAS						
1.1.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	121,36	R\$ 18,40	R\$ 2.233,02
1.1.2	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,25	R\$ 235,00	R\$ 528,75
TOTAL DO ITEM 1.1 - CANTEIRO DE OBRAS					R\$	2.761,77
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	2.761,77

2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL

2.1 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	12,00	R\$ 33,40	R\$ 400,80
TOTAL DO ITEM 2.1 - MOVIMENTO DE TERRA					R\$	400,80

2.6.8	15.007.0507-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,00	R\$ 297,40	R\$ 297,40	0,00	R\$	0,00%
2.6.9	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30A X 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 7,80	R\$ 15,60	0,00	R\$	0,00%
2.6.10	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 29,00	R\$ 58,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.11	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50AX 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.12	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.13	15.008.0095-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	R\$ 3,90	R\$ 780,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.14	15.008.0100-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	130,00	R\$ 5,50	R\$ 715,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.15	15.008.0105-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	R\$ 8,10	R\$ 810,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.16	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	8,00	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.17	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	R\$ 193,40	R\$ 1.934,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.18	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.19	15.029.0011-A	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 40,00	R\$ 200,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.20	15.029.0101-A	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.21	15.036.0019-A	TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	30,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.22	15.036.0031-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDADAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	26,00	R\$ 14,00	R\$ 364,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.23	15.036.0037-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	42,00	R\$ 7,00	R\$ 294,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.24	15.036.0038-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	50,00	R\$ 10,00	R\$ 500,00	0,00	R\$	0,00%
2.6.25	15.036.0048-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDADAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	31,00	R\$ 23,00	R\$ 713,00	0,00	R\$	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						R\$ 13.598,70		R\$	0,00%

[Handwritten signature]

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

2.7 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES				
2.7.1	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE CUMEIEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	150,00 R\$ 76,90 R\$ 11.535,00
TOTAL DO ITEM 2.7 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES				R\$ 11.535,00

2.8 - PINTURAS	
2.8.1	16.013.0003-A

50,00	50,00	R\$ 3.845,00	R\$ 3.845,00	33,33%
		R\$ 3.845,00	R\$ 3.845,00	33,33%

2.8 - PINTURAS							
2.8.1	17.025 0005-1	PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSO A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOIS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOIS DE MASSA ACRIL	M2	1.203,30	R\$	30,80	R\$ 37.061,64
				TOTAL DO ITEM 2.8 - PINTURAS		R\$	37.061,64

0,00	0,00	R\$	-	0,00%
		R\$	-	0,00%
		R\$	-	0,00%

2.9 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		UN	1,00	R\$	400,00	R\$	400,00
2.9.1	18.002.0030-A	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FERRAGENS EM METAL CROMADO. TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1 1/4" A 1 1/2". FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	400,00	R\$ 400,00
2.9.2	18.002.0085-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO MEDIO LUXO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCL. ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO, BOLSA DE LIGACAO, VALVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" C/ REGISTRO INTEGRADO, SISTEMA HIDROMECANICO (SENTA DE GOLPE DE ARIETE) COM CORPO EM LATAO, CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO, TUBO DE LIGACAO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$	280,00	R\$ 2.800,00
2.9.3	18.006.0009-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	14,00	R\$	105,00	R\$ 1.470,00
2.9.4	18.009.0074-A	TORNEIRA PARA PIA, COM MISTURADOR, AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO BANCA, 1256 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$	155,50	R\$ 311,00
2.9.5	18.009.0076-A	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	14,00	R\$	23,30	R\$ 326,20
2.9.6	18.013.0108-A	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, COM LADRAO, 1603 DE 1", EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	14,00	R\$	17,10	R\$ 239,40
2.9.7	18.013.0117-A	SIFAO 1680, DE 1 1/2"X1 1/2", EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$	64,40	R\$ 1.094,80
2.9.8	18.016.0110-A	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM"1", EM TUBO DE 1 1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$	196,60	R\$ 1.179,60
2.9.9	15.020.0155-A	LAMPADA LED, BULBO, A60/DY, 8W, 100/240V, BASE E-27 FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	R\$	9,00	R\$ 135,00
2.9.10	18.260.0065-A	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	R\$	3,50	R\$ 52,50
2.9.11	09.015.0324-0	Escorega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$	2.700,00	R\$ 2.700,00
2.9.12	09.015.0310-0	Balanço multiuso em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2", 2" e 1" e espessura de parede de 1/8", composto de 2 balanços simples com assento de madeira aparelhada, 1 escada dupla, 1 barra simples e 1 balanço para cadeira de rodas com rampa de acesso pivotante, trava para cadeira e para balanço, piso em madeira inttertravada reforçada com capacidade de carga de 200kg, pintura com 1 demão de galvite e 2 demãos de tinta esmalte sintético. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$	7.800,00	R\$ 7.800,00

[illegible]

[07.569.949/0001-56]

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

2.9.13	09.001.0002-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO, PARA R				M2	85,02	R\$	12,20	R\$	1.037,24	0,00	0,00	R\$	R\$	-	0,00%
TOTAL DO ITEM 2.9 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS																	
											R\$	19.545,74					
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL																	
											R\$	184.418,47					
TOTAL (ITEM 1.0 + ITEM 2.0)																	
						B.D.I	20,73%	R\$	187.180,24								
								R\$	38.802,46								
TOTAL GERAL																	
											R\$	225.982,70					
Valor Contratado para a Obra											R\$	225.982,70					
Valor da Medição											R\$	22.341,70					
Valor da Medição acumulado											R\$	22.341,70					
Saldo do Valor Contratado para a Obra											R\$	203.641,00					
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO																	
											R\$	22.341,70					

				0,00	0,00	R\$	R\$	-	0,00%	
						R\$	R\$	-	0,00%	
						R\$	15.743,74	R\$	15.743,74	8,54%
						R\$	18.505,51	R\$	18.505,51	9,89%
						R\$	3.836,19	R\$	3.836,19	9,89%
						R\$	22.341,70	R\$	22.341,70	9,89%
						100,0000%				
						9,8865%				
						9,8865%				
						90,114%				
						9,8865%				

Bom Jardim, RJ, 27 de setembro de 2021.

CONTRATADA/CONSTRUTORA

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ

FISCAL/NOME/MATRÍCULA

VISTO/SECRETÁRIO



MEMÓRIA DE CÁLCULO		
REFORMA DAS ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE AZEVEDO		
ITEM		CÁLCULO
1.1 - CANTEIRO DE OBRAS		
02.002.0005-A		60,68x2,00
02.020.0001-A		1,50x1,50
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL		
03.001.0001-B		1,00x1,00x1,20x10
2.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
05.001.0002-B		1,00x1,00x0,30x6
05.001.0023-A		4+3+1,39+4,33+6+5,10)x3
05.001.0134-A		8 uni
05.001.0145-A		4 uni
2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
11.013.0110-A		
12.005.0010-A	muro 10x0,2x0,15x3+2x0,2x0,15x66,68+10x0,5x0,5x0,2+ obra 8x0,3x0,15x4+2x0,3x0,15x23,7+calçada1x15,46x0,05	
12.003.0095-A		1,6x3x15
2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		
13.001.0010-B	75,99x2+10+4,33+10+2,80+2,8+2,78+2,78+2,78+6+6+3,37+3,37+4,5+4,3+4,3+2,72+2,72+2,72+2,72+1,75+1,75+3,5+1,87+1,87	
13.003.0003-A	75,99x2+10+4,33+10+2,80+2,8+2,78+2,78+2,78+6+6+3,37+3,37+4,5+4,3+4,3+2,72+2,72+2,72+2,72+1,75+1,75+3,5+1,87+1,87	1,87+1,87x3)x2
13.026.0010-0	10+4,33+10+2,80+2,8+2,78+2,78+2,78+6+6+3,37+3,37+4,5+4,3+4,3+2,72+2,72+2,72+2,72+1,75+1,75+3,5+1,87+1,87	1,87+1,87x3)x2
13.175.0010-A		7x3)
13.301.0125-B	27,88+18,29+20,32+25,80+15,54+43,18+6,9+3,86+19,88+25,70+36,21+38,40+38,40+23,40+11,70+5,28+25,96	
13.330.0075-A	20,32+19,88+43,18+3,66+3,86+36,21+2,64+2,64+11,7+11,70	
13.348.0055-A	20,32+19,88+43,18+3,66+3,86+36,21+2,64+2,64+11,7+11,70	
13.365.0170-A	1,5+2+2+1+1,75+1,75	
		8x1,00

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

CEP 30540-000

2.5 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	
14.004.0015-A	
14.006.0036-A	referente janelas
14.006.0037-A	2un
14.006.0426-A	3un
14.007.0030-A	1,75x0,4)x2+(2x0,7)x2+(2x1)x2+1,5x1,2
14.007.0140-A	5un
	7un
2.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	
15.004.0060-B	1un
15.004.0061-A	1un
15.004.0063-A	11un
15.004.0070-A	1un
15.004.0131-A	10un
15.004.0170-A	2un
15.004.0175-B	6un
15.007.0507-A	1un
15.007.0570-A	2un
15.007.0575-A	2un
15.007.0600-A	2un
15.007.0605-A	2un
15.008.0095-A	200m
15.008.0100-A	230m
15.008.0105-A	100m
15.015.0020-A	8un
15.015.0250-A	10un
15.018.0120-A	10un
15.029.0011-A	5un
15.029.0101-A	1un
15.036.0019-A	30m
15.036.0031-A	26m
15.036.0037-A	42m

[07.569.949/0001-56]

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41





15.036.0038-A		50m
15.036.0048-A		31m
2.7 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
16.013.0002-A		area de reparo
2.8 - PINTURAS		
17.025.0005-1	3,4x4x3)+(8,20x4x3)+(20,82x4x3)+(5,08x4x3)+(5x10x3)+(14x4x3)+(4,33x2x3)+(16x4x3)+(5x5x3)+(8,20x4x3)+(3,66x4x3)	
2.9 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		
18.002.0030-A		1un
18.002.0085-A		10un
18.006.0009-A		14un
18.009.0074-A		2un
18.009.0076-A		14un
18.013.0108-A		14un
18.013.0117-A		17un
18.016.0110-A		6un
15.020.0155-A		15un
18.260.0065-A		15un
09.015.0324-0		01un
09.015.0310-0		01un
09.001.0002-A		27,32+57,69

Bom Jardim, RJ, 27 de setembro de 2021.



CONTRATADA/CONSTRUTORA

FISCAL/NOME/MATRÍCULA

VISTO/SECRETÁRIO

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

1ª Medição

Obra: Reforma, adequação e ampliação da escola municipal Antônio Gomes de Azevedo.

Local: Bairro de Fátima, Segundo Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Processo Administrativo nº 1667/2021.

Procedimento Licitatório Edital de Tomada de Preços nº 002/2021, realizado em 18 de agosto de 2021.

Contrato PMB nº 0118/2021, firmado em 26 de agosto de 2021.

Prazo Inicial: 8 (oito) meses.

Data de Início: 26 de agosto de 2021.

Data de Término: 25 de abril de 2022.

Contratada: Itaúba Construtora Ltda. ME

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro.


CNPJ: 07.569.949/0001-56



AGOSTO 2021



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

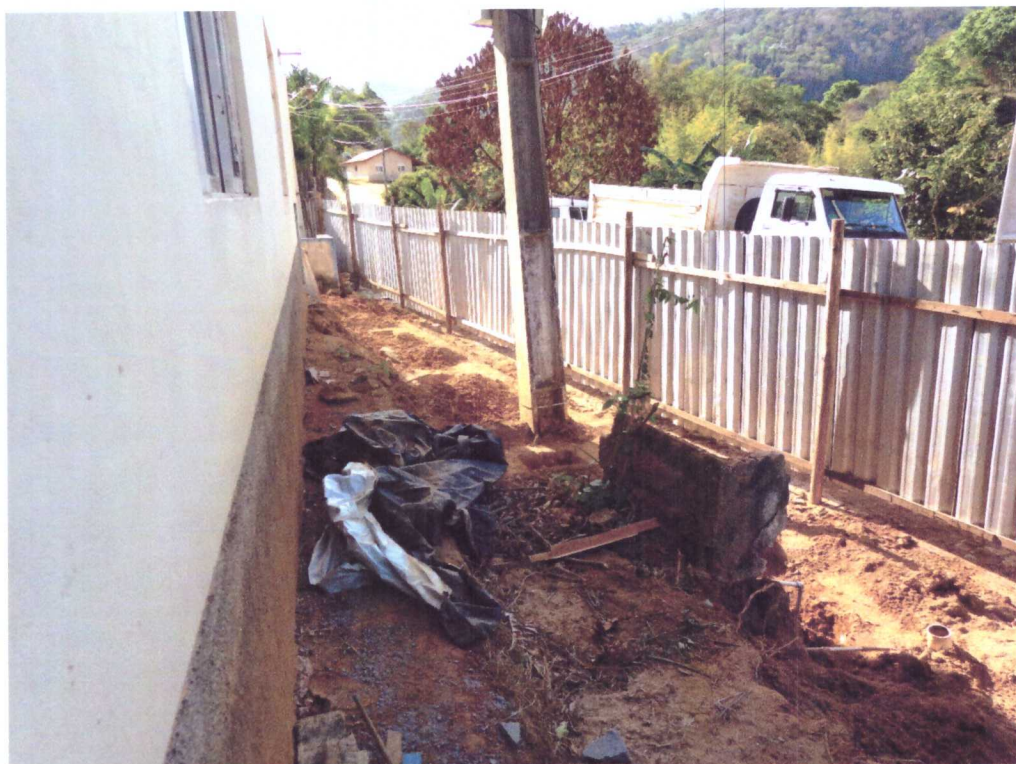



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM







Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

16
11






Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM






Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

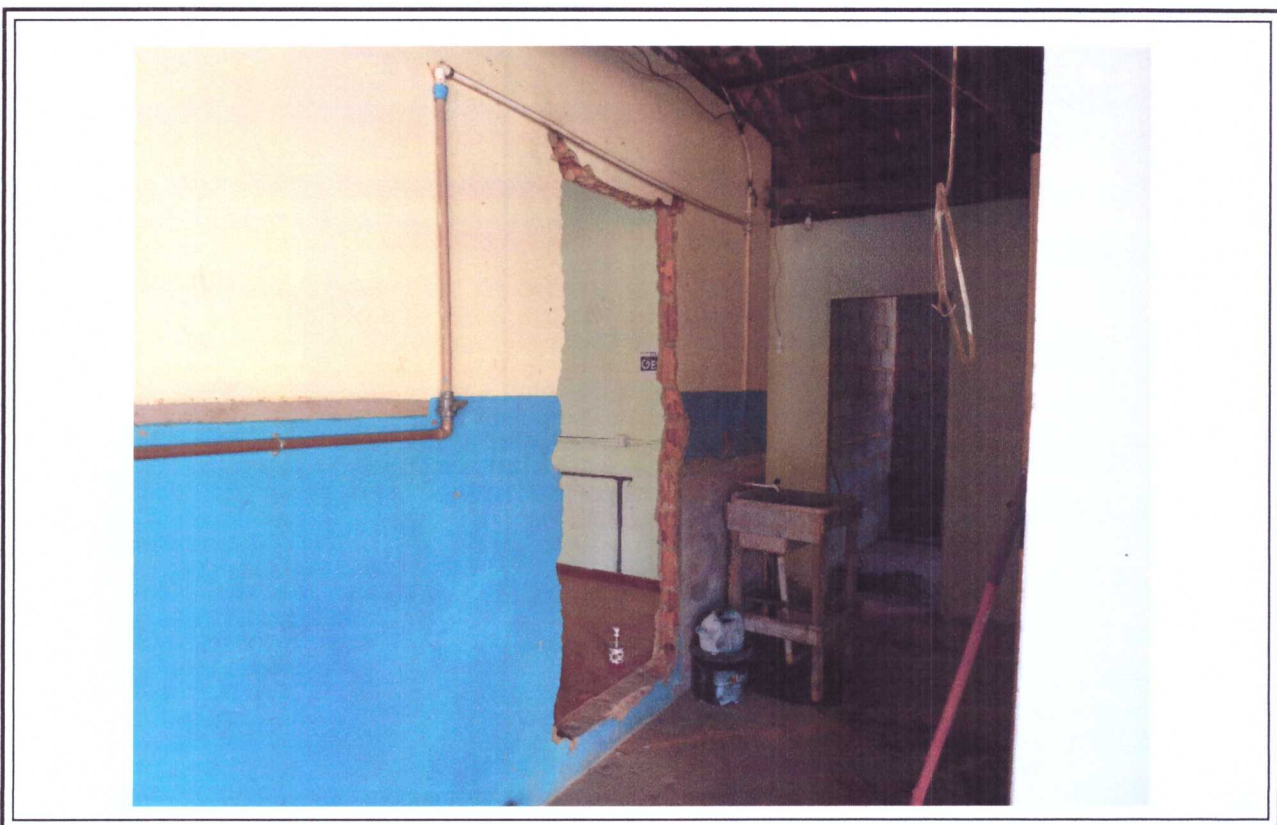



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM


20
W






21
21






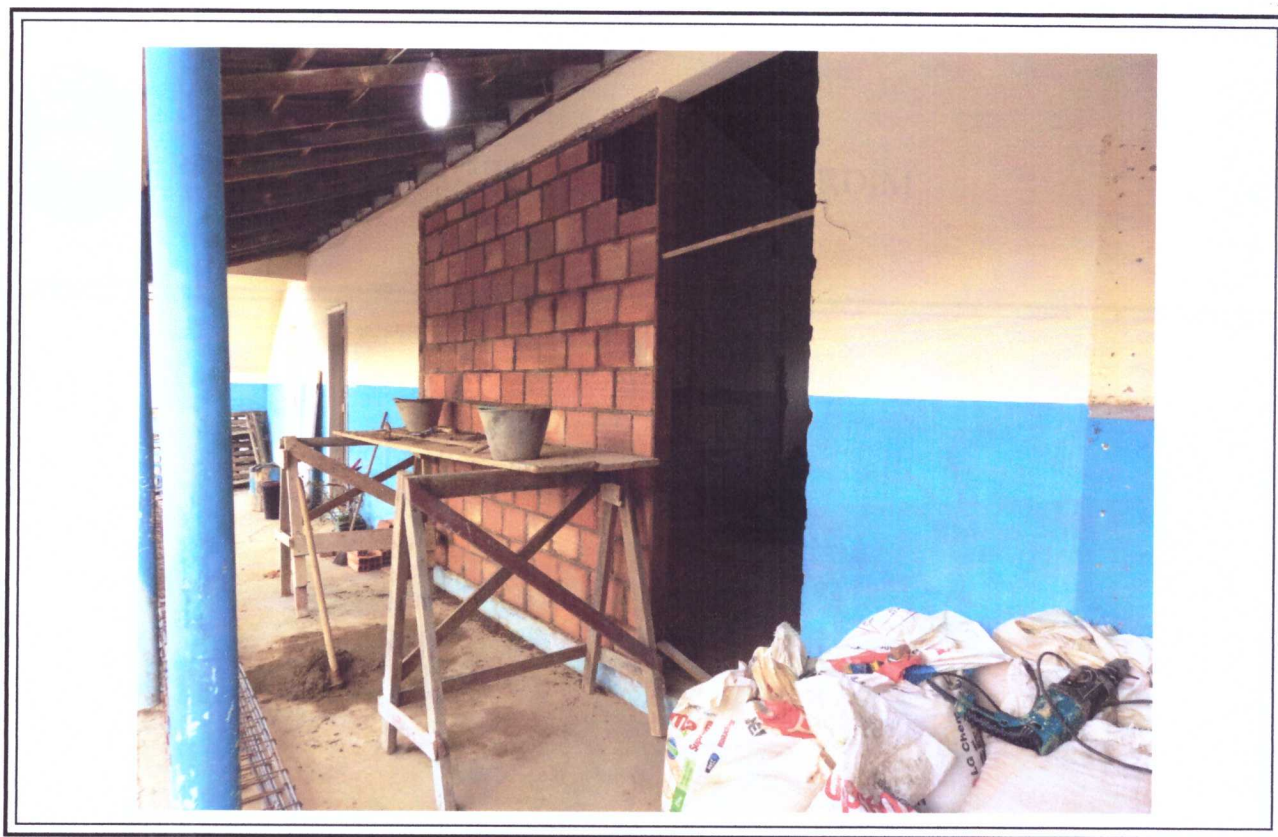



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

[Handwritten signature]



Bom Jardim, RJ, 30 de julho de 2021.
