


SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À Prefeitura Municipal de Bom Jardim

A empresa RB Nunes Comércio e Serviços LTDA, CNPJ: 34.939.102/0001-99, vêm por meio do seu representante legal, o SR. Ronilson Benedito Nunes, portador do RG 12803712-4 IFP/RJ solicitar a 6ª medição da obra cujo o objeto é REFORMA BANHEIRO, ELETRICA PARQUE, SEDE GUARDA, PORTICO E PINTURA GRADES Conforme contrato Nº 063/2023, Tomada de preços 008/2023.

Período: 02/02/2024 à 02/03/2024

Bom Jardim, 08 de Março de 2024




Ronilson Benedito Nunes

RG: 12803712-4

Diretor Executivo

34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUCAIA - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - P.J





CNPJ: 34.939.102/0001-99 Inscrição estadual:

11.553.834

Tel: (22) 99990-0940 E-mail: viga.comerciorj@gmail.com

Rua Irinei Castro Leal, S/N, Ribeira, Cachoeiras de Macacu – RJ Cep:

Comércio & Serviços

28.695-000

Obra:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Prazo:		300 dias									
		Período: 02/02/2024 à 02/03/2025									
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANI.	Preço Unitário	Quant.	6ª Medição Total	Quant.	acumulado Total	Quant.	Saldo Total
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1- PROJETO											
1.1.1	01.050.0087-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA ATENTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	338,06	R\$ 5,55	R\$ 1.876,23		338,06	R\$ 1.876,23	0	R\$ -
1.1.2	01.050.0098-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA ATENTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	338,06	R\$ 9,55	R\$ 3.228,47		338,06	R\$ 3.228,47	0	R\$ -
1.1.3	01.050.0049-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO E SPOA PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE ATÉ 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	311,27	R\$ 5,70	R\$ 1.774,24	R\$ 311,27	311,27	R\$ 1.774,24	0,00	R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO						R\$ 6.878,95	R\$ 1.774,24	R\$ 6.878,95	R\$ -		
1.2- CANTEIRO DE OBRAS											
1.2.1	02.004.0003-0	BARRAÇÃO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'AGUA, 2,44X1,22M E 9MM ESP. PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3", COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT. E LIGAÇÕES PROVISORIAS, INCL.INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ.Nº2006/EMOP, ESCRITORIO, SANITARIO, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	18,00	R\$ 349,90	R\$ 6.298,20	R\$ -	18	R\$ 6.298,20	0,00	R\$ -
1.2.2	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2,25	R\$ 367,29	R\$ 826,40	R\$ -	2,25	R\$ 826,40	0,00	R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 7.124,60	R\$ -	R\$ 7.124,60	R\$ -		
1.3 - TRANSPORTES											
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	11220,00	R\$ 0,14	R\$ 1.570,80	R\$ 2244,00	11220,00	R\$ 1570,8	0,00	R\$ -
1.3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROIEÇÃO VERTICAL	M2	374,00	R\$ 0,65	R\$ 243,10	R\$ 74,80	374,00	R\$ 243,1	0,00	R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES						R\$ 1.813,90	R\$ 362,78	R\$ 1.813,90	R\$ -		
1.3 - SERVIÇO COMPLEMENTARES											
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1", CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	55,00	R\$ 4,30	R\$ 236,50	R\$ -	55,00	R\$ 3.025,00	0,00	R\$ -
1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDEIME COM ELEMENTOS TUBULARES(EFECHADERO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROIEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	1496,00	R\$ 8,87	R\$ 13.269,52	R\$ 299,20	1.496,00	R\$ 13.269,52	0,00	R\$ -
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	374,00	R\$ 5,14	R\$ 1.922,36	R\$ 74,80	374,00	R\$ 1.922,36	0,00	R\$ -

1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	374,00	R\$	0,43	R\$	160,82	74,80	R\$	32,16	374,00	R\$	160,82	0,00	R\$	-
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES																	
2.1- SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO																	
2.1.1	05.050.0001-0	PLACA DE INALUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRIÇÃO EM PLOTTER COM AS DIMENSÕES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$	302,98	R\$	302,98				0	R\$	-	1	R\$	302,98
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO																	
2.2 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS																	
2.2.1	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$	500,50	R\$	2.502,50				R\$	5,00	R\$	2.502,50	0,00	R\$
2.2.2	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAI	M2	13,61	R\$	351,49	R\$	4.783,78				R\$	13,61	R\$	4.783,78	0,00	R\$
2.2.3	14.006.0036-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 60X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	R\$	619,81	R\$	7.437,72				R\$	12,00	R\$	7.437,72	0,00	R\$
2.2.4	14.006.0037-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADA, DE 80X2110CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00	R\$	593,19	R\$	7.711,47				R\$	13,00	R\$	7.711,47	0,00	R\$
2.2.5	14.006.0290-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM, EM 2 FOLHAS, PARA VIDRO, COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	10,00	R\$	1.664,90	R\$	16.649,00				R\$	10,00	R\$	16.649,00	0,00	R\$
2.2.6	14.007.0145-0	FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA, DE CORRER, EM 2 FOLHAS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO, DE-4 RODIZIOS DE LATÃO C/ROLAMENTO(S(6MM),P/TRILHOS:3,00M DE TRILHO DE ALUMÍNIO, TAMANH03,00MX1,41"-2 CONCHAS SIMPLES LATAO, FORMA RELANGULAR,S/FURO E PARTE CENTRAL EM BAIXO RELEVO, ACABAMENTO CROMADO	UN	10,00	R\$	39,80	R\$	398,00				R\$	10,00	R\$	398,00	0,00	R\$
2.2.7	14.002.0076-0	PORTÃO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS, EM BARRAS VERTICAIS DE 2"X3/8", ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DO MESMO TIPO, CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE O GALVANIZADO Nº16, DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,72	R\$	1.695,11	R\$	9.696,03	5,72	R\$	9.696,03	R\$	5,72	R\$	9.696,03	0	R\$
2.2.8	14.002.0078-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADA, DE 70X210CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$	585,83	R\$	2.343,32				R\$	4,00	R\$	2.343,32	0	R\$
2.2.9	14.007.0347-0	PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$	25,00	R\$	150,00				R\$	6,00	R\$	150,00	0	R\$
2.2.10	14.007.0347-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCAÇÃO, DE-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADIÇAS 3"X2,1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO	UN	34,00	R\$	188,99	R\$	6.425,66				R\$	34,00	R\$	6.425,66	0	R\$
2.2.11	14.007.0185-0	FERRAGENS P/PORTA(S/CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXO LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	2,00	R\$	741,86	R\$	1.483,72				R\$	2,00	R\$	1.483,72	0	R\$
2.2.12	14.007.0190-0	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIENTENTO	UN	6,00	R\$	205,82	R\$	1.235,52				R\$	6,00	R\$	1.235,52	0	R\$
2.2.13	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINES FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO)	UN	12,00	R\$	107,12	R\$	1.285,44				R\$	12,00	R\$	1.285,44	0	R\$
2.2.14	12.035.0001-0	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	11,44	R\$	347,10	R\$	3.970,82				R\$	11,44	R\$	3.970,82	0	R\$
TOTAL DO ITEM 2.2 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS																	
2.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS																	
2.3.1	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4"	UN	5,00	R\$	38,69	R\$	193,45	0,00	R\$	-	R\$	5,00	R\$	193,45	0,00	R\$
2.3.2	15.036.0037-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	244,00	R\$	7,88	R\$	1.922,72				R\$	244,00	R\$	1.922,72	0,00	R\$
2.3.3	15.036.0050-0	TUBO DE PVC SD P/FREGOTO E AGUAS PLUVIAS C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	220,00	R\$	14,84	R\$	3.264,80				R\$	220,00	R\$	3.264,80	0,00	R\$
2.3.4	15.036.0052-0	TUBO DE PVC SD P/FREGOTO E AGUAS PLUVIAS C/DIAM. DE 100MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	126,00	R\$	22,39	R\$	2.821,14				R\$	126,00	R\$	2.821,14	0,00	R\$
2.3.5	06.270.0101-0	TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 50MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	29,00	R\$	19,00	R\$	551,00				R\$	29,00	R\$	551,00	0,00	R\$
2.3.6	06.270.0020-0	TUDO PVC, CLASSE 20(EB-183), PARA ADOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	294,00	R\$	18,57	R\$	5.459,58				R\$	294,00	R\$	5.459,58	0,00	R\$

2.3.7	06.270.0036-0	ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351), PB, RQ.X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	26,00	R\$	16,16	R\$	420,16		R\$	-	26,00	R\$	420,16	0,00	R\$	-
2.3.8	06.270.0067-0	CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90° , PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	19,00	R\$	28,08	R\$	533,52		R\$	-	19,00	R\$	533,52	0,00	R\$	-
2.3.9	15.036.0038-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDADVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUI ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO	M	148,00	R\$	12,06	R\$	1.784,88		R\$	-	148,00	R\$	1.784,88	0,00	R\$	-
2.3.10	18.009.0078-0	TORNEIRA PARA JARDIM, DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	28,00	R\$	16,97	R\$	475,16		R\$	-	28,00	R\$	475,16	0,00	R\$	-
2.3.11	18.027.0089-0	LUMINARIA FECHADA, P/ILUMINAÇÃO DE RUAS, CLAMPADA A VAPOR DE MERCURIO E REATOR DE PARTIDA RAPIDA	UN	69,00	R\$	378,85	R\$	26.140,65		R\$	-	69,00	R\$	26.140,65	0,00	R\$	-
2.3.12	21.031.0015-0	RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, TIPO FAUL-OFF, TENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 105V E 300V, POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA, CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A, CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL ESTABILIZADO AO UV/PIPOS EM LATÃO ESTANHADO, DEVENDO ATENDER A ESPECIFICAÇÃO EM ABILUZ-86 E ANS C136.10 E NBR 5128,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO	UN	30,00	R\$	17,28	R\$	518,40		R\$	-	30,00	R\$	518,40	0,00	R\$	-
2.3.13	15.036.0062-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1" EXCL. CONEXÕES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	981,38	R\$	7,61	R\$	7.468,30		R\$	-	981,38	R\$	7.468,30	0,00	R\$	-
2.3.14	15.008.0085-0	CABO C/SOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 2,5MM2, 450 / 750V	M	1.200,00	R\$	2,58	R\$	3.096,00		R\$	-	1.200,00	R\$	3.096,00	0,00	R\$	-
2.3.15	15.008.0090-0	CABO C/SOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 4MM2, 450 / 750V	M	800,00	R\$	3,58	R\$	2.864,00		R\$	-	800,00	R\$	2.864,00	0,00	R\$	-
2.3.16	15.020.0055-0	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W / 250V	UN	79,00	R\$	46,19	R\$	3.649,01		R\$	-	79,00	R\$	3.649,01	0,00	R\$	-
2.3.17	15.015.0250-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" - 18,00MM DE RÍO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	67,00	R\$	241,52	R\$	16.181,84		R\$	-	67,00	R\$	16.181,84	0,00	R\$	-
2.3.18	15.096.0143-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	705,00	R\$	3,43	R\$	2.418,15		R\$	-	705,00	R\$	2.418,15	0,00	R\$	-
2.3.19	18.027.0130-0	PROJEIOR PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, PATIOS OU FACHADAS EM ALUMINIO REPUXADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO (DIAMETRO=300MM), PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00	R\$	240,90	R\$	6.022,50		R\$	-	25,00	R\$	6.022,50	0,00	R\$	-
2.3.20	15.008.0205-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFAÇÃO EM ELETRODUTO, NA BITOLA DE 2,5MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1739,00	R\$	2,88	R\$	5.008,32		R\$	-	1.739,00	R\$	5.008,32	0,00	R\$	-
2.3.21	15.008.0210-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFAÇÃO EM ELETRODUTO, NA BITOLA DE 4MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1141,38	R\$	3,88	R\$	4.428,55		R\$	-	1.141,38	R\$	4.428,55	0,00	R\$	-
2.3.22	15.008.0215-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFAÇÃO EM ELETRODUTO, NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	2082,76	R\$	5,04	R\$	10.497,11		R\$	-	2.082,76	R\$	10.497,11	0,00	R\$	-
2.3.23	15.011.0016-0	ENTRADA, ENERGIA INDIVIDUAL, PADRÃO ENEL, MEDIÇÃO DIRETA, REDE AREA, 24KVA E 38KVA, TRIFASICA, INCL. CAIXA POLIMERICA P/MEDIÇÃO DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(ATE 100A INTERNA, POLICARBONATO) TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPEÇÃO, NASTIE E CONECTOR ATERAMENTO, MAT.NECESSARIOS	UN	2,00	R\$	394,76	R\$	789,52		R\$	-	2,00	R\$	789,52	0,00	R\$	-
2.3.24	21.013.0010-0	CHUMBADORES DE AÇO, PARA FIXAÇÃO DE POSTE RETO OU CURVO, DE AÇO, DE 7,00 ATÉ 9,00M, COM FLANGE.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	19,00	R\$	880,00	R\$	16.720,00		R\$	-	19,00	R\$	16.720,00	0,00	R\$	-
2.3.25	21.011.0080-0	FUNDAÇÃO PARA POSTE RETO, DE AÇO, DE 7,00 A 9,00M, EM TERRENO DE AREIA, ARGILA OU PICARÁ, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTEÇÃO	UN	10,00	R\$	768,55	R\$	7.685,50		R\$	-	10,00	R\$	7.685,50	0,00	R\$	-
2.3.26	21.011.0085-0	FUNDAÇÃO PARA POSTE RETO, DE AÇO, DE 10,00 A 15,00M, EM TERRENO DE AREIA, ARGILA OU PICARÁ, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTEÇÃO	UN	9,00	R\$	1.588,46	R\$	14.296,14		R\$	-	9,00	R\$	14.296,14	0,00	R\$	-
2.3.27	21.003.0085-0	POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO OU ESCALONADO, ALTURA DE 7,00M, SEM SAPATA.FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$	1.597,00	R\$	15.970,00		R\$	-	10,00	R\$	15.970,00	0,00	R\$	-
2.3.28	21.003.0085-0	POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO OU ESCALONADO, ALTURA DE 15,00M, COM SAPATA.FORNECIMENTO	UN	9,00	R\$	11.090,30	R\$	99.812,70	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	99.812,70
2.3.29	18.260.0040-0	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 25,4MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE, PROJEÇÃO HORIZONTAL, 1000MM, PROJEÇÃO VERTICAL, 370MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	48,00	R\$	116,05	R\$	5.570,40		R\$	-	48,00	R\$	5.570,40	0,00	R\$	-

2.3.30	15.007.0405-0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$	91,00	R\$	364,00		R\$	-	4,00	R\$	364,00	0,00	R\$	-			
2.3.31	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A/250V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$	25,88	R\$	155,28		R\$	-	6,00	R\$	155,28	0,00	R\$	-			
2.3.32	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	14,00	R\$	9,40	R\$	131,60		R\$	-	14,00	R\$	131,60	0,00	R\$	-			
2.3.33	15.007.0576-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$	26,13	R\$	104,52		R\$	-	4,00	R\$	104,52	0,00	R\$	-			
2.3.34	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 60 A 100A/250V,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$	94,45	R\$	188,90		R\$	-	2,00	R\$	188,90	0,00	R\$	-			
2.3.35	15.015.0107-0	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 3 VAGAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 20.00M DE FIO 2,5MM/2,CAIXAS,CONEXÕES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.I., INCLUSIVE ABERTURA E FEC	UN	18,00	R\$	386,55	R\$	6.957,90		R\$	-	18,00	R\$	6.957,90	0,00	R\$	-			
2.3.36	15.015.0260-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARGAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 18.00M DE FIO 2,5MM/2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+1, 10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO	UN	60,00	R\$	190,12	R\$	11.407,20	10,00	R\$	1.901,20	60,00	R\$	11.407,20	0,00	R\$	-			
2.3.37	15.015.0261-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE EQUIVALENTE A 2 VARGAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12.00M DE FIO 2,5MM/2,CAIXAS,CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+1,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	10,00	R\$	168,71	R\$	1.687,10		R\$	-	10,00	R\$	1.687,10	0,00	R\$	-			
2.3.38	18.002.0065-0	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGAÇÃO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO,FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$	244,33	R\$	4.153,61		R\$	-	17,00	R\$	4.153,61	0,00	R\$	-			
2.3.39	18.006.0009-0	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM LADRÃO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO,FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$	209,18	R\$	3.556,06	5,00	R\$	1.045,90	17,00	R\$	3.556,06	0,00	R\$	-			
2.3.40	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"x9CM APROXIMADAMENTE METAL CROMADO,FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$	24,01	R\$	408,17	5,00	R\$	120,05	17,00	R\$	408,17	0,00	R\$	-			
2.3.41	18.013.0117-0	SIFAO 1680,DE 1,1/2"x1,1/2", EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$	62,90	R\$	1.069,30	5,00	R\$	314,50	17,00	R\$	1.069,30	0,00	R\$	-			
2.3.42	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"U", EM TUBO DE 1,1/4"EM AÇO INOXIDAVEL, AISE-304,LIGA 18.8,MEINDO 60X60CM,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	26,00	R\$	218,73	R\$	5.686,98	16,00	R\$	3.499,68	26,00	R\$	5.686,98	0,00	R\$	-			
2.3.43	15.020.0200-0	LAMPADA LED, BUBLO, A60/DV,12W,100/240,BASE E-27,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	113,00	R\$	7,00	R\$	791,00		R\$	-	113,00	R\$	791,00	0,00	R\$	-			
2.3.44	18.020.0200-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	113,00	R\$	3,90	R\$	440,70		R\$	-	113,00	R\$	440,70	0,00	R\$	-			
2.3.45	15.004.0063-0	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LEVATORIO DE UMA TORNEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABISCHOS E CONEXÕES	UN	17,00	R\$	144,18	R\$	2.451,06	5,00	R\$	720,90	17,00	R\$	2.451,06	0,00	R\$	-			
2.3.46	15.004.0103-0	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL,COM CAIXA ACOPLADA,EXCLUSIVE ESTES,PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALAÇÃO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXÕES, ATÉ A CAIXA ACOPLADA, LIGAÇÃO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	17,00	R\$	250,00	R\$	4.250,00		R\$	-	17,00	R\$	4.250,00	0,00	R\$	-			
2.3.47	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 9/8 (16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$	58,60	R\$	351,60	6,00	R\$	351,60	6,00	R\$	351,60	0,00	R\$	-			
2.3.48	15.007.0214-0	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO PARA PARA-RÁDIO, COM 20CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$	17,32	R\$	173,20	10,00	R\$	173,20	10,00	R\$	173,20	0,00	R\$	-			
2.3.49	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RÁDIO,CAPTOR 1 PONTA,EM LATÃO MACIO, 3/8"x60MM, FIXAÇÃO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE CAPTOR,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$	29,91	R\$	59,82	2,00	R\$	59,82	2,00	R\$	59,82	0,00	R\$	-			
2.3.50	18.006.0028-0	TANQUE DE LOUÇA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO,FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$	218,16	R\$	654,48	3,00	R\$	654,48	3,00	R\$	654,48	0,00	R\$	-			
2.3.51	18.006.0040-0	SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	R\$	28,85	R\$	346,20		R\$	-	12,00	R\$	346,20	0,00	R\$	-			
2.3.52	18.006.0050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	R\$	19,00	R\$	228,00		R\$	-	12,00	R\$	228,00	0,00	R\$	-			
2.3.53	15.003.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACOI, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	6,00	R\$	24,30	R\$	145,80	3,00	R\$	72,90	6,00	R\$	145,80	0,00	R\$	-			
2.3.54	18.007.0045-0	CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, DE 110/220V,FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$	146,85	R\$	881,10	3,00	R\$	440,55	6,00	R\$	881,10	0,00	R\$	-			
										R\$ 313.207,08			R\$ 18.192,76			R\$ 213.394,38			R\$ 99.812,70	

2.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES



2.4.1	14.002.0205-0	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA, COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"x3/4" CHUMBAOS HORIZONTAIS EM CONCRETO, CONRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"x1/2" E 2"x3/8" DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1,1/2"x3/8" SOLDADAS NOS MONTANTES, UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CONRIMAO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	16,75	R\$	698,62	R\$	11.701,89	16,75	R\$	11.701,89	16,75	R\$	11.701,89	0,00	R\$	-
2.4.2	14.002.0133-0	GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1,1/2"x3/8" A CADA 10CM, QUATRO BARRAS HORIZONTAIS DE 2"x3/8" CHUMBAOS NOAO SENDO DUAS DAS EXTREMIDADES E DUAS DIVIDINDO A GRADE 3 PARTES IGUAIS, COM MONTANTES DE 1,1/2"x1,1/2" A CADA 2,00M CHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA DA GRADE FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	18,00	R\$	638,36	R\$	11.490,48	0,00	R\$	-	18,00	R\$	11.490,48	0,00	R\$	-
2.4.3	05.001.0023-0	DEMOICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FIJADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTIEIRO DE SERVICO	M3	12,40	R\$	65,94	R\$	817,66	0,00	R\$	-	12,40	R\$	817,66	0,00	R\$	-
2.4.4	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	15,00	R\$	17,90	R\$	268,50	0,00	R\$	-	15,00	R\$	268,50	0,00	R\$	-
2.4.5	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	35,00	R\$	5,70	R\$	199,50	0,00	R\$	-	35,00	R\$	199,50	0,00	R\$	-
2.4.6	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	8,00	R\$	13,90	R\$	159,20	0,00	R\$	-	8,00	R\$	159,20	0,00	R\$	-
2.4.7	05.055.0010-0	LETRA DE AO INOX N"22 COM 20CM DE ALTURA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	R\$	70,90	R\$	2.836,00	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	40,00	R\$	2.836,00
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES																	R\$ 2.836,00
2.5 - PAVIMENTACAO																	
2.5.3	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BATOINEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,16	R\$	382,56	R\$	1.208,89				3,16	R\$	1.208,89	0	R\$	-
TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTACAO																	R\$
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS																	
2.6.1	11.013.0130-0	CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDA DA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME INTENS 11.004.0022	M3	1,50	R\$	1.688,22	R\$	2.532,33				1,50	R\$	2.532,33	0,00	R\$	-
2.6.2	12.007.0020-0	PARDE DE BLOCOS VAZADOS (CORBOGO) DE CIMENTO E AREIA, COM PESO DE 9,6KG, 39X39X7CM, ASSENTES COM EM 10,006.0010	M2	38,15	R\$	117,59	R\$	4.486,06				38,15	R\$	4.486,06	0,00	R\$	-
2.6.3	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FIJADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X30CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACAO 1:8, EM PARDES DE UMA VEZIO, 20M)	M2	325,31	R\$	68,00	R\$	22.121,08				325,31	R\$	22.121,08	0,00	R\$	-
TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS																	R\$ 29.139,47
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS																	
2.7.1	13.001.0015-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACAO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACAO 1:3	M2	1208,43	R\$	30,10	R\$	36.373,74				1208,43	R\$	36.373,74	0,00	R\$	-
2.7.2	13.030.0262-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (11,60X11,60X0,09)CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAI E AREIA, NO TRACAO 1:3:5, JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA	M2	354,55	R\$	104,74	R\$	37.135,57				354,55	R\$	37.135,57	0,00	R\$	-
2.7.3	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60 X 60CM, DE ENCAIXE, PRESSAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	155,63	R\$	40,95	R\$	6.373,05				155,63	R\$	6.373,05	0,00	R\$	-
2.7.4	13.330.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, 45X45CM, SUJEITO A TRAFEGO INTENSO, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACAO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	31,00	R\$	28,20	R\$	874,20				31,00	R\$	874,20	0,00	R\$	-
2.7.5	13.348.0055-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA DE 2CM, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACAO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	27,95	R\$	81,54	R\$	2.279,04				27,95	R\$	2.279,04	0,00	R\$	-
2.7.6	13.365.0170-0	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 2CM DE ESPESURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACAO 1:1:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	22,75	R\$	45,15	R\$	1.027,16				22,75	R\$	1.027,16	0,00	R\$	-
2.7.7	13.380.0011-0	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO AJUSTE, COM 4CM DE ESPESURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACAO 1:4:8) CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESURA, FEITA COM GRANULHA N1 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA	M2	259,36	R\$	60,43	R\$	15.673,12				259,36	R\$	15.673,12	0,00	R\$	-
2.7.8	13.036.0015-0	RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACAO 1:1:2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRACAO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	227,59	R\$	47,46	R\$	10.801,42				227,59	R\$	10.801,42	0,00	R\$	-
2.7.9	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60 X 60CM, DE ENCAIXE, PRESSAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	44,19	R\$	40,95	R\$	1.809,58	44,19	R\$	1.809,58	44,19	R\$	1.809,58	0,00	R\$	-
2.7.10	14.006.0040-0	DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, FORMADO POR PECAS DE 2X10CM, COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRA SERRADA 7,5CMX7,5CMX3"X3" E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRA COM 25CM DE DIAMETRO TRATADO ALTAIRA UTIL, MEDIA DE 1,50M ENTERRADO 1,00M DE	M2	3,77	R\$	1.702,44	R\$	6.418,20				0,00	R\$	-	3,77	R\$	6.418,20

2.7.11	13.301.0125-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, NA ESPESURA DE 3CM	M2	23,00	R\$	25,95	R\$	596,85			23,00	R\$	596,85	0,00	R\$	-
TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS								R\$ 119.361,84		R\$ 1.809,58			R\$ 112.5943,74		R\$ 6.418,20	
2.8.1	16.002.0013-0	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEIRA E MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	129,73	R\$	50,47	R\$	6.547,47			129,73	R\$	6.547,47	0,00	R\$	-
2.8.2	16.003.0020-0	FIXAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, (EXCLUSIVE ESTACAS) COM ARAME DE COBRE Nº16, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	518,95	R\$	15,05	R\$	7.810,20			518,95	R\$	7.810,20	0,00	R\$	-
2.8.3	16.002.0015-0	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCÊSAS, COLONIAS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	30,00	R\$	21,20	R\$	636,00			30,00	R\$	636,00	0,00	R\$	-
2.8.4	16.013.0001-0	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FRANCÊSAS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	M2	548,95	R\$	42,36	R\$	23.253,52			548,95	R\$	23.253,52	0,00	R\$	-
TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES								R\$ 38.247,19					R\$ 38.247,19		R\$	-
2.9.1	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	1590,95	R\$	13,90	R\$	22.114,21	118,95	R\$ 1.653,41	1590,95	R\$	22.114,21	0,00	R\$	-
2.9.2	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ANTIFUNGICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSA A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SELEDOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRIL	M2	2921,37	R\$	28,50	R\$	83.259,05	320,00	R\$ 9.120,00	2820,00	R\$	80.370,00	101,37	R\$	2.889,05
2.9.3	17.017.0161-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA SINTÉTICA ACRÍLICA DE USO GERAL, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	528,78	R\$	9,35	R\$	4.944,09	100,00	R\$ 935,00	464,39	R\$	4.342,05	64,39	R\$	602,05
2.9.4	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRÊS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO	M2	45,40	R\$	13,09	R\$	594,29	0,00	R\$ -	45,40	R\$	594,29	0,00	R\$	-
TOTAL DO ITEM 2.9 - PINTURAS								R\$ 110.911,63		R\$ 11.708,41			R\$ 107.420,54		R\$ 3.491,09	
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL								R\$ 705.925,39								
						TOTAL:		R\$ 737.332,03		R\$ 58.316,22						
						B.D.I	23,54%	R\$ 173.567,96		R\$ 13.727,64						
						TOTAL GERAL:		R\$ 910.900,00		R\$ 72.043,86		R\$			R\$ 124.612,53	

Relatório Fotográfico

Contrato	063/2023	Local: Bom Jardim RJ
EXECUÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM		

Execução de corrimão na sede da guarda

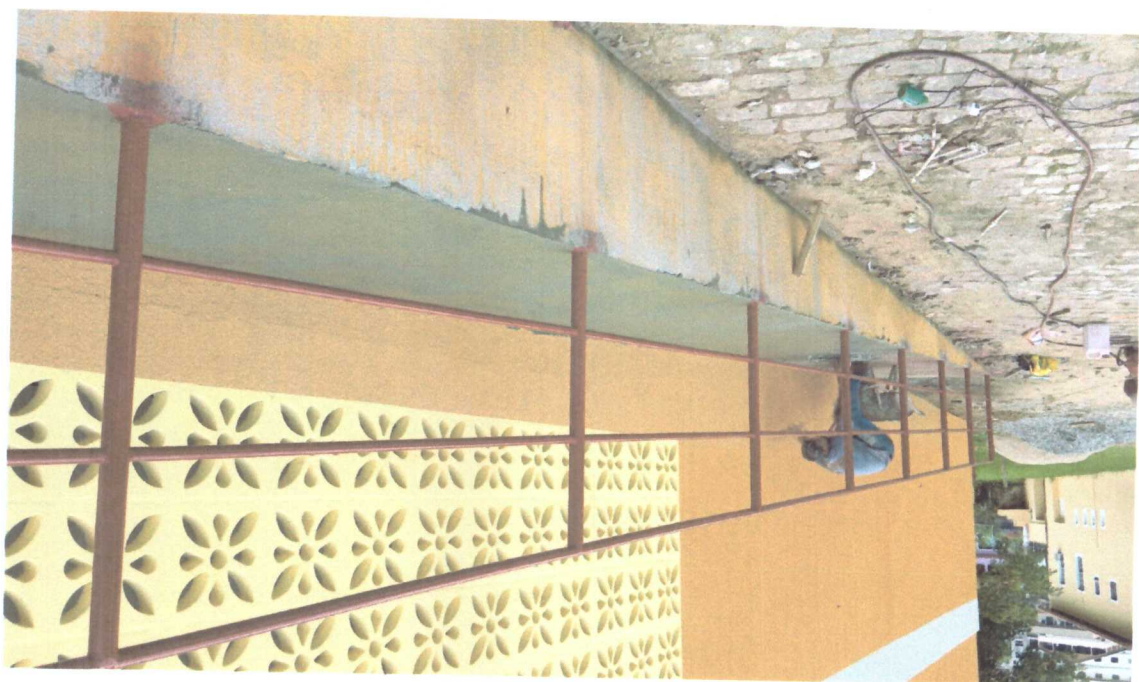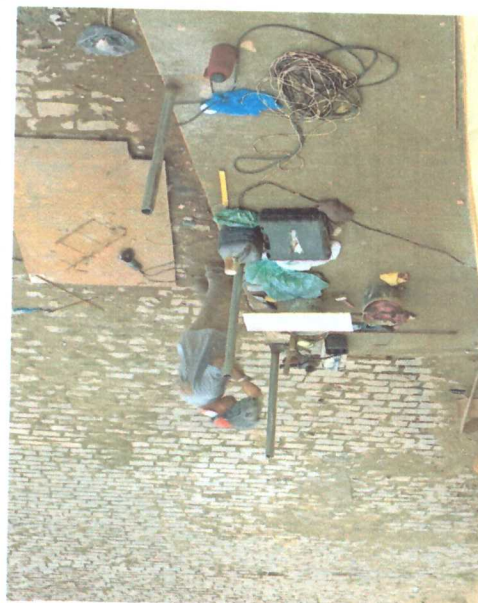


df

af



Instalação de louças e equipamentos elétricos



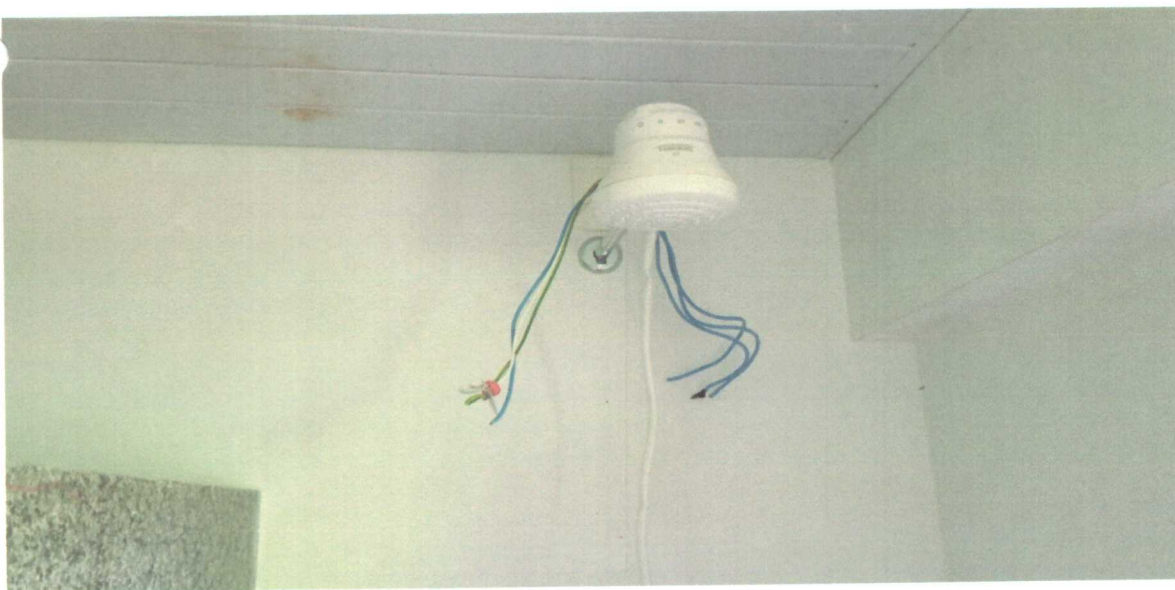

Handwritten signature or initials in blue ink.

Instalação de esquadrias de alumínio




10



10

Reparo Estrutural no lago do parque

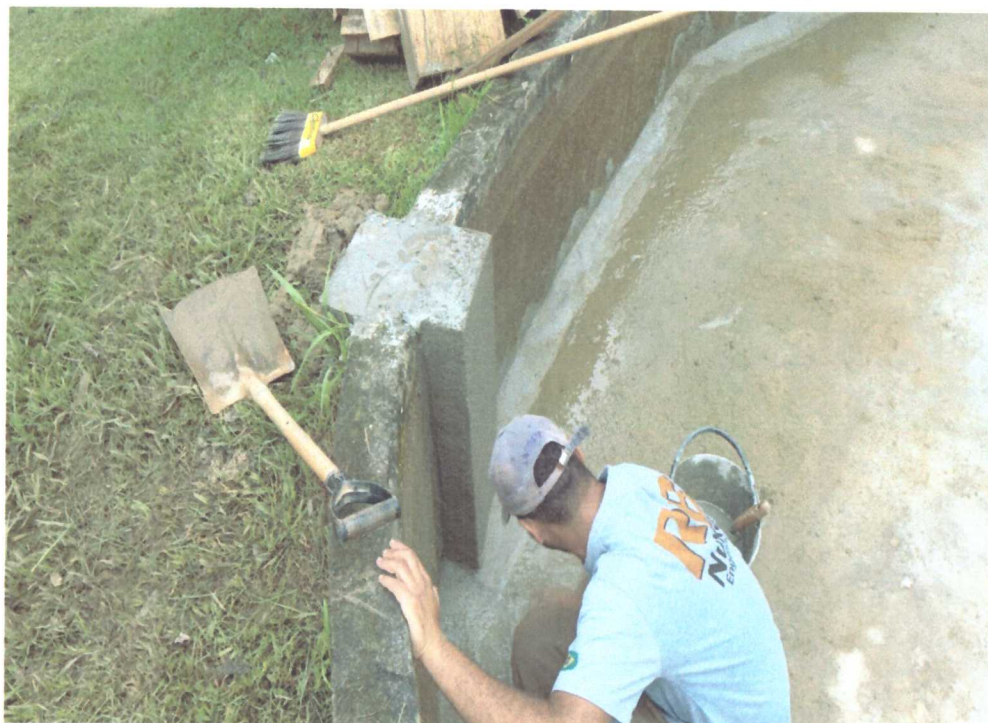

[Handwritten signature]



Início de escada no meio do parque



JP



Pintura externa acabada



Execução e instalação de portão novo



[Handwritten signature]



34.939.102/0001-99
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS
RUA OSVALDIR VICENTE SIQUEIRA, 252
LOJA 9 - PAPUÇAIM - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
