

PROTOCOLO DE ENTREGA


REF.: Contrato n.º 127/2022
Tomada de Preços n.º 006/2022
1ª Medição

A
Secretaria de Projetos de Especiais
Setor de Engenharia


A empresa D. Antunes Barbosa Transportes e Serviços, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.526.514/0001-80, sediada na R. Samburá F. Pedra, RJ 144 – Km 55, Duas Barras – CEP: 25650-000, na presente data, protocola os seguintes documentos na Prefeitura Municipal de Bom Jardim:

- Nota Fiscal Eletrônica;
- Certidões;
- Guia de DCTFWeb;
- Guia de FGTS e comprovante de pagamento;
- Gfip-Sefip;
- Planilha de medição;
- Relatório fotográfico;
- Relatório semanal de obras.

Bom Jardim, 21 de setembro de 2023



D. Antunes Barbosa Transportes e Serviços
Daniel Antunes Barbosa



**D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME**

CNPJ: 23.526.514/0001-80

END.: R. SAMBURA F. PEDRA, RJ 144, KM 55

MUNICÍPIO: DUAS BARRAS RJ

E-MAIL: dbservicos27@gmail.com

TEL. (22) 992647813

Obra: Reforma Da Clínica da família Alavaro Daniel Nunes Guimaraes
Prazo: 180 dias**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PRIMEIRA MEDIÇÃO		DATA:28/07/2023						
ITEM	CODIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		PRIMEIRA MEDIÇÃO	TOTAL DA MEDIÇÃO
					UNITARIO	TOTAL		
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1 - PLACA DE OBRA E PROJETOS								
1.1.1	01.050.0350-0	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATÉ 1000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	337,03	92,01	31.012,13	0,00	0,00
1.1.2	01.050.0054-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES	M2	337,03	12,73	4.290,39	0,00	0,00
1.1.3	01.050.0118-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	337,03	25,44	8.574,04	0,00	0,00
1.1.4	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	408,43	2.450,58	6,00	2.450,58
TOTAL DO ITEM 1.1 - PLACA DE OBRA E PROJETOS						46.325,14		2.450,58
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS								
1.2.1	02.004.0001-0	BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3",COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SEND0 REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	30,00	366,40	10.992,00	0,00	0,00
1.2.2	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	294,22	28,67	8.435,28	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS						19.427,28		0,00
1.3 - TRANSPORTES								
1.3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJEC AO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINH AO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	6.417,95	0,14	898,51	3.208,98	460,97
1.3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINH AO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJEC AO VERTICAL	M2	183,37	0,68	124,69	91,69	62,75
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES						1.023,20		523,72
1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.4.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1",CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	100,00	4,21	421,00	50,00	210,50
1.4.2	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJEC AO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	733,50	8,21	6.022,03	366,75	3.012,26
1.4.3	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	183,37	5,62	1.030,53	91,69	515,27
1.4.4	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	183,37	0,45	82,51	91,69	41,26
1.4.5	05.050.0001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA,INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	1,00	508,02	508,02	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						8.064,09		3.779,29
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						74.839,71		6.753,60
2.0 - REFORMA GERAL								
2.1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
2.1.1	05.001.0042-0	REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	337,03	8,58	2.891,71	337,03	2.891,72
2.1.2	05.001.0055-0	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	286,93	9,85	2.826,26	90,00	886,74

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

2.1.3	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	28,00	19,08	534,24	0,00	0,00
2.1.4	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	75,00	4,85	363,75	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						6.615,96		3.778,46
2.2 - PAVIMENTAÇÃO								
2.2.1	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12,57	404,35	5.082,67	12,57	5.082,68
TOTAL DO ITEM 2.2 - PAVIMENTAÇÃO						5.082,67		5.082,68
2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS								
2.3.1	12.016.0004-0	PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM, ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM, FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM, AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM, C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD, ESP.12,5MM, LARG.1200MM, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS, C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	270,00	61,14	16.505,10	0,00	0,00
2.3.2	12.015.0005-0	PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, COM MIOLO EM COLMEIA, ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EM "L", "T", OU "X", FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO, EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS	M2	270,00	95,80	25.866,00	0,00	0,00
2.3.3	13.168.0010-0	REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP., PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNAR 500, NO SISTEMA COIL COATING, ESP.DO COMPOSTO DE 4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS, NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO), INCL.SUBESTRUTURA DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC.	M2	88,71	614,44	54.506,97	0,00	0,00
2.3.4	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M	M2	18,00	76,64	1.379,52	18,00	1.379,55
TOTAL DO ITEM 2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						98.257,59		1.379,55
2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS								
2.4.1	13.001.0010-1	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA DE 9MM	M2	36,00	4,96	178,56	36,00	178,56
2.4.2	13.003.0003-0	REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	36,00	26,15	941,40	36,00	941,50
2.4.3	13.180.0015-1	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	286,93	45,35	13.012,27	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						14.132,23		1.120,06
2.5 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS								
2.5.1	14.004.0015-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	21,20	92,02	1.950,82	0,00	0,00
2.5.2	14.006.0037-0	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM, COM MARCO DE 7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	18,00	670,20	12.063,60	0,00	0,00
2.5.3	14.006.0150-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM, EM 2 FOLHAS, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	780,91	780,91	0,00	0,00
2.5.4	14.007.0030-0	FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE SERVICO, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:- FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS 3"x2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO	UN	18,00	186,25	3.352,50	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.5 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						18.147,83		0,00
2.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS								
2.6.1	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	65,00	265,60	17.264,00	0,00	0,00

R. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

2.6.2	15.015.0280-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 2,7,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	65,00	279,74	18.183,10	0,00	0,00
2.6.3	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	19,00	16,76	318,44	0,00	0,00
2.6.4	15.003.0405-0	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	6,00	39,11	234,66	0,00	0,00
2.6.5	18.002.0070-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM, COM SAIDA DE 1/2", BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	2,00	328,66	657,32	0,00	0,00
2.6.6	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	4,00	456,29	1.825,16	0,00	0,00
2.6.7	15.003.0360-0	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	13,00	64,05	832,65	0,00	0,00
2.6.8	18.002.0012-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	UN	15,00	208,12	3.121,80	0,00	0,00
2.6.9	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPARADE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	4,00	750,24	3.000,96	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS						45.438,09		0,00
2.7 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES								
2.7.1	16.005.0075-0	COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL, S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ALTURA=40MM)/C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752, LARGURA UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATÉ 12,00M, INCL. ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA TOTAL 78,8MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	337,03	173,42	58.447,74	337,03	58.447,74
2.7.2	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	77,14	116,38	8.977,55	77,14	8.977,70
2.7.3	16.005.0008-0	CUMEEIRA DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	15,00	81,30	1.219,50	15,00	1.219,50
TOTAL DO ITEM 2.7 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						68.644,79		68.644,94
2.8 - PINTURAS								
2.8.1	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	65,52	13,77	902,21	0,00	0,00
2.8.2	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	520,74	24,73	12.877,90	0,00	0,00
2.8.3	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAOS DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	746,18	15,96	11.909,03	373,09	5.955,28
TOTAL DO ITEM 2.8 - PINTURAS						25.689,14		5.955,28
2.9 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS								
2.9.1	18.016.0110-0	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	232,76	2.327,60	0,00	0,00
2.9.2	15.020.0155-0	LAMPADA LED, BULBO, A60/DY, 8W, 100/240V, BASE E-27 FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	80,00	8,77	701,60	0,00	0,00
2.9.3	18.260.0065-0	SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	80,00	4,30	344,00	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 2.9 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS						3.373,20		0,00
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL						285.381,50		85.960,97
TOTAL:						360.221,21		92.714,56
B.D.I.						20,73%		74.673,86
TOTAL GERAL:						434.895,07	TOTAL DA MEDIÇÃO	111.934,29

R. Maloquias
Reinaldo da S. Maloquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

15/05/2023 - 19/05/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01. PEDREIRO

04 AJUDANTES

01 SERRALHEIRO

VEICULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

EMIÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

PRODUÇÃO E INTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

FECHAMENTO DA OBRA

INCICIO DE RETIRADA DA COBERTURA METALICA

MONTAGEM DE ANDAIME

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184

Reinaldo da S. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .



CNPJ: 23.526.514/0001-80

CAPA RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA RESPONSÁVEL

NOME	CNPJ:
D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME	23.526.514/0001-80

E-MAIL DE CONTATO	TELEFONE
daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com	(22) 992647813

ENDEREÇO
R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ

DADOS DA CONTRATANTE

NOME	CNPJ:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.561.041.0022/09

ENDEREÇO
PRACA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, N° 144, CENTRO, BOM JARDIM/RJ

INFORMAÇÕES DA OBRA

DATA DE INICIO: 10/05/2023
PREVISÃO DE TÉRMINO: 06/11/2023

ENDEREÇO DA OBRA:
1° DISTRITO DE BOM JARDIM, BAIRRO SÃO MIGUEL, S/N, BOM JARDIM RJ

RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL
REINALDO DA SILVA MALAQUIAS	ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606	ART: 2020230107184
-----------------------------	---------------------------

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80




R. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

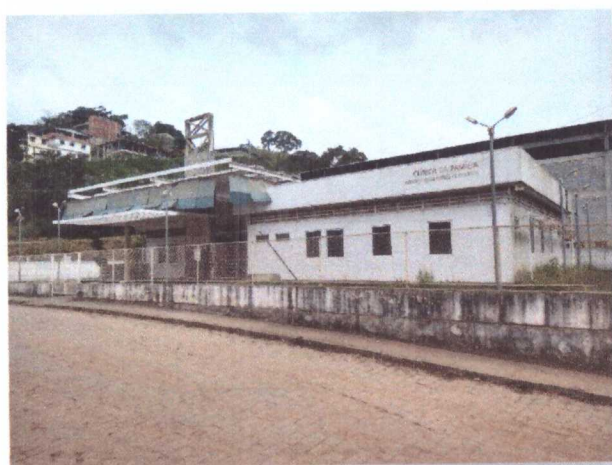


D. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

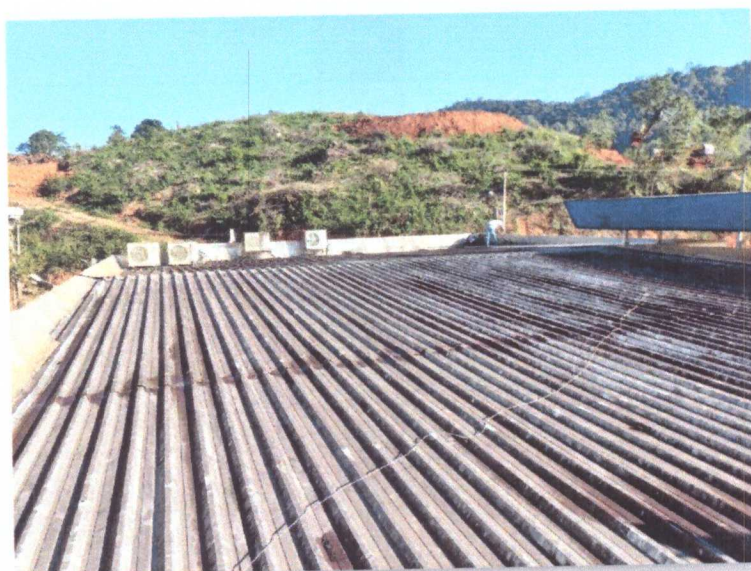


D. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

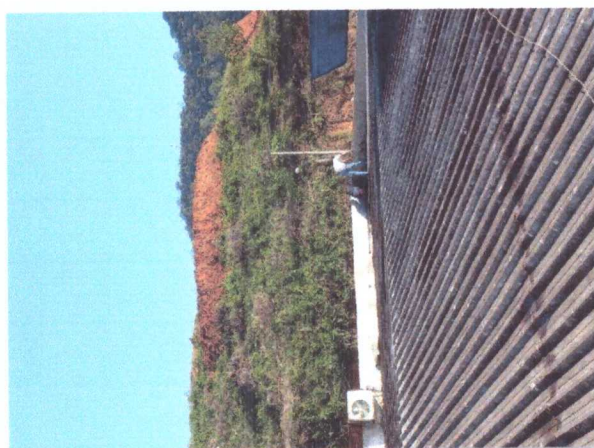

R. Malachuk
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

22/05/2023 - 26/05/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01 PEDREIRO – 01 TECNICO DE AR CONDICIONADO

04 AJUDANTES

01 SERRALHEIRO

VEICULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

CAMINHÃO CAÇAMBA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

CONTINUAÇÃO DA RETIRADA DA COBERTURA METÁLICA

RETIRADA DO ACM DA FACHADA

DRETIRADA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO

MONTAGEM E DESLOCAMENTO DE ANDAIME

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184

R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ

– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

**EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813**

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



D. Antunes Barbosa
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



Daniel
Reinaldo da S. Malaguides
Engenheiro Civil
CREB 20040074306

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

**EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813**

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

29/05/2023 - 02/06/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01 PEDREIRO –

04 AJUDANTES

01 SERRALHEIRO

VEÍCULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

CAMINHÃO CAÇAMBA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

INÍCIO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA ISOTERMICA

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METALICA APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA

RETIRADA DA PEDRA MARMORE DA BASE DA ESTRUTURA METALICA

MONTAGEM E DESLOCAMENTO DE ANDAIME

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606


D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ

– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

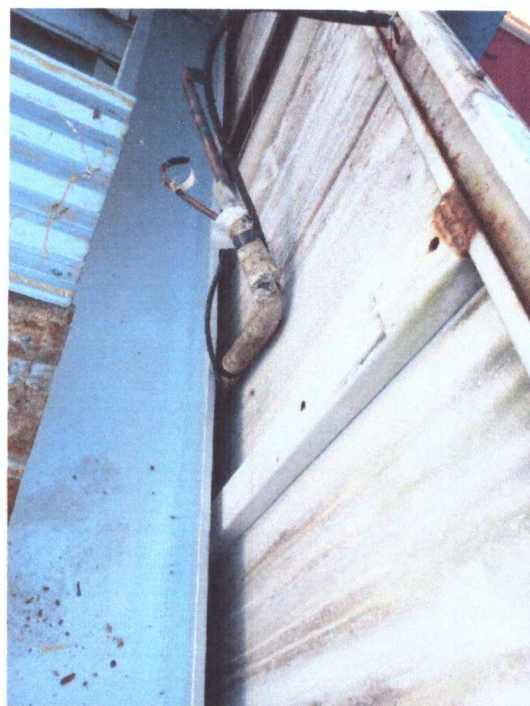

Reinaldo da S. Motaquias
Reinaldo da S. Motaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ

– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

**EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813**

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

**EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813**

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

12/06/2023 - 16/06/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01 PEDREIRO

04 AJUDANTES

01 SERRALHEIRO

VEICULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

CAMINHÃO CAÇAMBA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

CONTINUIDADE DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA ISOTERMICA

MANUTENÇÃO DA ESTUTURA METALICA APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA

RETIRADA DO RODAPÉ INTERNO

LIMPEZA EXTERNA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184

Reinaldo da S. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ

– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80




Reinaldo da S. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

**EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813**

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

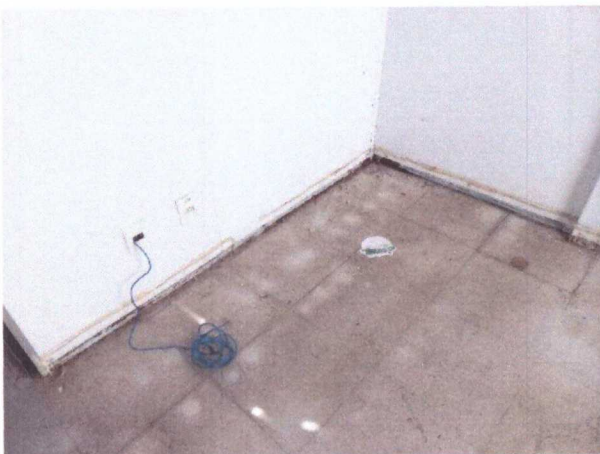

Reinaldo da S. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



Reinaldo da S. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

12/06/2023 - 16/06/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01 PEDREIRO

04 AJUDANTES

01 SERRALHEIRO

VEICULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

CAMINHÃO CAÇAMBA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

CONTINUIDADE DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA ISOTERMICA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184


Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

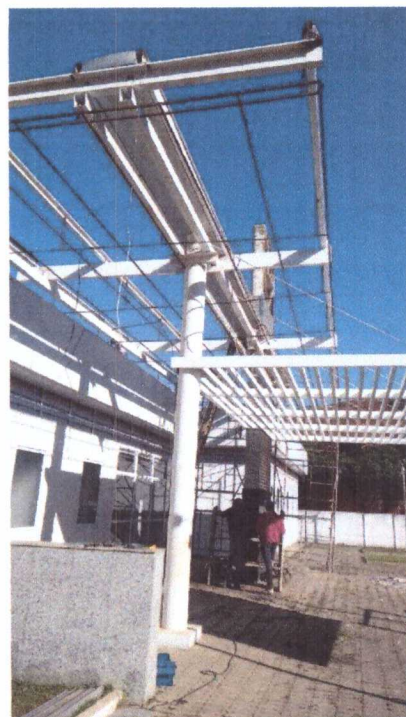


Reinaldo da S. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

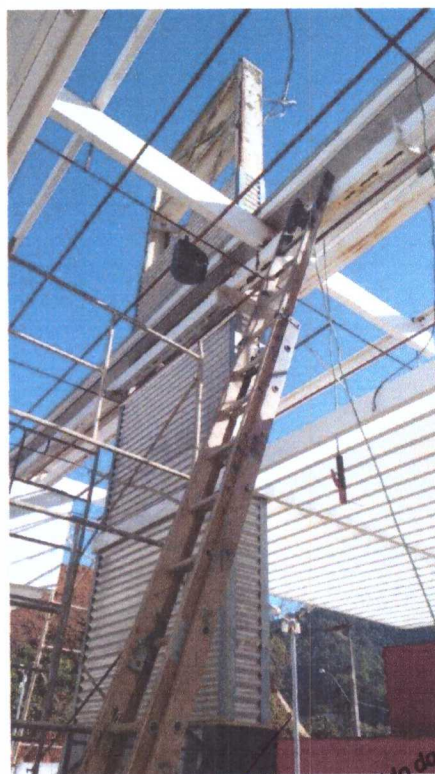

Reinaldo da S. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

**EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813**

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malagães
Reinaldo da S. Malagães
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

26/06/2023 - 30/06/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01 PEDREIRO

04 AJUDANTES

01 SERRALHEIRO

VEICULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

CONTINUIDADE DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA ISOTERMICA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

INSTALAÇÃO DE CALHA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO TELHADO

INÍCIO DO LIXAMENTO E PINTURAS ESTRUTURAS METALICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ

– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80




D. Maloquin
Reinaldo da S. Maloquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

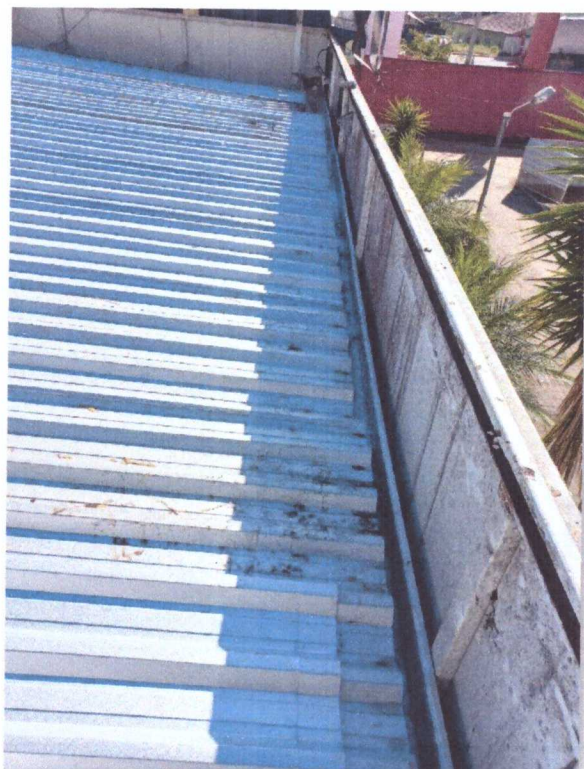

R. Malagães



Reinaldo da S. Malagães
Engenheiro Civil
CNPJ: 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ: 23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

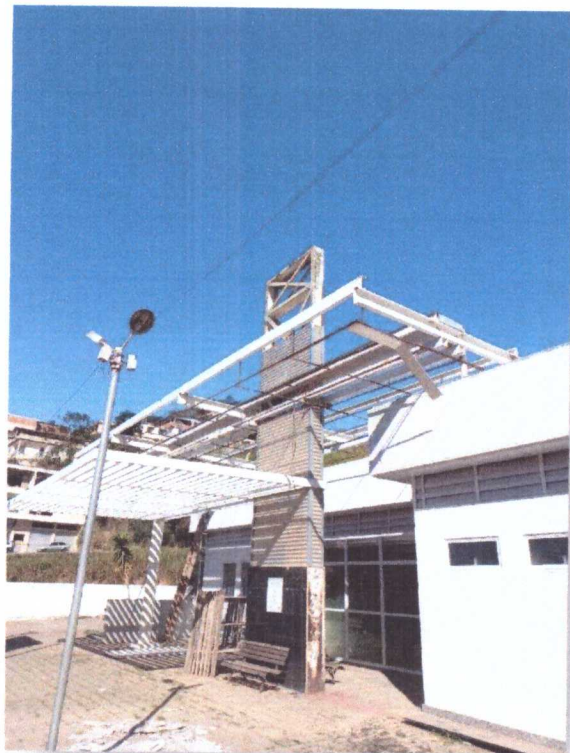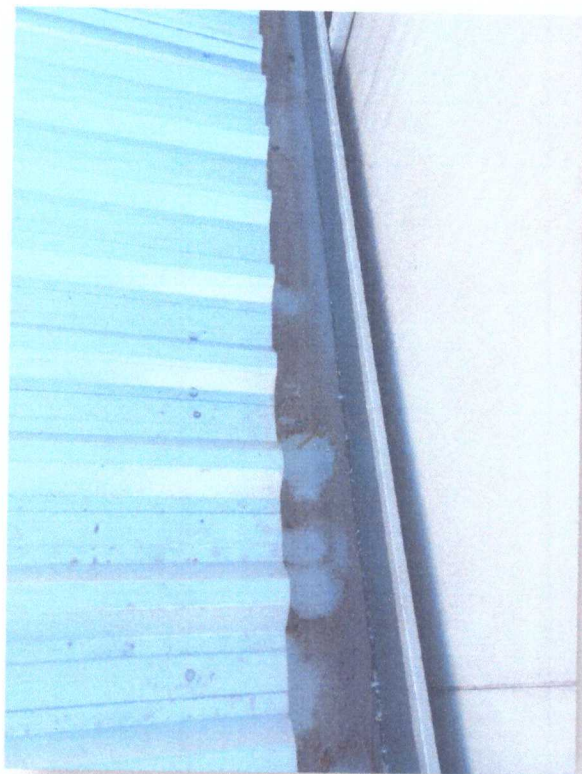

R. Maloquias
Reinaldo da S. Maloquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80





Reinaldo da S. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

**EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813**

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

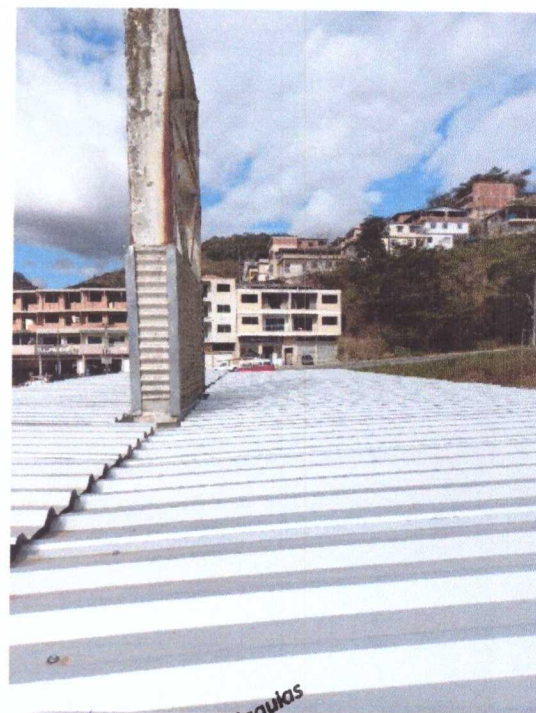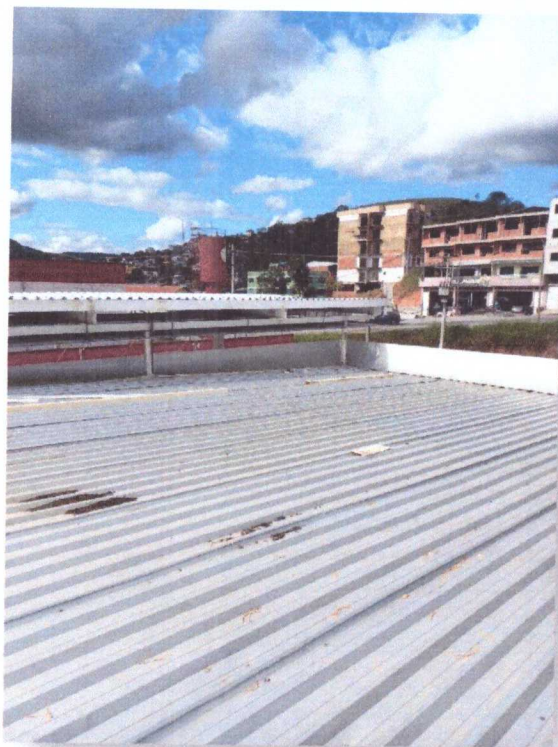

R. Malagães
Reinaldo da S. Malagães
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

**EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813**

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

03/07/2023 - 07/07/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01 PEDREIRO

04 AJUDANTES

01 SERRALHEIRO

VEICULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

CONTINUIDADE DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA ISOTERMICA

INSTALAÇÃO DA CUMINHEIRA

INSTALAÇÃO DE CALHA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO TELHADO

CONTINUIDADE DO LIXAMENTO E PINTURADAS ESTRUTURAS METALICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184


R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

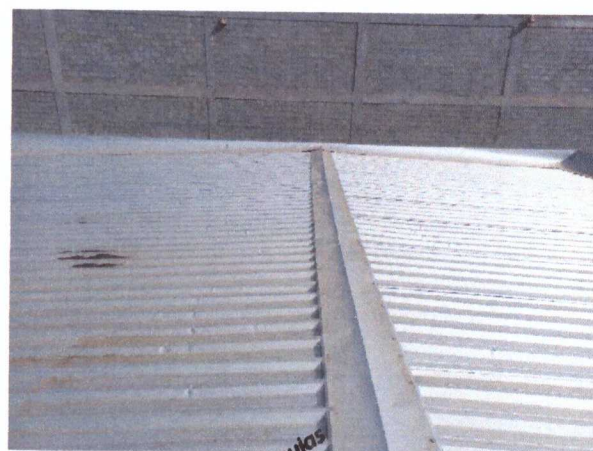




R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

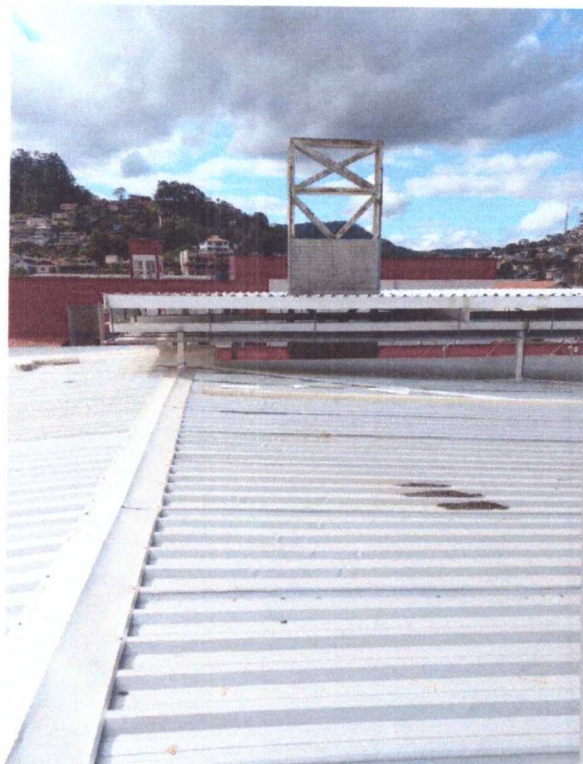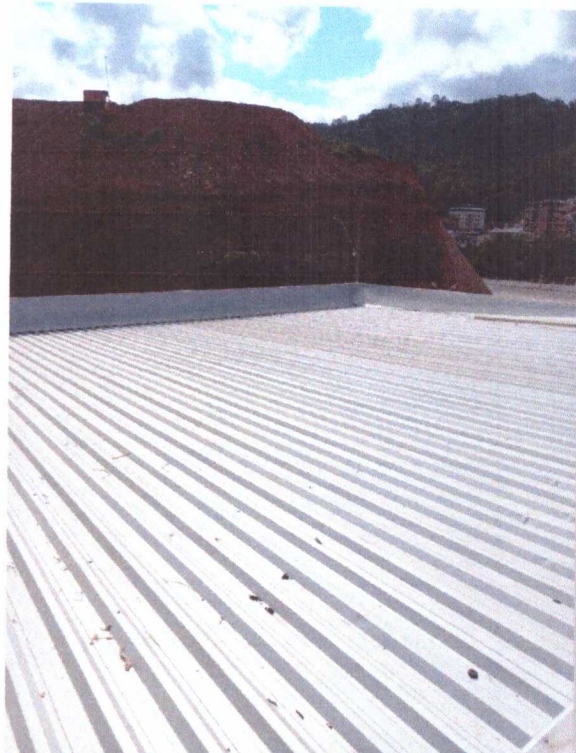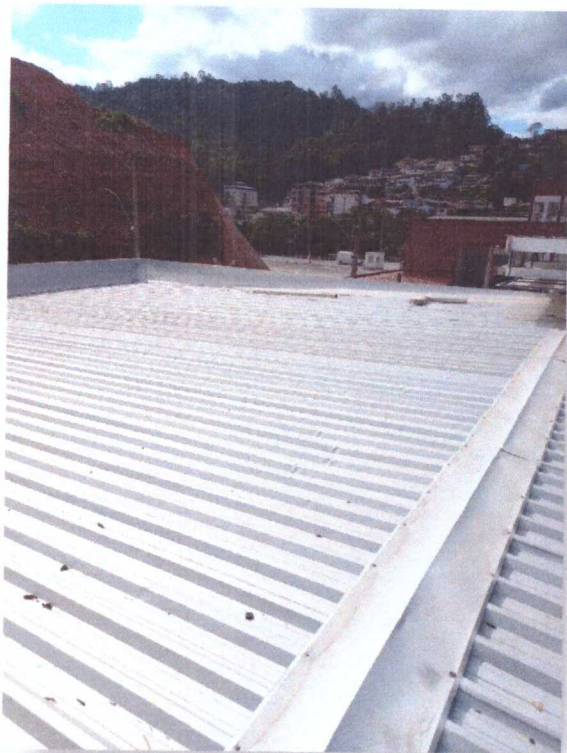

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

10/07/2023 - 14/07/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01 PEDREIRO

04 AJUDANTES

01 SERRALHEIRO

VEÍCULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR

CHAPISCO E EMBOÇO

CONCRETAGEM DA BASE DO ABRIGO E CALÇADA

PINTURA DO ABRIGO DO COMPRESSOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184


Reinaldo da S. Malaquias
Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

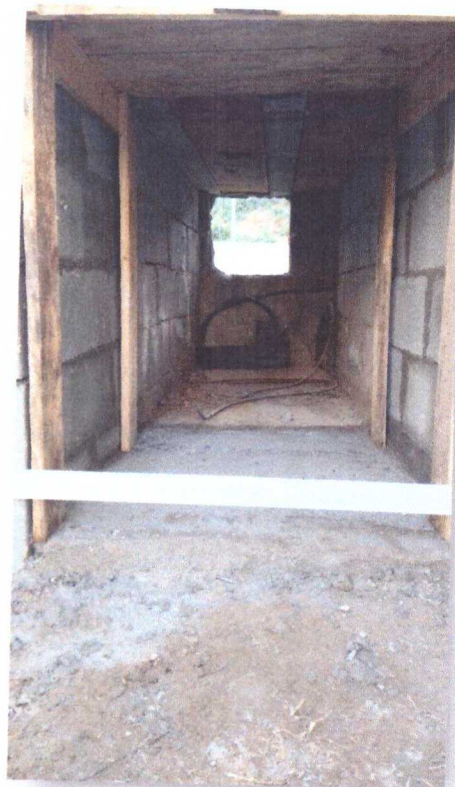

Reinaldo da S. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606


D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ

– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

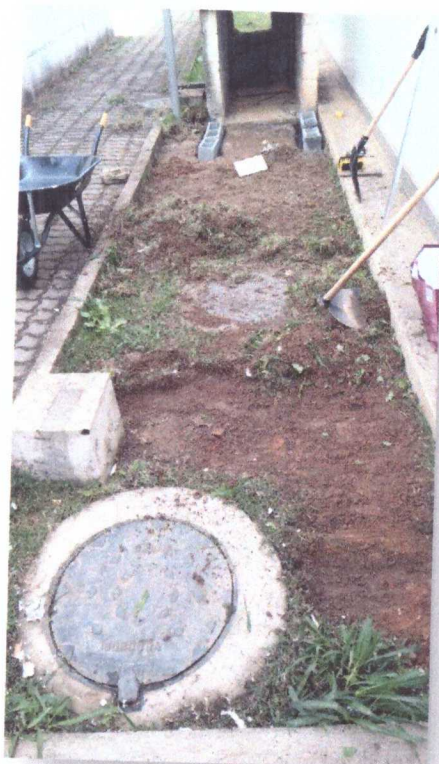

R. Malaquias

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



Reinaldo da S. Malagães
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Malagutti
Reinaldo da S. Malagutti
Engenheiro Civil
CREA 20134117896

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80
EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

17/07/2023 - 21/07/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01 PEDREIRO

04 AJUDANTES

01 SERRALHEIRO

VEÍCULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

MONTAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIME

LIXAMENTO E PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA

REPARO DE REBOCO DO MURO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184

Reinaldo da S. Malaquias



Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80

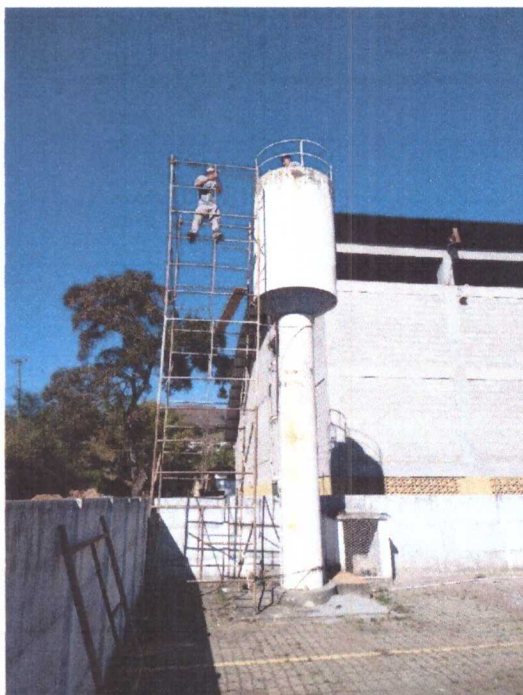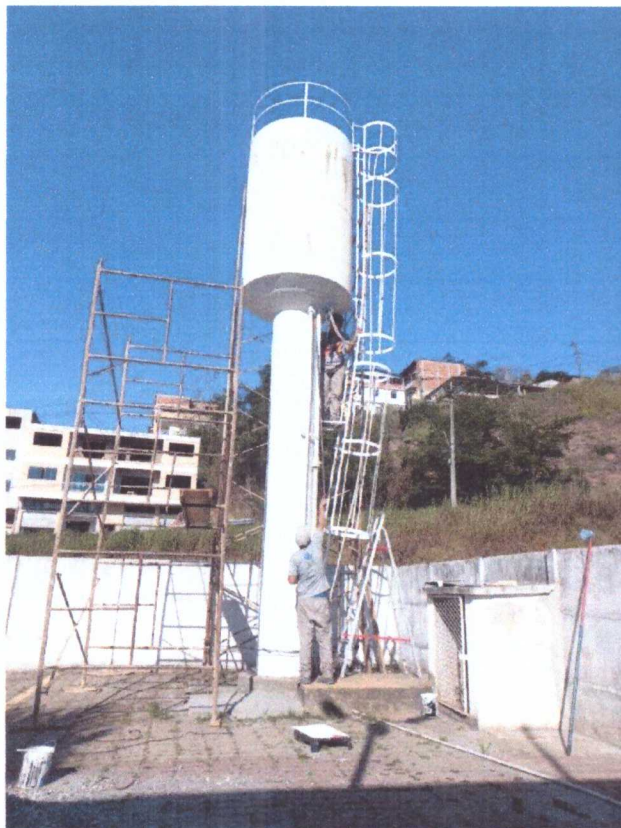

Reinaldo da S. Malhoa
Engenheiro Ch
Crea 2014107

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



R. Mal...
Renaldo da S. Maloquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .



CNPJ: 23.526.514/0001-80

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA

PERÍODO

24/07/2023 - 27/07/2023

ANOTAÇÕES

TEMPO: BOM

EQUIPE DISPONÍVEL

01 PEDREIRO

02 AJUDANTES

VEICULOS DE APOIO

CAMINHONETE: SAVEIRO

MOTOCICLETA

INFORMAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

REPARO DA ESTRUTURA METALICA DO FORRO DE PVC DA FACHADA PRINCIPAL

INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC DA FACHADA PRINCIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REINALDO DA SILVA MALAQUIAS

TÍTULO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 2014107606

ART: 2020230107184

Reinaldo da S. Malaquias
Engenheiro Civil
Crea 2014107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ

– TEL: (22) 99264 - 7813

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME .

CNPJ: 23.526.514/0001-80



B. Malagães
Reinaldo da S. Malagães
Engenheiro Civil
Crea 2014/107606

D ANTUNES BARBOSA TRANSPORTES E SERVIÇOS ME CNPJ:23.526.514/0001-80

**EMAIL: Daniel.ab.antunesbarbosa42@gmail.com END: R SAMBURA F PEDRA – RJ 144 – KM 55 DUAS BARRAS RJ
– TEL: (22) 99264 - 7813**
